
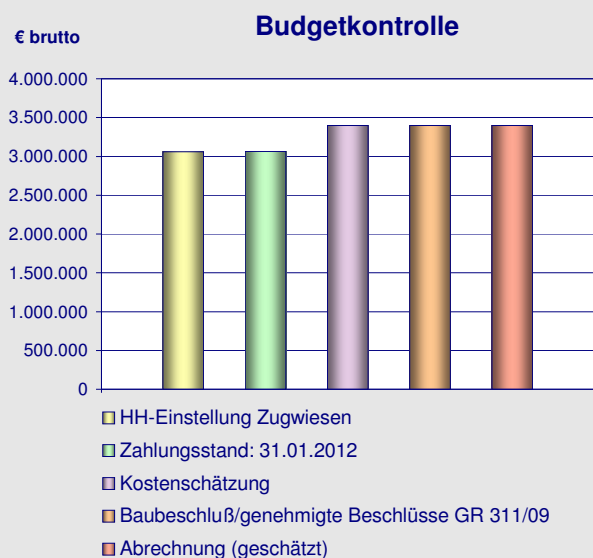


Projekt <b>Friedenstraße</b>		Stand: 31.01.2012		Finanzposition <b>2.6300.9640.000-0208</b>			HHST <b>VH</b>	1
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>				Telefon: <b>2694</b>		
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				200.000	500.000			700.000
Zahlungsstand: 31.01.2012				24.013	1.944			25.957
Kostenberechnung				vom 16.02.2011			680.000	
Bau- und Vergabebeschuß				vom			680.000	
Abrechnung (geschätzt)				100%		0	●	680.000
<b>Liquiditätsbereitstellung</b>		<b>Budgetkontrolle</b>						
€ brutto		€ brutto						
<p>■ HH-Einstellung    ■ Zahlungsstand: 31.01.2012</p>		<p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2012 ■ Kostenberechnung ■ Bau- und Vergabebeschuß ■ Abrechnung (geschätzt)</p>						
<b>Erläuterungen</b>								
- Ausschreibung / Vergabe in zwei Abschnitten:								
BA 1 380.000 € (Kostenschätzung)								
BA 2 300.000 € (Kostenschätzung)								
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>				
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>						
Grundlagenermittlung		April 2011		●				
Planung	April 2011	Mai 2011		●				
Ausführung	Okt. 2011	Mai 2012		●				
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>							
Ausschreibung / Vergabe BA 1								
Ausschreibung / Vergabe BA 2								
Vergabebeschuß		Okt. 2011		●				
Baubeginn		Okt. 2011		●				
Fertigstellung		Mai 2012		●				
<b>Hinweise:</b>	HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 400.000€ auf 200.000€							

Projekt <b>Zugwiesen</b>	Stand: 31.01.2012	Finanzposition <b>2.6110.9552.000-0002</b>	HHST <b>VH</b>	<b>2</b>			
Projektleiter Fachber. 67: <b>Bernd Wenger, Günter Schlecht</b>		Telefon: <b>2749</b>					
<b>KOSTEN</b> bis einschl.							
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung Zugwiesen	570.000	400.000	1.400.000	690.199			<b>3.060.199</b>
Zahlungsstand: 31.01.2012	355.246	298.689	2.409.801	1.178			<b>3.064.914</b>
Kostenschätzung			vom Juni 2009				<b>3.400.000</b>
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09			vom 22.07.2009				<b>3.400.000</b>
Abrechnung (geschätzt)				<b>100%</b>	<b>0</b>	●	<b>3.400.000</b>

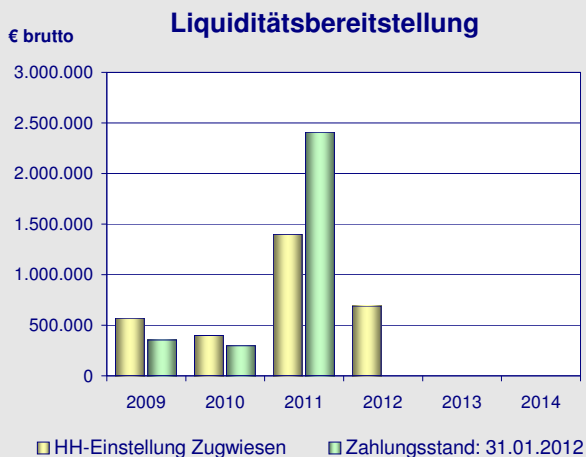

**Erläuterungen**

- Fertigstellung Brücke Poppenweiler Str. Ende September 2011
- Baubeginn Umgehungsgerinne u. Neckarseitenarm Zugwiesen am 04.07.2011.
- Einweihung vorgesehen für Mai/ Juni 2012.

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1998	1999				●
Planung	2000	Juni 2010				●
Ausführung	2011	2012				●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Ausschreibung	Dez. 2010	März 2011				●
Vergabebeschuß		Mai 2011				●
Baubeginn		Juli 2011				●
Fertigstellung		Sommer 2012				●

**Hinweise:** HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 1.600.000€ auf 1.400.000€  
 Die Reduzierung wird im Haushalt 2012 zur Verfügung gestellt.  
 Der HH-Ansatz 2012 ist um die überplanmäßige Ausgabe in 2011 gekürzt.

Projekt		Stand: 31.01.2012			Finanzposition		HHST	3
<b>Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten</b>					<b>2.6153.9610.000-1103</b>		<b>VH</b>	
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Herbert Wieland</b>			Telefon:		<b>2593</b>	
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2016</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		0	0	40.000	30.000		930.000	<b>1.000.000</b>
Zahlungsstand: 31.01.2012			28.000	0	16.094			<b>44.094</b>
Kostenschätzung FB 67		vom 25.07.2011						<b>1.000.000</b>
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								
<b>Liquiditätsbereitstellung</b>								
€ brutto								
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HH-Einstellung</li> <li>■ Zahlungsstand: 31.01.2012</li> </ul>								
<b>Budgetkontrolle</b>								
€ brutto								
<ul style="list-style-type: none"> <li>■ HH-Einstellung</li> <li>■ Zahlungsstand: 31.01.2012</li> <li>■ Kostenschätzung FB 67</li> <li>■ Kostenberechnung</li> <li>■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse</li> <li>■ Abrechnung (geschätzt)</li> </ul>								
<b>Erläuterungen</b>								
- Die bauliche Realisierung des Südknotens wurde im Zuge der Haushaltsberatungen nach 2016 geschoben.								
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>				
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>						
Grundlagenermittlung	2004	2009					●	
Planung	Jan. 2010	Dez. 2012					●	
Ausführung								
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>							
Ausschreibung								
Vergabebeschuß								
Baubeginn								
Fertigstellung								
<b>Hinweise:</b>								

Projekt		Stand: 31.01.2012		Finanzposition			HHST	4
<b>Planung + Bau Platz um Rathaus und Feuerwehr</b>				<b>2.6153.9640.000-1104</b>			<b>VH</b>	
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Hansjoachim Heck</b>				Telefon:		<b>2593</b>
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		0	30.000	40.000	100.000	350.000		<b>520.000</b>
Zahlungsstand: 31.01.2012		0	0	0	0			<b>0</b>
Kostenschätzung		vom 16.09.2008 <b>670.000</b>			vom 03.08.2009			<b>580.000</b>
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								
<b>Liquiditätsbereitstellung</b>				<b>Budgetkontrolle</b>				
<p>€ brutto</p> <p>■ HH-Einstellung    ■ Zahlungsstand: 31.01.2012</p>				<p>€ brutto</p> <p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)</p>				
<b>Erläuterungen</b>								
- Die bauliche Realisierung der Platzgestaltung kann erst nach Abschluss der Bauarbeiten für das neue Feuerwehrhaus und für den Umbau des Rathauses erfolgen.								
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>					<b>STATUS</b>	
<b>Phase</b>		<b>von</b>	<b>bis</b>					
Grundlagenermittlung		2008	2009					●
Planung		Aug. 2010	Sept. 2012					●
Ausführung		Okt. 2012	Mai 2013					●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>						
Ausschreibung								
Vergabebeschuß								
Baubeginn								
Fertigstellung								
<b>Hinweise:</b>								

Projekt		Stand: 31.01.2012		Finanzposition			HHST	5	
<b>Planung + Bau Verkehrs entw. Neckarweih. Haupt.-/Lechtstr.</b>				<b>2.6153.9610.000-1104</b>			<b>VH</b>		
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Hansjoachim Heck</b>				Telefon:		<b>2593</b>	
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.							
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>		
HH-Einstellung		20.000	40.000	60.000	400.000	400.000	<b>920.000</b>		
Zahlungsstand: 31.01.2012			2.579	0			<b>2.579</b>		
Kostenschätzung		vom 16.09.2008						<b>900.000</b>	
Kostenberechnung		vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom							
Abrechnung (geschätzt)									

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2012

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend:  
■ HH-Einstellung  
■ Zahlungsstand: 31.01.2012  
■ Kostenschätzung  
■ Kostenberechnung  
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse  
■ Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

- Die Umgestaltung von Hauptstraße und Lechtstraße sollte erst nach Fertigstellung des neuen Nordanschlusses durchgeführt werden.


<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>						<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2008	2009					●
Planung	Aug. 2010	Juni 2012					●
Ausführung							
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

<b>Hinweise:</b>	
------------------	--

Projektleiter Fachber. 67:	<b>Hansjoachim Heck</b>	Telefon: <b>2593</b>
----------------------------	-------------------------	----------------------

KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
HH-Einstellung	0	285.000	345.000				<b>630.000</b>	
Zahlungsstand: 31.01.2012			450	0			<b>450</b>	
Kostenschätzung	vom 01.07.2008						<b>535.000</b>	
Kostenberechnung	vom 02.02.2010						<b>630.000</b>	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom							
Abrechnung (geschätzt)								

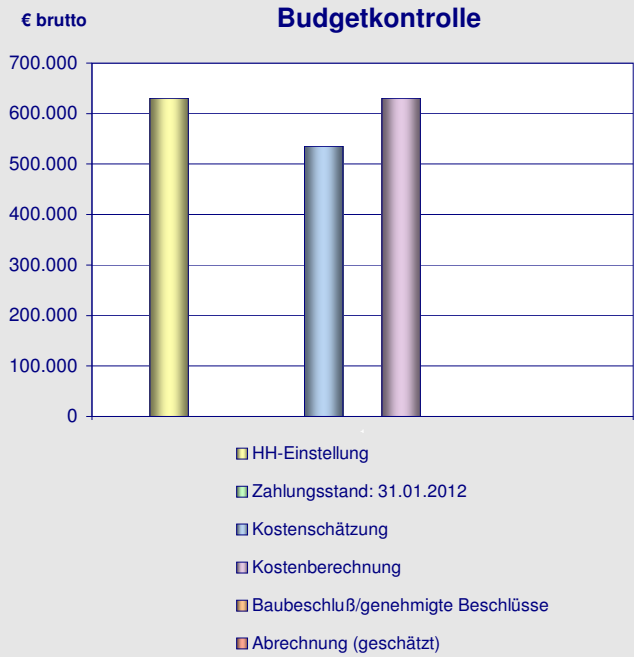

**Erläuterungen**

- 285.000 € HH-Reste aus 2010 wurden der Investitionsrücklage zugeführt.
  - Aufgrund der Planungsänderungen und der erweiterten Lärmschutzmaßnahmen für den Bereich Spitzäcker haben sich die Gesamtkosten auf 630.000 € erhöht.
  - Für den neuen Nordanschluss L 1100 sowie für den Lärmschutz Bereich Spitzäcker gehen 50 % der Kosten zu Lasten des Baugebiets, 50 % der Kosten sollen wie nachfolgend dargestellt aus dem Haushalt finanziert werden:
- Neuer Nordanschluss L 1100    440.000 € (inkl. Ablösekosten)**  
**Lärmschutz Bereich Spitzäcker    190.000 €**

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2005	2007					●
Planung	2007	März 2011					●
Ausführung	April 2011	Nov. 2011					●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn	April 2011						●
Fertigstellung		Nov. 2011					●

Hinweise:

Projekt <b>Radweg Bottwartalstraße/Marbacherstraße</b>		Stand: 31.01.2012		Finanzposition <b>2.6300.9640.000-0004</b>			HHST <b>VH</b>	<b>7</b>
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Oskar Frühwirth</b>				Telefon: <b>2495</b>		
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
		<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung				295.000				295.000
Zahlungsstand: 31.01.2012				271.577	4.036			275.613
Kostenschätzung		vom Nov 2010						250.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2012

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2012 ■ Kostenschätzung

**Erläuterungen**

- Bei der Kostenangabe handelt es sich um eine Grobkostenschätzung.
- 45.000 € HH-Reste aus 2010 wurden der Investitionsrücklage zugeführt.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>						<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2008	Juni 2010					●
Planung	Juli 2010	Feb. 2012					●
Ausführung	Mai. 2012	Sep 2012					●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

<b>Hinweise:</b>	HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 250.000€ auf 295.000€
------------------	---

Projekt		Stand: 31.01.2012		Finanzposition		HHST		8
<b>Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße</b>				<b>2.6158.9630.000-1003</b>		<b>VH</b>		
Projektleiter Fachber. 67:						Telefon:		
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				30.000	150.000	300.000		480.000
Zahlungsstand: 31.01.2012				10.700	0			10.700
Kostenschätzung vom 28.07.2011								480.000
Kostenberechnung vom								
Abrechnung (geschätzt)								
<p><b>€ brutto</b></p> <p><b>Liquiditätsbereitstellung</b></p>				<p><b>€ brutto</b></p> <p><b>Budgetkontrolle</b></p>				
<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.01.2012</p>				<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.01.2012</p> <p>■ Kostenschätzung</p> <p>■ Kostenberechnung</p> <p>■ Abrechnung (geschätzt)</p>				
<b>Erläuterungen</b>								
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>				
<b>Phase</b>	<b>von</b>		<b>bis</b>					
Grundlagenermittlung								
Planung	April 2011		Aug. 2012					●
Ausführung	Sept. 2012		März 2013					●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>							
<b>Hinweise</b>								



Projekt <b>Erschließung Waldäcker</b>	Stand: 31.01.2012	Finanzposition <b>2.6300.9610.000-0201</b>	HHST <b>VH</b>	9				
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>		Telefon: <b>2694</b>				
<b>KOSTEN</b> bis einsch.								
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung	270.000	30.000	300.000				<b>600.000</b>	
Zahlungsstand: 31.01.2012			45.222	252.400			<b>297.622</b>	
Kostenschätzung vom Dez. 2009							<b>570.000</b>	
Kostenberechnung vom Mai 2011							<b>600.000</b>	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom Juli 2011							<b>630.000</b>	
Abrechnung (geschätzt)				95%	-30.000	●	<b>600.000</b>	
<b>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</b>				<b>€ brutto Budgetkontrolle</b>				
<b>Erläuterungen</b>								
Die Erschließung soll in 2 Schritten erfolgen								
2011 - innere Erschließung								
2012- äußere Erschließung								
<b>TERMINE</b>								
		<b>SOLL</b>						<b>STATUS</b>
<b>Phase</b>	<b>von</b>		<b>bis</b>					
Grundlagenermittlung								●
Planung	Nov. 2009		Juli 2011					●
Ausführung	Sept. 2011		Juni 2012					●
<b>Meilenstein bis</b>								
Ausschreibung			Juli 2011					●
Vergabebeschluß			Juli 2011					●
Baubeginn			Sept. 2011					●
Fertigstellung			Juni 2012					●
<b>Hinweise:</b>								

Projekt	Stand: 31.01.2012	Finanzposition	HHST	10																																						
<b>Straßenbau Wöhlerstraße / Liebigstraße</b>		<b>2.6300.9611.000-0207</b>	<b>VH</b>																																							
Projektleiter Fachber. 23:	<b>Hansjoachim Heck</b>		Telefon:	<b>2632</b>																																						
<b>KOSTEN</b>	bis einsch.																																									
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>																																			
HH-Einstellung			200.000	450.000			<b>650.000</b>																																			
Zahlungsstand: 31.01.2012			292.113	68.331			<b>360.444</b>																																			
Kostenschätzung vom 09.12.2010							<b>750.000</b>																																			
Kostenberechnung vom							<b>550.000</b>																																			
Entwurfsbeschluß																																										
Abrechnung (geschätzt)																																										
<b>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</b>				<b>€ brutto Budgetkontrolle</b>																																						
<table border="1"> <caption>Liquiditätsbereitstellung</caption> <thead> <tr> <th>Jahr</th> <th>HH-Einstellung</th> <th>Zahlungsstand: 31.01.2012</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>200.000</td> <td>292.113</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>450.000</td> <td>68.331</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2012	2009	0	0	2010	0	0	2011	200.000	292.113	2012	450.000	68.331	2013	0	0	2014	0	0	<table border="1"> <caption>Budgetkontrolle</caption> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HH-Einstellung</td> <td>650.000</td> </tr> <tr> <td>Zahlungsstand: 31.01.2012</td> <td>360.444</td> </tr> <tr> <td>Kostenschätzung</td> <td>750.000</td> </tr> <tr> <td>Kostenberechnung</td> <td>550.000</td> </tr> <tr> <td>Entwurfsbeschluß</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Abrechnung (geschätzt)</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				Kategorie	Wert	HH-Einstellung	650.000	Zahlungsstand: 31.01.2012	360.444	Kostenschätzung	750.000	Kostenberechnung	550.000	Entwurfsbeschluß	0	Abrechnung (geschätzt)	0
Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2012																																								
2009	0	0																																								
2010	0	0																																								
2011	200.000	292.113																																								
2012	450.000	68.331																																								
2013	0	0																																								
2014	0	0																																								
Kategorie	Wert																																									
HH-Einstellung	650.000																																									
Zahlungsstand: 31.01.2012	360.444																																									
Kostenschätzung	750.000																																									
Kostenberechnung	550.000																																									
Entwurfsbeschluß	0																																									
Abrechnung (geschätzt)	0																																									
<b>Erläuterungen</b>																																										
- Endausbau der Straßen ist mit der Ansiedlung der Firma Lapp erforderlich.																																										
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>																																						
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>																																								
Grundlagenermittlung																																										
Planung	Dez. 2010	Mai 2011					●																																			
Ausführung	Juni 2011	Sept. 2011					●																																			
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>																																									
Ausschreibung																																										
Vergabebeschuß		26.05.2011					●																																			
Baubeginn		Juni 2011					●																																			
Fertigstellung		Sept. 2011					●																																			
<b>Hinweise:</b>	HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 300.000€ auf 200.000€																																									

Projekt <b>Kunstrasenplatz FSV Oßweil</b>	Stand: 31.01.2012	Finanzposition <b>2.5610.9640.000-0005</b>	HHST <b>VH</b>	<b>11</b>			
Projektleiter Fachber. 23: <b>Uwe Scheyhing</b>		Telefon: <b>2697</b>					
<b>KOSTEN</b>	bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung			385.000				385.000
Zahlungsstand: 31.01.2012			239.628	5.017			244.645
Kostenschätzung vom Jan. 2011							420.000
Kostenberechnung vom							
Bau- und Vergabebeschluß 21.07.2011							335.000
Abrechnung (geschätzt)							335.000

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2012

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2012 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Bau- und Vergabebeschluß ■ Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>						<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Planung	Jan. 2011	Juli 2011					●
Ausführung	Okt. 2011	Nov. 2011					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschluß	21.07.2011						●
Baubeginn	Okt. 2011						●
Fertigstellung	Nov. 2011						●

<b>Hinweise:</b>	<b>HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 520.000€ auf 385.000€</b> <b>Schlussrechnung steht noch aus.</b>
------------------	--

Projekt <b>Erschließung Sonnenberg</b>		Stand: 31.12.2011		Finanzposition <b>WBL Sonderkonto</b>			HHST <b>VH</b>	12
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Hansjoachim Heck</b>				Telefon: <b>2632</b>		
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung durch WBLB							<b>1.216.560</b>	
Zahlungsstand: 31.12.2011		675.338					<b>675.338</b>	
Kostenschätzung		vom		16.02.2010			<b>920.000</b>	
Kostenberechnung incl. Leistung SWLB		vom		24.03.2010			<b>958.513</b>	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

2009 2010 2011 2012 2013 2014

- HH-Einstellung durch WBLB
- Zahlungsstand: 31.12.2011

**€ brutto Budgetkontrolle**

- HH-Einstellung durch WBLB
- Zahlungsstand: 31.12.2011
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung incl. Leistung SWLB
- Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
- Abrechnung (geschätzt)

**Erläuterungen**

- Die finanzielle Abwicklung einschließlich Auftragsvergabe läuft über die WBL.
- Der FB 67 und die SEL übernehmen die Projektsteuerung und die technische Abwicklung.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>						<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung							
Planung	Okt. 2009	April 2010					●
Ausführung	Mai 2010	Dez. 2010					●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung	März 2010	April 2010					●
Vergabebeschluß durch WBLB		April 2010					●
Baubeginn	Mai 2010						●
Fertigstellung		Sep. 2010					●
<b>Hinweise:</b>							

Projekt <b>Straßenbau Comburgstraße (Nordteil)</b>		Stand: 31.12.2011		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>			HHST <b>VH</b>	13
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>				Telefon: <b>2694</b>		
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung							<b>1.120.000</b>	
Zahlungsstand: 31.12.2011		11.749					<b>11.749</b>	
Kostenschätzung		vom 29.12.2009					<b>1.120.000</b>	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.12.2011 (green)

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.12.2011 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

**Erläuterungen**

- Es handelt sich um den Nordteil der Comburgstraße zwischen Max-Reger-Str. und Walter-Flex-Str.
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>	<b>STATUS</b>	
Phase	von	bis	
Grundlagenermittlung		2011	●
Planung		2012	●
Ausführung	2013		
<b>Meilenstein bis</b>			
Ausschreibung			
Vergabebeschluß			
Baubeginn			
Fertigstellung			

<b>Hinweise:</b>	
------------------	--

Projekt <b>Straßenbau Walter-Flex-Straße</b>		Stand: 31.12.2011		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>			HHST <b>VH</b>	14
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>				Telefon: <b>2694</b>		
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung							<b>1.190.000</b>	
Zahlungsstand: 31.12.2011			12.600				<b>12.600</b>	
Kostenschätzung		vom 08.10.2009					<b>1.190.000</b>	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.12.2011 (green)

**€ brutto Budgetkontrolle**

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.12.2011 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

**Erläuterungen**

- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedlung im Baugebiet ab.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>					<b>STATUS</b>
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung		Feb. 2011				●
Planung	März 2011	März 2012				●
Ausführung	Juli. 2012	April. 2013				●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Ausschreibung						
Vergabebeschluß						
Baubeginn						
Fertigstellung						

<b>Hinweise:</b>	
------------------	--

Projekt <b>Straßenbau Neckarweihingerstraße</b>		Stand: 31.12.2011		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>			HHST <b>VH</b>	15
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Martin Renz</b>				Telefon: <b>2694</b>		
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.						
	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung							<b>1.200.000</b>	
Zahlungsstand: 31.12.2011		15.700	126.966	70.000			<b>212.666</b>	
Kostenschätzung		vom Juni 2010					<b>1.100.000</b>	
Kostenberechnung		vom Juli 2011					<b>1.200.000</b>	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom					<b>1.200.000</b>	
Abrechnung (geschätzt)							<b>1.200.000</b>	

**€ brutto Liquiditätsbereitstellung**

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.12.2011
2009	0	0
2010	0	~20.000
2011	0	~150.000
2012	0	~100.000
2013	0	0
2014	0	0

**€ brutto Budgetkontrolle**

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.12.2011	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)
2009	1.200.000	0	0	0	0	0
2010	0	~20.000	0	0	0	0
2011	0	~150.000	1.100.000	0	0	0
2012	0	~100.000	0	1.200.000	0	0
2013	0	0	0	0	1.200.000	0
2014	0	0	0	0	0	1.200.000

**Erläuterungen**

- Es handelt sich um die gesamte Neckarweihinger Str., sowohl alter Ortskern, als auch entlang Hartenecker Höhe


<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>						<b>STATUS</b>
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Nov. 2010					●
Planung	Dez. 2010	Juli 2011					●
Ausführung	Okt. 2011	Juli 2012					●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>						
Ausschreibung		Aug.2011					●
Vergabebeschluß		Sept. 2011					●
Baubeginn		Okt. 2011					●
Fertigstellung		Juli 2012					●

**Hinweise:**

Projekt <b>Grünbühl / Sonnenberg</b>	Stand: 31.01.2012 <b>- Quartiersplatz - Außenanlagen MGH / KIFAZ</b>	Finanzposition <b>2.6158.9410.670-1003</b>	HHST <b>VH</b>	16
---	---	---	-------------------	----

Projektleiter Fachber. 67: **Heike Reyser** Telefon: **2748**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
HH-Einstellung		20.000	75.000	490.000	182.000		<b>767.000</b>
Zahlungsstand: 31.01.2012		13.150	95.279	2.294			<b>110.723</b>
Kostenschätzung	vom						<b>760.000</b>
Kostenberechnung	vom						<b>760.000</b>
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 26.05.2011, Vorl.Nr. 216/11 + vom 10.11.2011 Vorl.Nr. 452/11						<b>750.000</b>
Abrechnung (geschätzt)							<b>●</b>

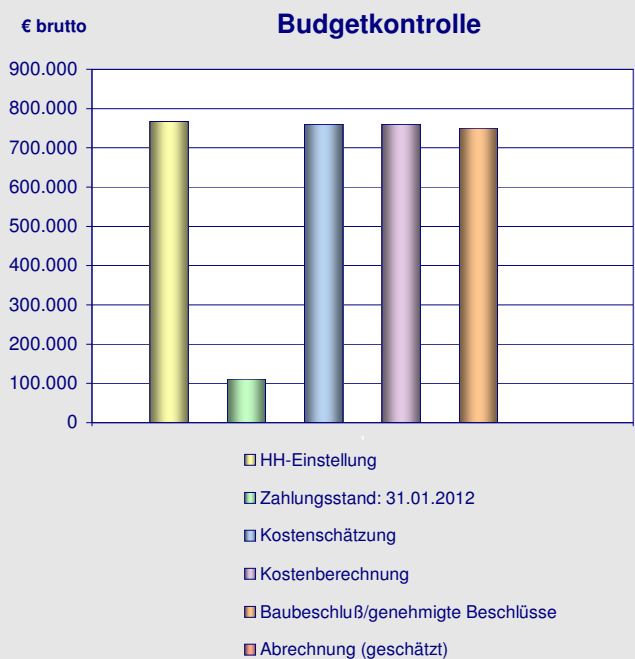

**Erläuterungen**

**Mit Finanzplan Neuverteilung der Mittel**

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	März 2009	Mai 2009				●
Planung	Aug. 2010	Jan. 2012				●
Ausführung	Feb. 2012	Juli 2012				●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Ausschreibung		Okt. 2011				●
Vergabebeschuß		Nov 2011				●
Baubeginn		Feb/März 2012				●
Fertigstellung		Juli 2012				●

**Hinweise:** HH-Ansatz wurde im Nachtrag 2011 geändert von 250.000€ auf 75.000€



Projekt <b>Hartenecker Höhe - Außenanlagen KIFAZ - Kinderspielplatz</b>		Stand: 31.12.2011		Finanzposition <b>Sonderkonto</b>		HHST <b>VH</b>	17
Projektleiter Fachber. 67:		<b>Gabriele Heusel-Voraus</b>				Telefon: <b>2073</b>	
<b>KOSTEN</b>		bis einsch.					
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung							995.000
Zahlungsstand: 31.12.2011		10.799	812.916				823.715
Kostenschätzung		vom 25.02.2010 (Büro Mundsinger + Hans / FB 67)					700.000
Kostenberechnung		vom 16.11.2010 (Büro Mundsinger + Hans / FB67))					891.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 29.04.2010, Vorl.Nr. 186/10 + 02.12.2010, Vorl.Nr. 529/10					980.000
Abrechnung (geschätzt)						●	980.000
<b>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</b> 				<b>€ brutto Budgetkontrolle</b> 			
<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.12.2011		<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.12.2011 <input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse <input type="checkbox"/> Abrechnung (geschätzt)					
<b>Erläuterungen</b>							
- Die finanzielle Abwicklung erfolgt beim Referat NSE über das Sonderkonto Hartenecker Höhe							
<b>TERMINE</b>		<b>SOLL</b>				<b>STATUS</b>	
<b>Phase</b>	<b>von</b>	<b>bis</b>					
Grundlagenermittlung	Dez. 2009	April 2010					●
Planung	Mai 2010	April 2011					●
Ausführung	Mai 2011	Sept. 2011					●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>					
Ausschreibung		Feb. 2011					●
Vergabebeschuß		Mai 2011					●
Baubeginn		Mai 2011					●
Fertigstellung		Sept. 2011					●
<b>Hinweise:</b>							
