


Blatt 1		STATUS			Jahr: 2012																																															
Projekt	Kosten	Termine	Finanzposition	2012												2013												2014												2015												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	●	●	2.2210.9440.000-0103																																																
7	Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner	●	●	2.2130.9410.000-0112																																																
8	Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule	●	●	2.2130.9410.000-0101																																																
9	Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung	●	●	2.2110.9410.000-0103																																																
15	Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	●	●	2.4641.9440.000-0421																																																
16	Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	●	●	2.6158.9410.000-1003																																																
25	Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum	●	●	Finanzierung WBL																																																
26	Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen	●	●	2.6153.9410.000-1104																																																
47	Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau	●	●	2.2110.9410.000-0413																																																
48	Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen	●	●	2.4641.9410.000-0901																																																
49	Seestraße. 37 - Generalsan. Goethe-Gymnasium	●	●	2.2300.9440.000-0132																																																
77	Erdmannhäuser Str. 7-9 - KiFaZ Poppenweiler	●	●	2.6159.9410.000-1202																																																

Kostenübersicht Haushaltsjahr	2012	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 65	3.329.700	890.709	
INKAS - Projekte	9.825.000	2.348.938	

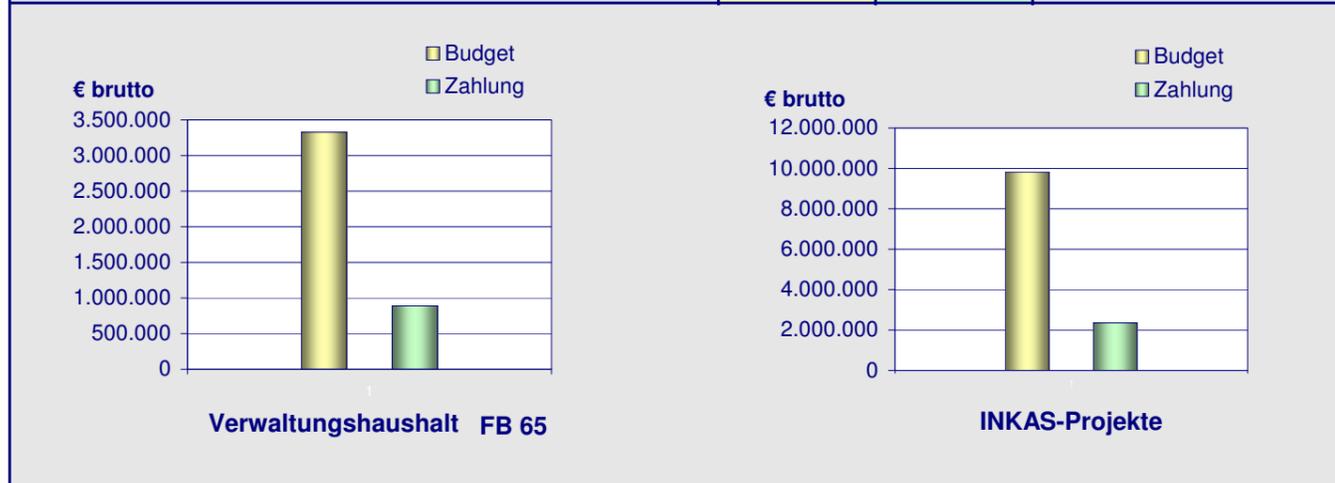

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten

- Günstiger oder nicht teurer
- bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- > 10 %, über 100.000 €

Termine

- entsprechend Rahmenterminplan
- Rahmenterminplan fraglich
- Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 7: geschätzte Abrechnung ca. -180.000 € unter Beschluss

zu 8: wie berichtet. Budgetfestlegung erfolgt mit Entwurfs- und Baubeschluss

zu 16: + 49.000 € über Beschluss

zu 25: + 95.000 € über Beschluss

zu 47: enger Planungszeitraum, Baubeginn unmittelbar vor der kalten Jahreszeit
