


Projekt Friedenstraße 1. und 2. BA		Stand: 31.01.2013		Finanzposition 2.6300.9640.000-0208			HHST VH	1
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon: 2694		
KOSTEN		bis einschl.						
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				24.100	675.900			700.000
Zahlungsstand: 31.01.2013				24.013	367.120			391.133
Kostenberechnung				vom 16.02.2011				680.000
Bau- und Vergabebeschluss				vom				680.000
Abrechnung (geschätzt)							●	680.000
Liquiditätsbereitstellung		Budgetkontrolle						
€ brutto		€ brutto						
<p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2013</p>		<p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2013 ■ Kostenberechnung ■ Bau- und Vergabebeschluss ■ Abrechnung (geschätzt)</p>						
Erläuterungen								
- Ausschreibung / Vergabe in zwei Abschnitten:								
BA 1 380.000 € (Kostenschätzung)								
BA 2 300.000 € (Kostenschätzung)								
Für den 2. BA wurde eine getrennte Ausschreibung durchgeführt.								
TERMINE		SOLL			STATUS			
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung		April 2011						●
Planung	April 2011	Mai 2011						●
Ausführung	Okt. 2011	Dez. 2012						●
Meilenstein	bis							
Ausschreibung / Vergabe BA 1								
Ausschreibung / Vergabe BA 2								
Vergabebeschluss		Okt. 2011						●
Baubeginn		Okt. 2011						●
Fertigstellung		März 2013						●
Hinweise:								

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
HH-Einstellung Zugwiesen	77.647	298.689	2.409.801	1.007.000	380.000		4.173.137
Zahlungsstand: 31.01.2013	77.647	298.689	2.409.801	847.630	85.967		3.719.734
Kostenschätzung vom Juni 2009							3.400.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09 vom 22.07.2009							3.400.000
Abrechnung (geschätzt)						●	3.400.000

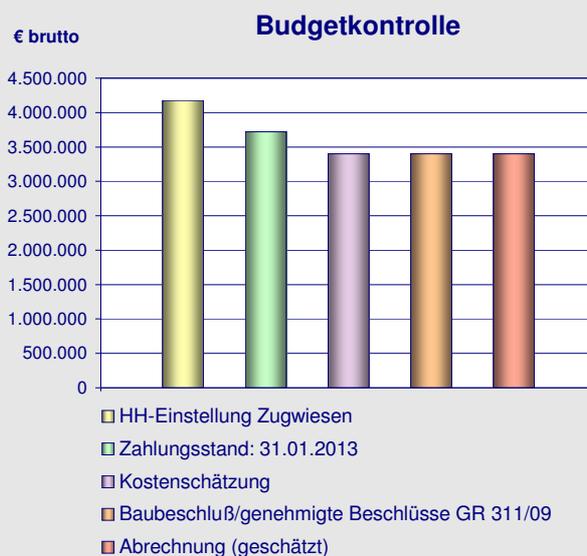

Erläuterungen

- Im Zahlungstand sind Ausgaben für die Aussichtsplattform enthalten, die von Euronatur erstattet werden.
- Im Zahlungsstand sind ferner Ausgaben für Kostenteile des WSA enthalten, die mit dem WSA verrechnet werden.
- Beginn 2. Bauabschnitt mit Dammbau und Sanierung Neckarufers im März 2013.
- Die Beauftragung und Federführung im 2. Bauabschnitt liegt beim WSA.

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1998	1999				●
Planung	2000	Juni 2010				●
Ausführung	2011	2012				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung	Dez. 2010	März 2011				●
Vergabebeschluß		Mai 2011				●
Baubeginn		Juli 2011				●
Fertigstellung		Mai 2012				●

Hinweise:	
------------------	--

Projekt Planung + Bau Verkehrsentwicklung Neckarweihingen Haupt-/Lechtstr. und Rathausplatz	Stand: 31.01.2013	Finanzposition 2.6153.9610.000-1104	HHST VH	4
---	-------------------	---	-------------------	----------

Projektleiter Fachber. 67: **Hansjoachim Heck** Telefon: **2593**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2011	2012	2013	2014	2015		
HH-Einstellung	177.400	60.000	312.600	1.300.000		1.850.000	
Zahlungsstand: 31.01.2013	10.079	37.917	61.499			109.495	
Kostenschätzung	vom Mai 2012					1.480.000	
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 10. Okt. 2012					1.885.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	1.885.000



Erläuterungen

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	2008	2009				●
Planung	Aug. 2010	Dez. 2012				●
Ausführung	Jan. 2013	Aug. 2014				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung	Okt. 2012	Nov. 2012				●
Vergabebeschuß		12.12.2012				●
Baubeginn		04.03.2013				●
Fertigstellung						

Hinweise: 77.400 € HH-Reste wurden von 2011 nach 2012 übertragen

Projekt Verkehrliche Verbesserung Bottwartalstraße		Stand: 31.01.2013		Finanzposition siehe Erläuterungen			HHST VH	5
Projektleiter Fachber. 67:		Oskar Frühwirth				Telefon: 2495		
KOSTEN		bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung				420.000			420.000	
Zahlungsstand: 31.01.2013					424.500		424.500	
Kostenschätzung		vom						
Kostenberechnung		vom Dez. 2011						420.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 02.02.2012						420.000
Abrechnung (geschätzt)								
€ brutto Liquiditätsbereitstellung				€ brutto Budgetkontrolle				
<p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2013</p>				<p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2013 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)</p>				
Erläuterungen								
Kostenverteilung								
Radwege und Umbau Bushaltestellen	230.000 €	2.6300.9640.000-0004/ 2.7920.9640.000.0002						
Umbaumaßnahmen Unfallschwerpunkt	100.000 €	2.6300.9650.000-0005						
Fahrbahnsanierungen	90.000 €	1.6300.5110.000						
Gesamtmaßnahme	420.000 €							
TERMINE								
Phase	SOLL						STATUS	
	von	bis						
Grundlagenermittlung	2010	Juli 2011					●	
Planung	Aug. 2011	Mai 2012					●	
Ausführung	Juni 2012	Okt. 2012					●	
Meilenstein	bis							
Ausschreibung	März 2012	April 2012					●	
Vergabebeschuß	Mai 2012						●	
Baubeginn	Juni 2012						●	
Fertigstellung		Okt. 2012					●	
Hinweise:								

Projekt		Stand: 31.01.2013		Finanzposition		HHST		6
Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße				2.6158.9630.000-1003		VH		
Projektleiter Fachber. 67:		Jürgen Müller				Telefon:		2435
KOSTEN		bis einsch.						
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt
HH-Einstellung			30.000	150.000	300.000	50.000		530.000
Zahlungsstand: 31.01.2013			10.700	18.811	5.969			35.480
Kostenschätzung		vom 28.07.2011						530.000
Kostenberechnung		vom						
Entwurfsbeschluss		vom 24.05.2012						530.000
Abrechnung (geschätzt)								530.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2013

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2013 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Entwurfsbeschluss ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- zusätzlich kommen Kosten zur Sanierung der Aldinger Straße sowie umfangreiche Radwegsanierungsarbeiten

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2010	März 2011					●
Planung	April 2011	Feb. 2013					●
Ausführung	April 2013	Dez. 2013					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung	Jan. 2013	Feb. 2013					●
Bau- und Vergabebeschluss		März 2013					●
Baubeginn		April 2013					●

Hinweise	
-----------------	--

Projekt Eberhardstraße 1. BA	Stand: 31.01.2013	Finanzposition 2.6151.9640.000-0108	HHST VH	7			
Projektleiter Fachber. 67: Martin Renz		Telefon: 2694					
KOSTEN	bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				50.000	350.000		400.000
Zahlungsstand: 31.01.2013				68.777	89.755		158.532
Kostenschätzung vom Mai 12							390.000
Kostenberechnung vom							
Baubeschluß							430.000
Abrechnung (geschätzt)							● 430.000
<p>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</p> 				<p>€ brutto Budgetkontrolle</p> 			
<p>Erläuterungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baubeginn Kanalsanierung Oktober 2012 - Kanalkosten sind nicht in Projektkosten enthalten, Kostentragung durch SEL 							
TERMINE		SOLL			STATUS		
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Feb. 2012					●
Planung	März 2012	Sept. 2012					●
Ausführung	Okt. 2012	Mai 2013					●
Meilenstein							
		bis					
Ausschreibung		Aug. 2012					●
Vergabebeschuß		Sept. 2012					●
Baubeginn		Okt. 2012					●
Fertigstellung		Mai 2013					●
Hinweise:							

Projekt Grünbühl / Sonnenberg		Stand: 31.01.2013		Finanzposition 2.6158.9410.670-1003		HHST VH		8
- Quartiersplatz - Außenanlagen MGH / KIFAZ		Projektleiter Fachber. 67: Heike Reyser				Telefon: 2748		
KOSTEN		bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung		20.000	75.000	490.000	175.000		760.000	
Zahlungsstand: 31.01.2013		13.150	95.279	262.361	52.754		423.544	
Kostenschätzung vom							760.000	
Kostenberechnung vom							760.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 26.05.2011, Vorl.Nr. 216/11 + vom 10.11.2011 Vorl.Nr. 452/11							750.000	
Abrechnung (geschätzt)							750.000	

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2013
2009	0	0
2010	20.000	13.150
2011	75.000	95.279
2012	490.000	262.361
2013	175.000	52.754
2014	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2013	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)
2009	0	0	0	0	0	0
2010	20.000	13.150	20.000	20.000	20.000	20.000
2011	75.000	95.279	75.000	75.000	75.000	75.000
2012	490.000	262.361	490.000	490.000	490.000	490.000
2013	175.000	52.754	175.000	175.000	175.000	175.000
2014	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2009	Mai 2009					●
Planung	Aug. 2010	Jan. 2012					●
Ausführung	Feb. 2012	Dez. 2012					●
Meilenstein							
Ausschreibung		Okt. 2011					●
Vergabebeschuß		Nov 2011					●
Baubeginn		März 2012					●
Fertigstellung		April 2013					●

Hinweise:	Behinderung durch Bauverzögerung Hochbau (Konkurs Rohbaufirma - mangelhafte Leistungen) GaLaBauFirma war 6 Wochen im Auftrag Hochbau für Ersatzvornahme mangelhaft ausgeführter Leistungen tätig
------------------	---

Projekt Parkierungskonzept Oststadt	Stand: 31.01.2013	Finanzposition 2.6800.9610.000-0401	HHST VH	9			
Projektleiter Fachber. 67: Andreas Uhl		Telefon: 2298					
KOSTEN	bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				260.000	790.000		1.050.000
Zahlungsstand: 31.01.2013				0	0		0
Kostenschätzung vom Aug. 2011							780.000
Kostenberechnung vom Juni 2012							1.050.000
Baubeschluß vom 25.07.12 Vorl.Nr. 227/12							1.050.000
Abrechnung (geschätzt)						●	1.050.000
<p>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</p> <p>Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.01.2013 (green)</p>				<p>€ brutto Budgetkontrolle</p> <p>Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.01.2013 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)</p>			
Erläuterungen							
- Die Finanzmittel für die beschlossene große Lösung des Parkierungskonzepts Oststadt werden im Haushalt 2013 bereitgestellt.							
TERMINE		SOLL			STATUS		
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2007	2012					●
Planung	2010	Jan. 2013					●
Ausführung	Feb. 2013	Juni 2013					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Feb. 2013					●
Vergabebeschluß		März 2013					●
Baubeginn		März 2013					●
Fertigstellung		Juni 2013					●
Hinweise:							

Projekt Brücke Radweg Neckarterrasse	Stand: 31.01.2013	Finanzposition 2.6300.9640.000-1102	HHST VH	10			
Projektleiter Fachber. 67: Martin Mundt		Telefon: 2592					
KOSTEN	bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung				60.000	660.000	200.000	920.000
Zahlungsstand: 31.01.2013					4.000		4.000
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom							
Baubeschluß vom							
Abrechnung (geschätzt)						●	
€ brutto Liquiditätsbereitstellung 				€ brutto Budgetkontrolle 			
<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.01.2013				<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.01.2013 <input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Baubeschluß <input type="checkbox"/> Abrechnung (geschätzt)			
Erläuterungen							
TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2011	Juli 2012					●
Planung	Juli 2012	Aug. 2013					●
Ausführung	Sept. 2013	April 2014					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung	Mai 2013						●
Vergabebeschuß							●
Baubeginn	Sept. 2013						●
Fertigstellung							●
Hinweise:							

Projekt Kunstrasenplatz SKV Eglosheim		Stand: 31.01.2013		Finanzposition 2.5610.9640.000-0005		HHST VH		11	
Projektleiter Fachber. 67:		Uwe Scheyhing				Telefon:		2697	
KOSTEN		bis einsch.							
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung						450.000		450.000	
Zahlungsstand: 31.01.2013						13.258		13.258	
Kostenschätzung		vom Oktober 2012						450.000	
Kostenberechnung		vom							
Baubeschluß		vom							
Abrechnung (geschätzt)								●	
€ brutto		Liquiditätsbereitstellung			€ brutto				Budgetkontrolle
500.000		500.000			500.000				
450.000		450.000			450.000				
400.000		400.000			400.000				
350.000		350.000			350.000				
300.000		300.000			300.000				
250.000		250.000			250.000				
200.000		200.000			200.000				
150.000		150.000			150.000				
100.000		100.000			100.000				
50.000		50.000			50.000				
0		0			0				
2009		2009			2009				
2010		2010			2010				
2011		2011			2011				
2012		2012			2012				
2013		2013			2013				
2014		2014			2014				
□ HH-Einstellung		□ HH-Einstellung			□ HH-Einstellung				□ HH-Einstellung
□ Zahlungsstand: 31.01.2013		□ Zahlungsstand: 31.01.2013			□ Zahlungsstand: 31.01.2013				□ Zahlungsstand: 31.01.2013
									□ Kostenschätzung
									□ Kostenberechnung
									□ Baubeschluß
									□ Abrechnung (geschätzt)
Erläuterungen									
TERMINE		SOLL						STATUS	
Phase		von	bis						
Grundlagenermittlung								●	
Planung		Nov. 2012	Juni 2013					●	
Ausführung		Juli 2013	Nov. 2013					●	
Meilenstein		bis							
Ausschreibung								●	
Vergabebeschluß								●	
Baubeginn								●	
Fertigstellung								●	
Hinweise:									

Projekt		Stand: 31.01.2013		Finanzposition			HHST	12	
Straßenbau Comburgstraße (Nordteil)		Sonderkonto					VH		
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon:		2694	
KOSTEN		bis einsch.							
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt		
HH-Einstellung							1.120.000		
Zahlungsstand: 31.01.2013		11.749		0			11.749		
Kostenschätzung		vom 29.12.2009						1.120.000	
Kostenberechnung		vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom							
Abrechnung (geschätzt)									

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.01.2013 (green)

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.01.2013 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

Erläuterungen

- Es handelt sich um den Nordteil der Comburgstraße zwischen Max-Reger-Str. und Walter-Flex-Str.
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		2011					●
Planung	2012	2013					●
Ausführung	2014						●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:

Projekt Straßenbau Walter-Flex-Straße		Stand: 31.01.2013		Finanzposition Sonderkonto		HHST VH		13
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon: 2694		
KOSTEN		bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung							1.405.000	
Zahlungsstand: 31.01.2013			12.600	71.938	12.285		96.823	
Kostenschätzung		vom		08.10.2009			1.230.000	
Kostenberechnung		vom		02.05.2012			1.370.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom		20.09.2012			1.405.000	
Abrechnung (geschätzt)						<input checked="" type="checkbox"/>		1.405.000
€ brutto Liquiditätsbereitstellung 				€ brutto Budgetkontrolle 				
<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.01.2013				<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.01.2013 <input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse <input type="checkbox"/> Abrechnung (geschätzt)				
<u>Erläuterungen</u>								
TERMINE		SOLL		STATUS				
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung		Feb. 2011						●
Planung	März 2011	Mai 2012						●
Ausführung	Okt. 2012	Okt. 2013						●
Meilenstein		bis						
Ausschreibung								
Vergabebeschluß		Sept. 2012						●
Baubeginn		Okt. 2012						●
Fertigstellung								
Hinweise:								

Projekt Straßenbau Neckarweihingerstraße		Stand: 31.01.2013		Finanzposition Sonderkonto			HHST VH	14
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Renz				Telefon: 2694		
KOSTEN		bis einsch.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung							1.200.000	
Zahlungsstand: 31.01.2013		15.700	126.966	460.907	2.326		605.899	
Kostenschätzung		vom Juni 2010					1.100.000	
Kostenberechnung		vom Juli 2011					1.200.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom					1.200.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	1.200.000	

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: ■ HH-Einstellung, ■ Zahlungsstand: 31.01.2013

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: ■ HH-Einstellung, ■ Zahlungsstand: 31.01.2013, ■ Kostenschätzung, ■ Kostenberechnung, ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse, ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- Es handelt sich um die gesamte Neckarweihinger Str., sowohl alter Ortskern, als auch entlang Hartenecker Höhe



TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Nov. 2010					●
Planung	Dez. 2010	Juli 2011					●
Ausführung	Okt. 2011	Juli 2012					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Aug.2011					●
Vergabebeschluß		Sept. 2011					●
Baubeginn		Okt. 2011					●
Fertigstellung		Juli 2012					●

Hinweise:	
------------------	--

Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA	Sonderkonto	VH
--	--------------------	-----------

Projektleiter Fachber. 67: **Gabriele Heusel-Voraus** Telefon: **2073**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	
HH-Einstellung							1.330.000
Zahlungsstand: 31.01.2013		28.745	43.118	708.466			780.329
Kostenschätzung	vom 09.06.2010 (Planstatt Senner)						1.300.789
Kostenberechnung	vom 03.03.2011 (Planstatt Senner)						1.363.817
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 26.10.11 V.Nr. 395/11, Vergabeb. 26.04.12, V.Nr. 120/12						1.330.000
Abrechnung (geschätzt)							1.330.000

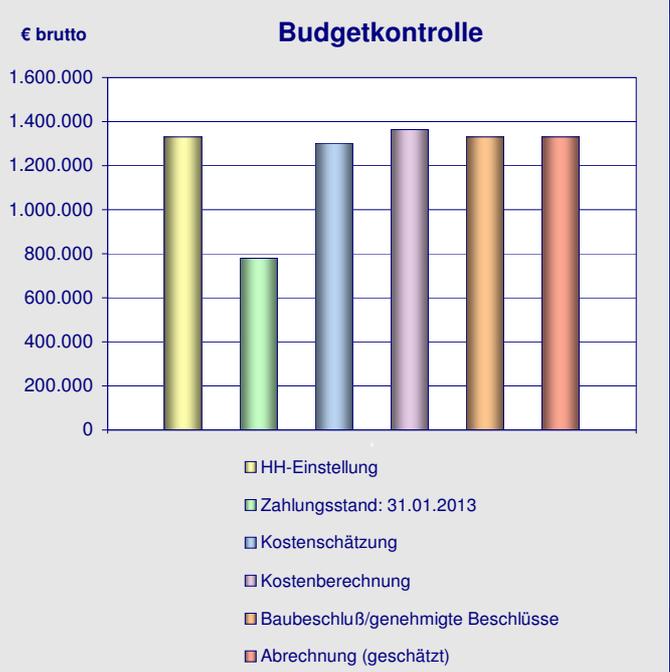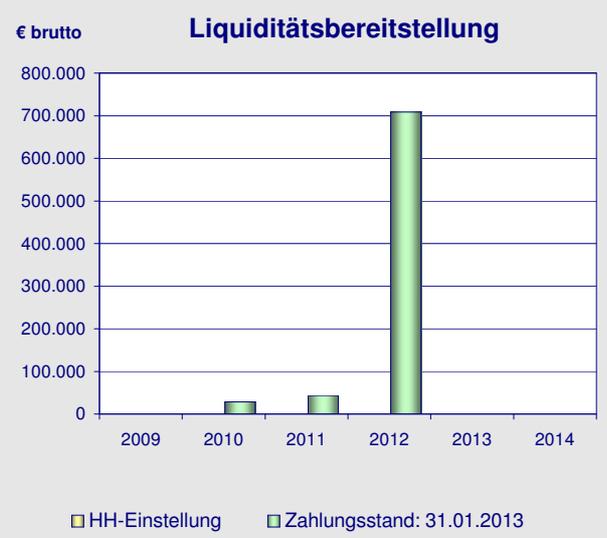

Erläuterungen

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2010	Dez. 2010					●
Planung	Jan. 2011	April 2012					●
Ausführung	Mai 2012	Dez. 2012					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Febr. 2012					
Vergabebeschuß		April 2012					●
Baubeginn		Mai 2012					●
Fertigstellung		März 2013					●

Hinweise: Der Endbelag (Possehl-Belag) kann aus Witterungsgründen erst im Frühjahr 2013 eingebaut werden
