


KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
HH-Einstellung			2.000.000	2.150.000	500.000			4.650.000
Zahlungsstand: 31.05.2014			845.336					845.336
Kostenschätzung	vom							5.150.000
Kostenberechnung	vom							
Bau- und Vergabebeschuß Nord / Entwurfsbeschuß Süd	vom 09.12.2013 / GR 26.02.2014							5.150.000
Abrechnung (geschätzt)							●	5.150.000

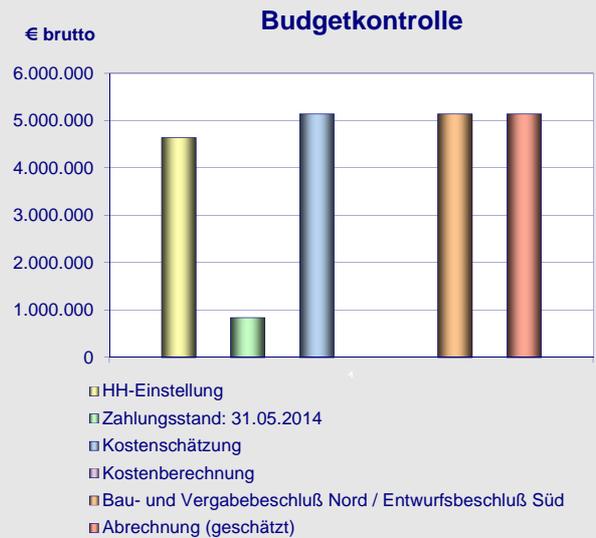

Erläuterungen

BA Nord: 2.820.000 €
BA Süd: 2.330.000 €
gesamt: 5.150.000 €

TERMINE	SOLL	STATUS
Phase	von	bis
Grundlagenermittlung Nord		März 2013
Planung Nord	März 2013	Dez. 2013
Ausführung Nord	Jan. 2014	Nov. 2014
Grundlagenermittlung Süd		
Planung Süd	Aug. 2013	Aug. 2014
Ausführung Süd	Sept. 2014	Aug. 2015
Meilenstein bis		
Ausschreibung		Okt. 2013
Vergabebeschuß Nord		09.12.2013
Ausbau Nord	Jan. 2014	Nov. 2014
Fertigstellung Nord		Dez. 2014
Ausschreibung		
Vergabebeschuß Süd		Juli 2014
Ausbau Süd	Sept. 2014	
Fertigstellung Süd		Okt. 2015

Hinweise:

Projekt Zugwiesen	Stand: 31.05.2014	Investitionsauftrag 755400009017	FinHH	2			
Projektleiter Fachber. 67:		Bernd Wenger, Günter Schlecht		Telefon: 2759			
KOSTEN	bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt
HH-Einstellung Zugwiesen	77.647	298.689	2.409.801	847.630	340.996	250.000	4.224.763
Zahlungsstand: 31.05.2014	77.647	298.689	2.409.801	847.630	340.996	40.342	4.015.105
Kostenschätzung vom Juni 2009							3.400.000
Baubeschluss/genehmigte Beschlüsse GR 311/09 vom 22.07.2009							3.400.000
Abrechnung (geschätzt)							3.400.000
<p>Liquiditätsbereitstellung</p> <p>€ brutto</p> <p>Legend: ■ HH-Einstellung Zugwiesen ■ Zahlungsstand: 31.05.2014</p>				<p>Budgetkontrolle</p> <p>€ brutto</p> <p>Legend: ■ HH-Einstellung Zugwiesen ■ Zahlungsstand: 31.05.2014 ■ Kostenschätzung ■ Baubeschluss/genehmigte Beschlüsse GR 311/09 ■ Abrechnung (geschätzt)</p>			
Erläuterungen							
<ul style="list-style-type: none"> - Im Zahlungstand sind Ausgaben für die Aussichtsplattform enthalten, die von Euronatur erstattet werden. - Im Zahlungsstand sind ferner Ausgaben für Kostenteile des WSA enthalten, die mit dem WSA verrechnet werden. - Beginn 2. Bauabschnitt mit Dammbtrag und Sanierung Neckarufer im April 2013. - Die Beauftragung und Federführung im 2. Bauabschnitt liegt beim WSA. - Fertigstellung 2. BA verschiebt sich durch Einsatz der Wasserbaufirma zur Beseitigung von Hochwasserschäden. - Ausführung von Restarbeiten im März/April 2014. 							
TERMINE		SOLL		2. Bauabschnitt		STATUS	
Phase	von	bis	von	bis			
Grundlagenermittlung	1998	1999					●
Planung	2000	Juni 2010					●
Ausführung	2011	2012		April 2013	April 2014		●
Meilenstein							
	bis						
Ausschreibung	Dez. 2010	März 2011					●
Vergabebeschluss		Mai 2011					●
Baubeginn		Juli 2011		April 2013			●
Fertigstellung 1. BA		Mai 2012		April 2014			●
Hinweise:	HH-Ansatz 2013 enthält 159.000€ HH-Reste aus 2012						

Projekt Alt-Württemberg-Allee		Stand: 31.05.2014		Investitionsauftrag 754106704017			FinHH 3
Projektleiter Fachber. 67: Oskar Frühwirth				Telefon: 2495			
KOSTEN		bis einsch.					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			10.807	50.000	500.000	480.000	1.040.807
Zahlungsstand: 31.05.2014			10.807	0			10.807
Kostenschätzung		vom siehe HH-Einstellung					1.040.807
Kostenberechnung		vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom					
Abrechnung (geschätzt)							

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Budgetkontrolle

€ brutto

Erläuterungen



Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

Phase	SOLL		von	bis	STATUS
	von	bis			
Grundlagenermittlung	Feb. 2014	Mai 2014			●
Planung	Juni 2014	März 2015			●
Ausführung	April 2015	April 2016			●
Meilenstein	bis				
Ausschreibung					●
Vergabebeschuß					●
Baubeginn					●
Fertigstellung					●
Hinweise:					

Projekt	Stand: 31.05.2014	Investitionsauftrag	4
Planung + Bau Verkehrsentwicklung Neckarweihingen Haupt.-/Lechtstr. und Rathausplatz		754106711037 754106711047	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Hansjoachim Heck** Telefon: **2632**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2011	2012	2013	2014	2015		
HH-Einstellung	10.079	37.917	1.718.269	350.000		2.116.265	
Zahlungsstand: 31.05.2014	10.079	37.917	1.718.269	110.369		1.876.634	
Kostenschätzung	vom						
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 10. Okt. 2012					1.885.000	
Abrechnung (geschätzt)						1.885.000	

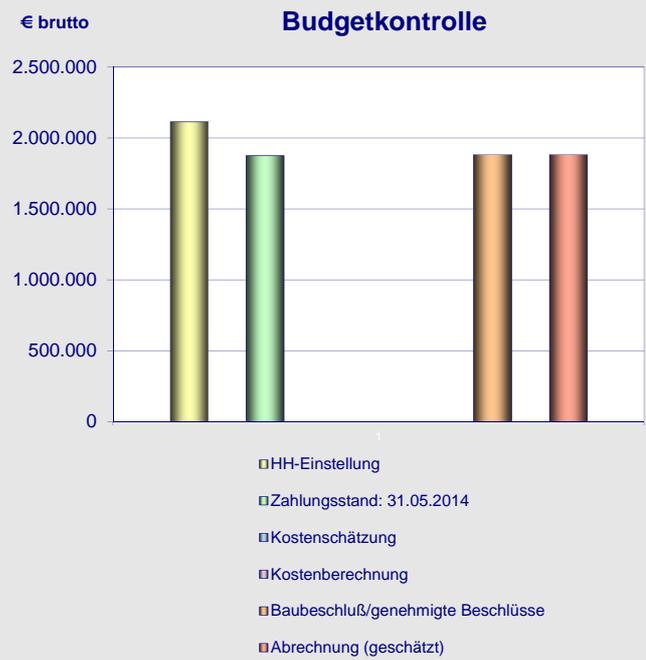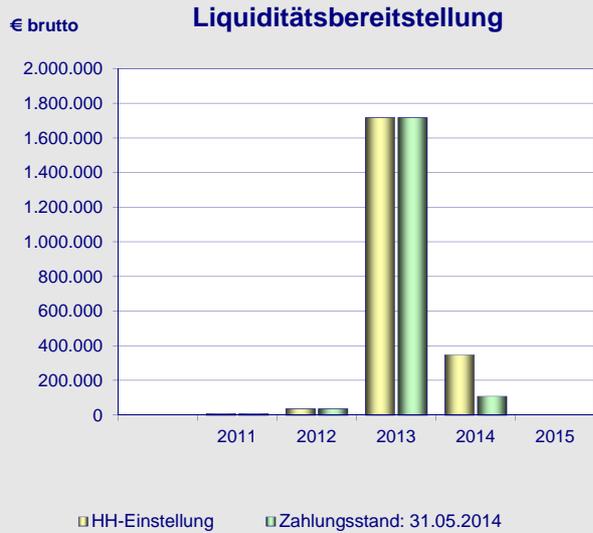

Erläuterungen


Phase	SOLL		STATUS
	von	bis	
Grundlagenermittlung	2008	2009	●
Planung	Aug. 2010	Dez. 2012	●
Ausführung	Jan. 2013	Okt. 2013	●
Meilenstein	bis		
Ausschreibung	Okt. 2012	Nov. 2012	●
Vergabebeschuß		12.12.2012	●
Baubeginn		04.03.2013	●
Fertigstellung		Okt. 2013	

Hinweise: HH-Ansatz 2013 enthält 199.400 € HH-Reste aus 2012
 Freigabe für den Verkehr in der KW 43. Offizielle Einweihung in Verbindung mit dem Kiesranzenfest im Mai 2014
 Schlussrechnung liegt noch nicht vor.

Projekt	Stand: 31.05.2014	Investitionsauftrag	5
Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße		754106704047	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Jürgen Müller** Telefon: **2435**

KOSTEN	bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			50.000	500.000	250.000		800.000
Zahlungsstand: 31.05.2014			0				0
Kostenschätzung	vom siehe HH-Einstellung						800.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

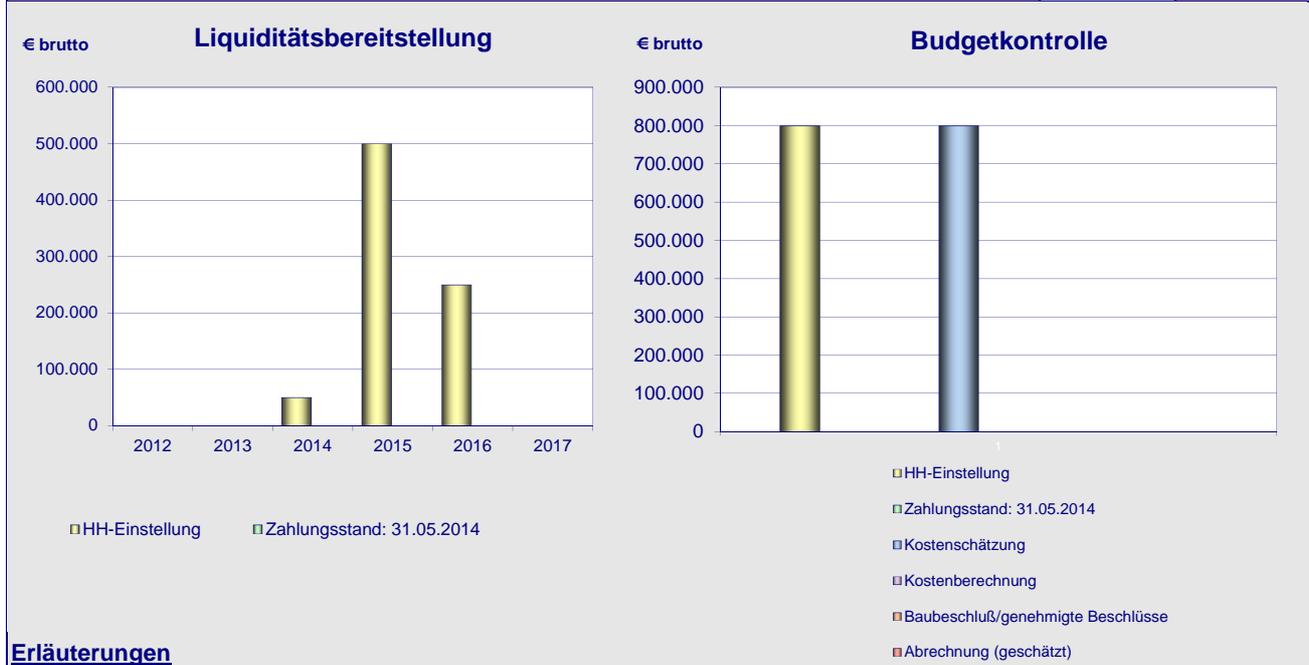

Erläuterungen

Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

Phase	TERMINE		SOLL		STATUS
	von	bis	von	bis	
Grundlagenermittlung	März 2014	Juli 2014			●
Planung	Aug. 2014	April 2015			●
Ausführung	Mai 2015	Mai 2012			●
Meilenstein	bis				
Ausschreibung					●
Vergabebeschuß					●
Baubeginn					●
Fertigstellung					●
Hinweise:					

Projekt		Stand: 31.05.2014		Investitionsauftrag			6	
Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße				754106710017			FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:		Jürgen Müller			Telefon: 2435			
KOSTEN		bis einschl.						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung		10.700	18.811	517.818	150.000		697.329	
Zahlungsstand: 31.05.2014		10.700	18.811	517.818	5.815		553.144	
Kostenschätzung		vom 28.07.2011					530.000	
Kostenberechnung		vom 24.05.2012					530.000	
Baubeschluss/genehmigte Beschlüsse		vom 07.03.2013					527.000	
Abrechnung (geschätzt)							●	527.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

€ brutto Budgetkontrolle

Erläuterungen

- zusätzlich kommen Kosten zur Sanierung der Aldinger Straße sowie umfangreiche Radwegsanierungsarbeiten
- Kreisverkehrsanlage Anfang Oktober fertiggestellt



TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2010	März 2011					●
Planung	April 2011	Feb. 2013					●
Ausführung	April 2013	Okt. 2013					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung	Jan. 2013	Feb. 2013					●
Bau- und Vergabebeschluss		März 2013					●
Baubeginn		April 2013					●
Fertigstellung		Okt. 2013					●

Hinweise	HH-Ansatz 2013 enthält 150.400 € HH-Reste aus 2012
-----------------	--

Projekt Eberhardstraße 1. BA + 2. BA	Stand: 31.05.2014	Investitionsauftrag 754106701087	FinHH	7
--	-------------------	--	--------------	----------

Projektleiter Fachber. 67: **Martin Renz** Telefon: **2694**

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
HH-Einstellung				68.777	667.555	800.000	1.536.332	
Zahlungsstand: 31.05.2014				68.777	667.555	148.938	885.270	
Kostenschätzung							1.240.000	
Kostenberechnung	390.000 1. BA + 850.000 2. BA						1.240.000	
Baubeschluß	430.000 1. BA + 1.100.000 2. BA						1.530.000	
Abrechnung (geschätzt)					98%	-30.000	1.500.000	

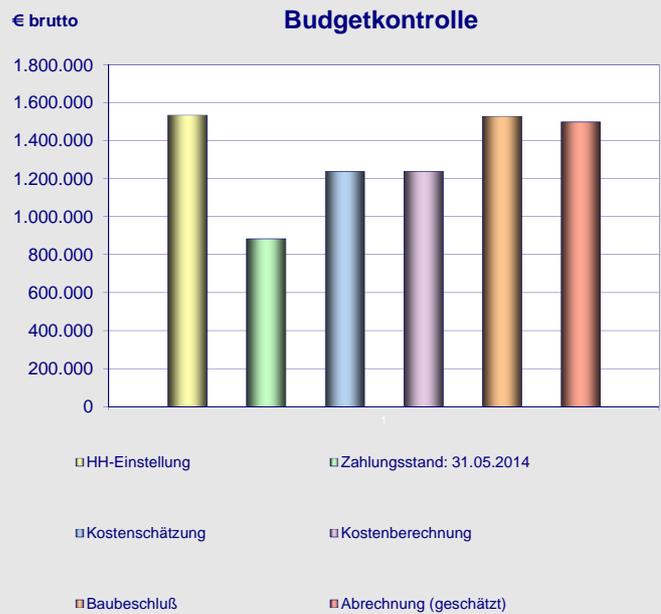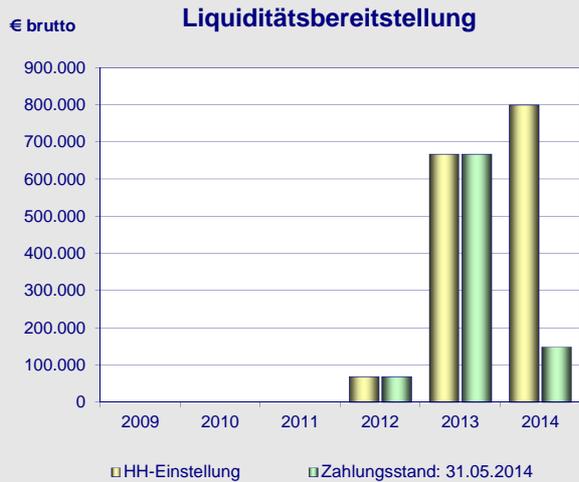



Erläuterungen

- Kanalkosten sind nicht in Projektkosten enthalten, Kostentragung durch SEL
- Beginn 2. Bauabschnitt September 2013 / Bauende Ende Mai 2014

Phase	SOLL		2. Bauabschnitt		STATUS
	von	bis	von	bis	
Grundlagenermittlung		Feb. 2012			●
Planung	März 2012	Sept. 2012			●
Ausführung	Okt. 2012	Mai 2013	Sept. 2013	Juni 2014	●
Meilenstein	bis				
Ausschreibung		Aug. 2012			●
Vergabebeschuß		Sept. 2012			●
Baubeginn		Okt. 2012			●
Fertigstellung		Jun 14			●
Hinweise:					

Projekt Synagogenplatz	Stand: 31.05.2014	Investitionsauftrag 754106701017	FinHH	8			
Projektleiter Fachber. 67: Bernd Wenger		Telefon: 2759					
KOSTEN	bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung		1.942	120.000	120.000			241.942
Zahlungsstand: 31.05.2014		1.942	21.606				23.548
Kostenschätzung vom Okt. 2013							360.000
Kostenberechnung vom							
Entwurfs- und Baubeschluß vom 06.11.2013							360.000
Abrechnung (geschätzt)						●	360.000
€ brutto Liquiditätsbereitstellung 				€ brutto Budgetkontrolle 			
Erläuterungen <ul style="list-style-type: none"> - Der Baubeginn ist abhängig von der Einwerbung von Sponsorengeldern. - Entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses müssen vor Baubeginn 50% bzw. 60.000 € an Sponsorengelder gesichert sein. - 120.000 € sollen über Sponsorengelder finanziert werden. 							
TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2013	Juli 2013					●
Planung	Aug. 2013	Juni 2014					●
Ausführung							
Meilenstein							
Ausschreibung							●
Vergabebeschluß							●
Baubeginn							●
Fertigstellung							●
Hinweise:							

KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
HH-Einstellung				9.192	694.103	200.000	903.295	
Zahlungsstand: 31.05.2014				9.192	694.103	5.304	708.599	
Kostenschätzung	vom							
Kostenberechnung	vom Juni 2012						1.050.000	
Baubeschluß	vom 25.07.12 Vorl.Nr. 227/12						1.050.000	
Abrechnung (geschätzt)	●						1.050.000	

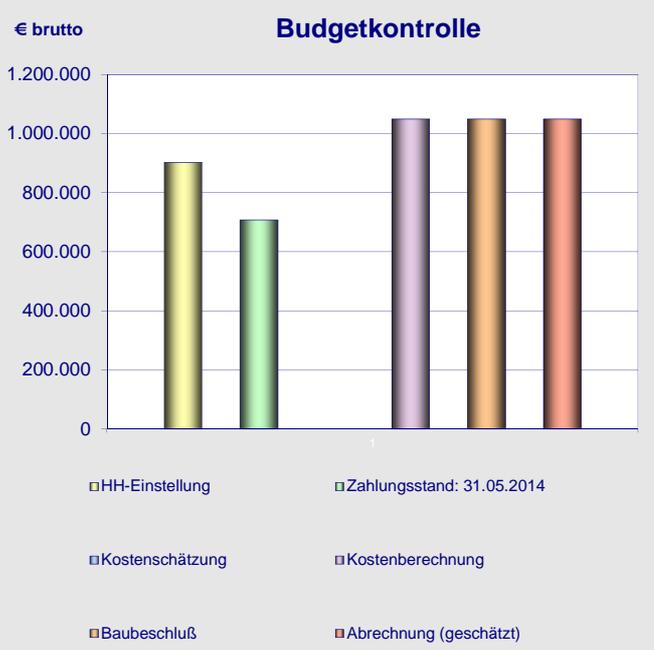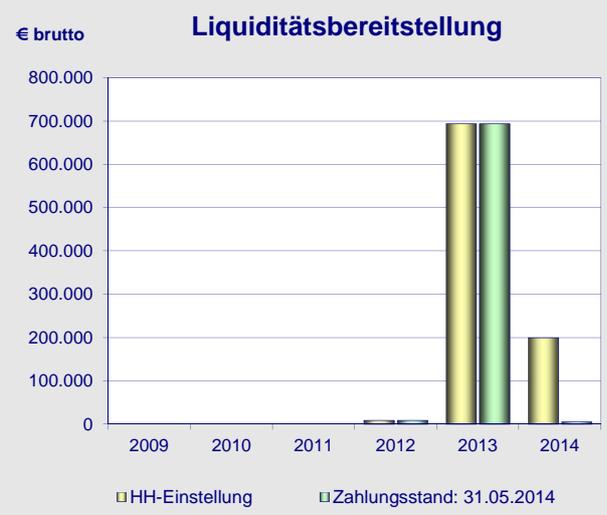

Erläuterungen

- Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen in der Hindenburgstraße wird 2014 umgesetzt.



TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2007	2012					●
Planung	2010	Jan. 2013					●
Ausführung	Feb. 2013	Juni 2013					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Feb. 2013					●
Vergabebeschuß		März 2013					●
Baubeginn		März 2013					●
Fertigstellung		Juni 2013					●

Hinweise:

Projekt	Stand: 31.05.2014	Investitionsauftrag	10
Brücke Radweg Neckarterrasse		754106711017	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Martin Mundt** Telefon: **2592**

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
HH-Einstellung	12.944	45.591	180.000	250.000	500.000	0	930.000	
Zahlungsstand: 31.05.2014	12.944	45.591	2.400				60.935	
Kostenschätzung vom 15.10.2012							1.000.000	
Kostenberechnung vom								
Baubeschluß vom 21.03.2013							1.000.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	1.000.000	

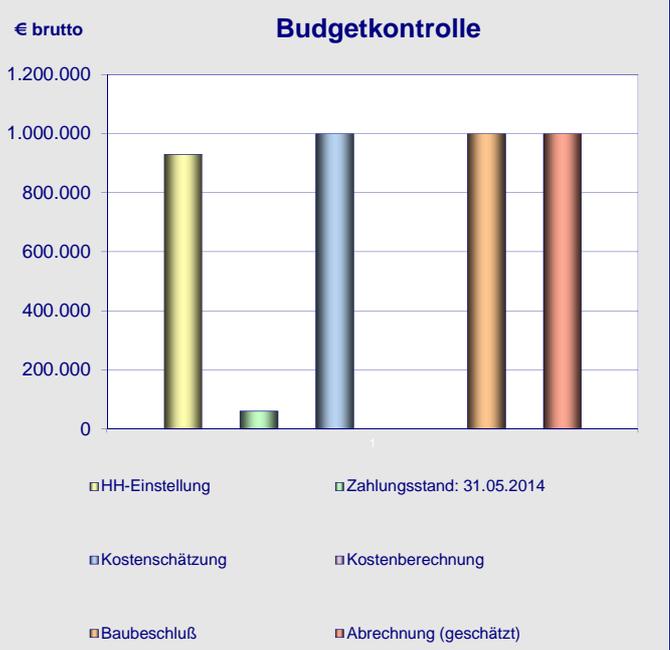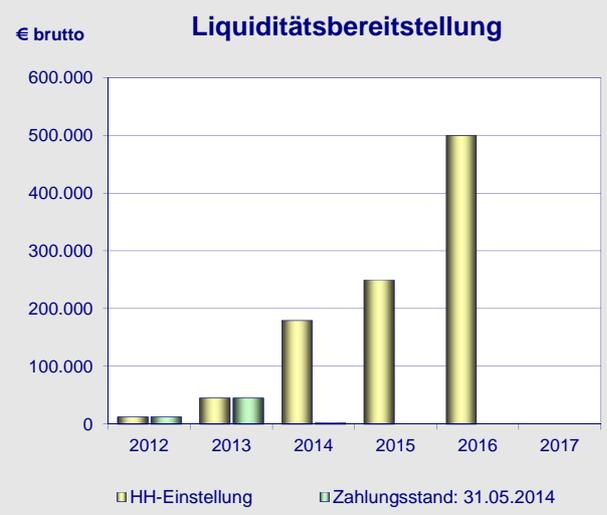

Erläuterungen


- Kostenverteilung:**
- Brücke Radweg Neckarterrasse 930.000,- €
 - Sonderkonto Neckarterrasse 80.000,- €
 - Förderzusage wurde mündlich erteilt

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2011	Juli 2012					●
Planung	Juli 2012	Aug. 2013					●
Ausführung							
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Aug. 2014					
Vergabebeschuß		Okt. 2014					
Baubeginn		Nov. 2014					
Fertigstellung		Dez. 2015					

Hinweise: HH-Ansatz 2013 enthält 47.000€ HH-Reste aus 2012

Projektleiter Fachber. 67: **Heike Reyser** Telefon: **2748**

KOSTEN	bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung		43.827	335.000	40.000			418.827
Zahlungsstand: 31.05.2014		43.827	293.814				337.641
Kostenschätzung	vom 08.08.2012						367.000
Kostenberechnung	vom 25.06.2013						480.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 25.07.2013, Vorl.Nr. 249/10, 07.11.2013, Vorl.Nr. 361/13						419.000
Abrechnung (geschätzt)						●	419.000

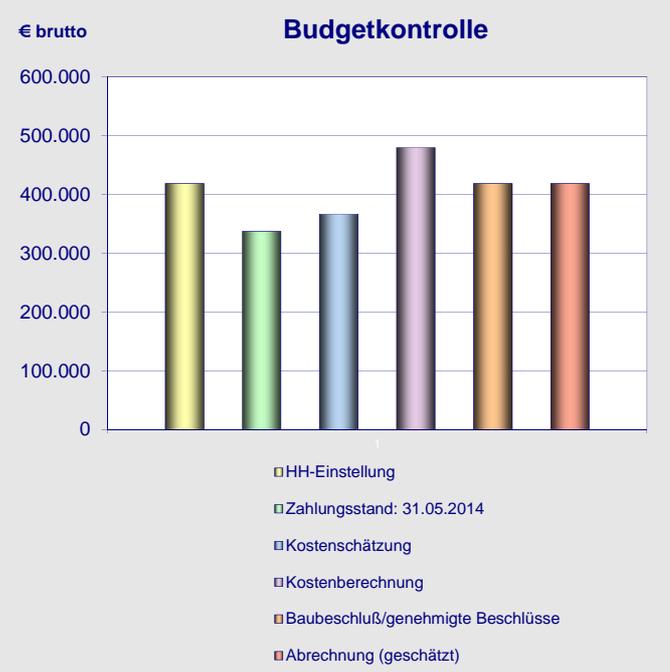

Erläuterungen

Entwurfs- und Baubeschluss, Vorlage 249/13: Beschlusssumme 480.000,- € (davon Planungshonorar 65.000,- €)
 Vergabeabschluss, Vorlage 361/13: Beschlusssumme 350.000,- € (zuzüglich Planungshonorar 65.000,- €)

Baubeginn Außenanlagen aufgrund Verzögerungen beim Hochbau im Februar 2014



TERMINE	SOLL				STATUS
Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung	April 2012	Juli 2012			●
Planung	Aug. 2012	Okt. 2013			●
Ausführung	Feb. 2014	Aug. 2014			●
Meilenstein					
Ausschreibung		Sept. 2013			●
Vergabebeschluß		Nov. 2013			●
Baubeginn		Feb. 2013			●
Fertigstellung		Juli 2014			●
Hinweise:					

Projekt		Stand: 31.05.2014		Investitionsauftrag			12	
Straßenbau Comburgstraße (Nordteil)				754106709017			FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck			Telefon: 2632			
KOSTEN		bis einsch.						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
		Gesamt						
HH-Einstellung				150.000	500.000	500.000	350.000	
Zahlungsstand: 31.05.2014		24.926		0			24.926	
Kostenschätzung		vom siehe HH-Einstellung					1.500.000	
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								
€ brutto		Liquiditätsbereitstellung			€ brutto			Budgetkontrolle
					<ul style="list-style-type: none"> HH-Einstellung Zahlungsstand: 31.05.2014 Kostenschätzung Kostenberechnung Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse Abrechnung (geschätzt) 			
Erläuterungen								
- Es handelt sich um den Nordteil der Comburgstraße zwischen Max-Reger-Str. und Walter-Flex-Str.								
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.								
- Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.								
- Der Kreisverkehr Comburger-/Friesenstr. ist kostenmäßig noch nicht berücksichtigt.								
TERMINE		SOLL		STATUS				
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung		2013				●		
Planung	2014	2014				●		
Ausführung	Mai 2015	2016				●		
Meilenstein		bis						
Ausschreibung								
Vergabebeschuß								
Baubeginn								
Fertigstellung								
Hinweise:								

Straßenbau Walter-Flex-Straße	Sonderkonto	FinHH
--------------------------------------	--------------------	--------------

Projektleiter Fachber. 67:	Martin Renz	Telefon: 2694
----------------------------	--------------------	----------------------

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt	
	2009	2010	2011	2012	2013	2014		
HH-Einstellung						150.000	1.405.000	
Zahlungsstand: 31.05.2014			12.600	71.938	1.429.878	252.526	1.766.942	
Kostenschätzung	vom 08.10.2009						1.230.000	
Kostenberechnung	vom 02.05.2012						1.370.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 20.09.2012						1.405.000	
Abrechnung (geschätzt)					118%	250.000	●	1.655.000

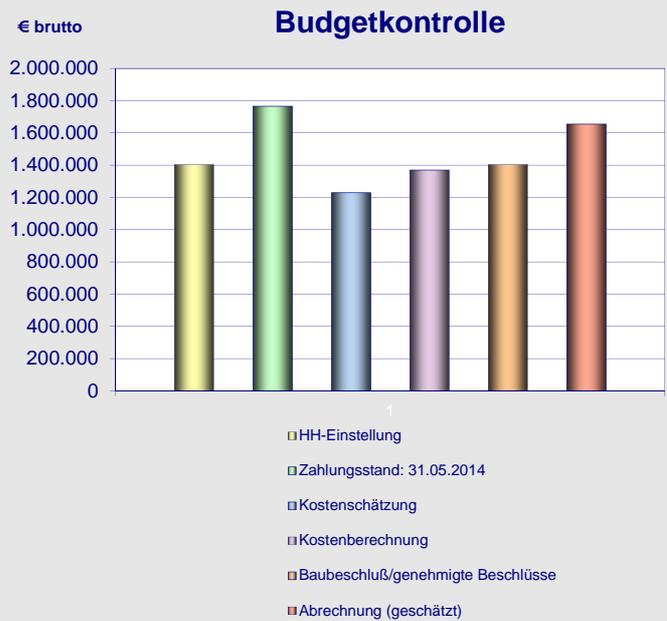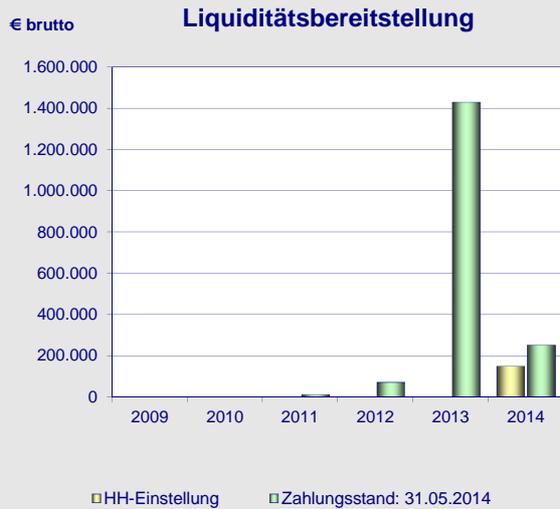

Erläuterungen

Es sind deutliche Mehrkosten wegen umfangreicher Untergrundverbesserungen und Mehrmengen an belastetem Aushubmaterial zu erwarten.
 Beschlussfassung Mehrkosten BTU 5.6. und GR 2.7. 2014

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		Feb. 2011					●
Planung	März 2011	Mai 2012					●
Ausführung	Okt. 2012	Okt. 2013					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschuß		Sept. 2012					●
Baubeginn		Okt. 2012					●
Fertigstellung		Sept. 2013					●
Hinweise:							

Projekt	Stand: 31.05.2014	Investitionsauftrag						14
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA		754106709037						FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Gabriele Heusel-Voraus					Telefon:	2073
KOSTEN		bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung							1.330.000	
Zahlungsstand: 31.05.2014		28.745	43.118	708.466	513.656	0	1.293.985	
Kostenschätzung vom 09.06.2010 (Planstatt Senner)							1.300.789	
Kostenberechnung vom 03.03.2011 (Planstatt Senner)							1.363.817	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 26.10.11 V.Nr. 395/11, Vergabeb. 26.04.12, V.Nr. 120/12							1.330.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	1.330.000	
€ brutto Liquiditätsbereitstellung 				€ brutto Budgetkontrolle 				
<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.05.2014		<input type="checkbox"/> HH-Einstellung <input type="checkbox"/> Zahlungsstand: 31.05.2014 <input type="checkbox"/> Kostenschätzung <input type="checkbox"/> Kostenberechnung <input type="checkbox"/> Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse <input type="checkbox"/> Abrechnung (geschätzt)						
Erläuterungen								
<p>Die privaten Bauarbeiten an den beiden Gebäuden (Torhäusern) der Fa. Pflugfelder haben sich verzögert. Aus diesem Grund erfolgte die Aufbringung des Possehl-Belags in Randbereichen der Torhäuser im März 2014.</p>								
TERMINE		SOLL					STATUS	
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	Jan. 10	Dez. 10					●	
Planung	Jan. 11	Apr. 12					●	
Ausführung	Mai. 12	Okt. 12					●	
Meilenstein		bis						
Ausschreibung		Febr. 12						
Vergabebeschuß		April 12					●	
Baubeginn		Mai 12					●	
Fertigstellung		Okt. 13					●	
Hinweise:								

Projekt	Stand: 31.05.2014	Investitionsauftrag						15
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA		754106709037						FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Gabriele Heusel-Voraus					Telefon:	2073
KOSTEN		bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung			1.200.000				1.200.000	
Zahlungsstand: 31.05.2014			30.266				30.266	
Kostenschätzung		vom Jan. 2014 (Planstatt Senner)						1.000.000
Kostenberechnung		vom Feb. 2014 (Planstatt Senner)						837.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 26.10.2011 V.Nr. 395/11, 03.04.2014, V.Nr. 095/14						840.000
Abrechnung (geschätzt)						●		
<p>€ brutto</p> <p>Liquiditätsbereitstellung</p>				<p>€ brutto</p> <p>Budgetkontrolle</p>				
<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.05.2014</p>		<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.05.2014</p> <p>■ Kostenschätzung</p> <p>■ Kostenberechnung</p> <p>■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse</p> <p>■ Abrechnung (geschätzt)</p>						
Erläuterungen								
<p>Die Haushaltseinstellungen 2014 für das gesamte Wohngebiet Hartenecker Höhe betragen 1.700.000 €. Die Haushaltseinstellungen für den Bauabschnitt II der Cäsar-von-Hofacker-Anlage, in Höhe von 1.200.000 €, beinhalten u.a. noch Restzahlungen des BA I, Restarbeiten KiFaz und Spielplatz und Fußwege im Wohngebiet Hartenecker Höhe.</p>								
TERMINE		SOLL			STATUS			
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	Jan. 10	Dez. 10					●	
Planung	Jul. 13	Jan. 14					●	
Ausführung	Mai. 14	Dez. 14					●	
Meilenstein		bis						
Ausschreibung		Febr. 14						
Vergabebeschuß		Apr. 14					●	
Baubeginn		Mai 14					●	
Fertigstellung		Dez. 14					●	
Hinweise:								

Projekt		Stand: 31.05.2014		Investitionsauftrag			16
Gemeinschaftsschule Innenstadt - Außenanlagen				721100201017		FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:			Michael Habermann			Telefon: 2162	
KOSTEN		bis einsch.					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			50.000	320.000			370.000
Zahlungsstand: 31.05.2014			267				267
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 12.09.2013							370.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 20.03.2014, Vorl. Nr. 029/14							370.000
Abrechnung (geschätzt)						●	370.000
<p>€ brutto</p> <p>Liquiditätsbereitstellung</p>				<p>€ brutto</p> <p>Budgetkontrolle</p>			
<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.05.2014</p>				<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.05.2014</p> <p>■ Kostenschätzung</p> <p>■ Kostenberechnung</p> <p>■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse</p> <p>■ Abrechnung (geschätzt)</p>			
Erläuterungen							
TERMINE							
		SOLL					
Phase	von	bis					STATUS
Grundlagenermittlung							●
Planung	Juni 2013	Feb. 2015					●
Ausführung	März 2015	Aug. 2015					●
Meilenstein							
		bis					
Ausschreibung		Dez. 2014					
Vergabebeschluß		Jan. 2015					●
Baubeginn		März 2015					●
Fertigstellung		Aug. 2015					●
Hinweise:	Ausführung in Abhängigkeit von Hochbau						

Projekt		Stand: 31.05.2014		Investitionsauftrag			17
Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen				755100001027			FinHH
Projektleiter Fachber. 67: Michael Habermann				Telefon: 2162			
KOSTEN		bis einschl.					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Gesamt					
HH-Einstellung				40.000	300.000		340.000
Zahlungsstand: 31.05.2014				10.307			10.307
Kostenschätzung				vom 14.03.2014			340.000
Kostenberechnung				vom 12.05.2014 (Klärung mit Hr. Kohler)			312.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse				vom			
Abrechnung (geschätzt)						●	
<p>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</p>				<p>€ brutto Budgetkontrolle</p>			
■ HH-Einstellung		■ Zahlungsstand: 31.05.2014		□ HH-Einstellung		□ Zahlungsstand: 31.05.2014	
				□ Kostenschätzung		□ Kostenberechnung	
				□ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		□ Abrechnung (geschätzt)	
Erläuterungen							
TERMINE		SOLL				STATUS	
Phase		von		bis			
Grundlagenermittlung		Juli 2013	Okt. 2013				●
Planung		Nov. 2013	Frühjahr 2015				●
Ausführung		Sommer/Herbst 2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Frühjahr 2015					●
Vergabebeschuß		Frühjahr 2015					●
Baubeginn		Sommer 2015					●
Fertigstellung		Ende 2015					●
Hinweise:		Ausführung in Abhängigkeit von Hochbau					

Projekt	Stand: 31.05.2014	Investitionsauftrag	18
Erweiterung Kita Reichertshalde - Außenanlagen		736501108017	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Michael Habermann** Telefon: **2162**

KOSTEN	bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung		10.000	50.000	290.000			350.000
Zahlungsstand: 31.05.2014		5.700	8.600				14.300
Kostenschätzung vom 28.02.2014							350.000
Kostenberechnung vom 14.03.2014							335.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 03.04.2014, Vorl. Nr.091/14							335.000
Abrechnung (geschätzt)						●	335.000



Erläuterungen

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Sept. 2013					●
Planung	Okt. 2013	Feb. 2015					●
Ausführung	April 2015	Okt. 2015					●
Meilenstein			bis				
Ausschreibung		Dez. 2014					●
Vergabebeschluß		Jan 2015					●
Baubeginn		April 2015					●
Fertigstellung		Okt. 2015					●

Hinweise: Ausführung in Abhängigkeit von Hochbau (Verschiebung bei Hochbau mit Baubeginn u. Fertigstellung)

Projekt		Stand: 31.05.2014		Investitionsauftrag			19
KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen				736501112017		FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:				Horst Grieshaber			Telefon: 2747
KOSTEN		bis einsch.					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			340.000	250.000	50.000		640.000
Zahlungsstand: 31.05.2014			15.391				15.391
Kostenschätzung		vom siehe HH-Einstellung					640.000
Kostenberechnung		vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom					
Abrechnung (geschätzt)						●	
<p>€ brutto Liquiditätsbereitstellung</p>				<p>€ brutto Budgetkontrolle</p>			
<p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2014</p>				<p>■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.05.2014 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)</p>			
Erläuterungen							
<p>Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt. Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.</p>							
TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Aug. 2013	Okt. 2013					●
Planung	Nov. 2013	Sept. 2014					●
Ausführung	Okt. 2014	Mrz. 2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Aug. 2014					●
Vergabebeschluß		Sept. 2014					●
Baubeginn		Okt. 2014					●
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme		Jan. 2015					●
Fertigstellung		Mrz 2015					●
Hinweise:							
