
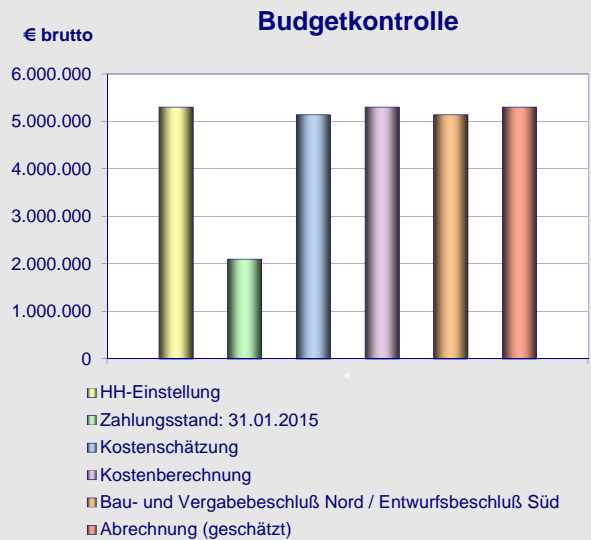


KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
HH-Einstellung			2.000.000	2.310.000	1.000.000		5.310.000	
Zahlungsstand: 31.01.2015			2.105.256	0			2.105.256	
Kostenschätzung	vom						5.150.000	
Kostenberechnung	vom						5.310.000	
Bau- und Vergabebeschluß Nord / Entwurfsbeschluß Süd	vom 09.12.2013 / GR 26.02.2014						5.150.000	
Abrechnung (geschätzt)				103%	160.000	●	5.310.000	


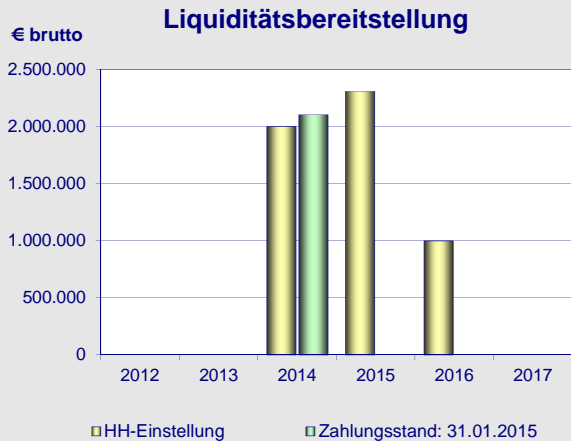


Erläuterungen

BA Nord: 2.820.000 €
BA Süd: 2.490.000 €
gesamt: 5.310.000 €
Überplanmäßige VE wird mit Baubeschluss Süd beantragt

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung Nord		März 2013					●
Planung Nord	März 2013	Dez. 2013					●
Ausführung Nord	Jan. 2014	Dez. 2014					●
Grundlagenermittlung Süd							●
Planung Süd	Aug. 2013	Aug. 2014					●
Ausführung Süd	Sept. 2014	Okt. 2015					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung		Okt. 2013					●
Vergabebeschluß Nord		09.12.2013					●
Ausbau Nord	Jan. 2014	Nov. 2014					●
Fertigstellung Nord		Dez. 2014					●
Ausschreibung							●
Vergabebeschluß Süd		Juli 2014					●
Ausbau Süd	Sept. 2014						●
Fertigstellung Süd		Okt. 2015					●

Hinweise:

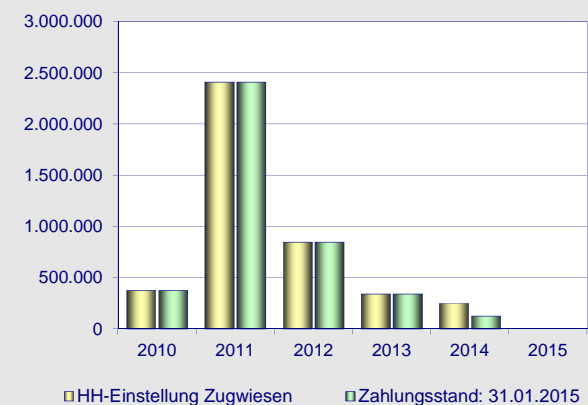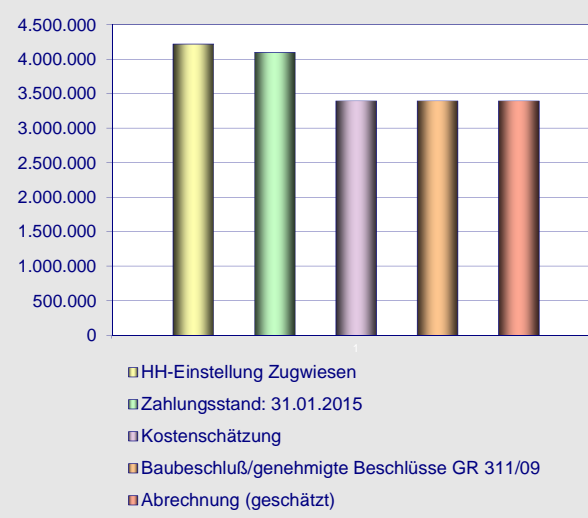Projekt Zugwiesen	Stand: 31.01.2015	Investitionsauftrag 755400009017	FinHH	2				
Projektleiter Fachber. 67:		Bernd Wenger, Günter Schlecht		Telefon: 2759				
KOSTEN	bis einschl.							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung Zugwiesen	376.336	2.409.801	847.630	340.996	250.000	0	4.224.763	
Zahlungsstand: 31.01.2015	376.336	2.409.801	847.630	340.996	127.177	0	4.101.940	
Kostenschätzung		vom Juni 2009						3.400.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09		vom 22.07.2009						3.400.000
Abrechnung (geschätzt)						●	3.400.000	
<h3>Liquiditätsbereitstellung</h3> <p>€ brutto</p>  <p>■ HH-Einstellung Zugwiesen ■ Zahlungsstand: 31.01.2015</p>				<h3>Budgetkontrolle</h3> <p>€ brutto</p>  <p>■ HH-Einstellung Zugwiesen ■ Zahlungsstand: 31.01.2015 ■ Kostenschätzung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09 ■ Abrechnung (geschätzt)</p>				
Erläuterungen								
<ul style="list-style-type: none"> - Im Zahlungstand sind Ausgaben für die Aussichtsplattform enthalten, die von Euronatur erstattet werden. - Im Zahlungstand sind ferner Ausgaben für Kostenteile des WSA enthalten, die mit dem WSA verrechnet werden. 								
TERMINE		SOLL		2. Bauabschnitt		STATUS		
Phase	von	bis		von	bis			
Grundlagenermittlung	1998	1999					●	
Planung	2000	Juni 2010					●	
Ausführung	2011	2012		April 2013	April 2014		●	
Meilenstein bis								
Ausschreibung	Dez. 2010	März 2011					●	
Vergabebeschuß		Mai 2011					●	
Baubeginn		Juli 2011		April 2013			●	
Fertigstellung 1. BA		Mai 2012		April 2014			●	
Hinweise:								


Projekt		Stand: 31.01.2015		Investitionsauftrag			3	
Alt-Württemberg-Allee				754106704017			FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:		Oskar Frühwirth			Telefon: 2495			
KOSTEN		bis einschl.						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
HH-Einstellung			10.807	50.000	600.000	500.000		
Zahlungsstand: 31.01.2015			10.807	20.749	0			
Kostenschätzung		vom						1.200.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 22.01.2015		und 28.01.2015			1.200.000	
Abrechnung (geschätzt)								1.200.000
Liquiditätsbereitstellung				Budgetkontrolle				
€ brutto				€ brutto				
<ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2015 				<ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2015 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse 				
Erläuterungen								
75.000, -- € Finanzierung über Historische Alleen								
TERMINE		SOLL		STATUS				
Phase		von	bis					
Grundlagenermittlung		Feb. 2014	Mai 2014				●	
Planung		Juni 2014	April 2015				●	
Ausführung		Mai 2015	März 2016				●	
Meilenstein		bis						
Ausschreibung		März 2015					●	
Vergabebeschuß		April 2015					●	
Baubeginn		Mai 2015					●	
Fertigstellung		März 2016					●	
Hinweise:								

Projekt	Stand: 31.01.2015	Investitionsauftrag	4
Planung + Bau Verkehrsentwicklung Neckarweihingen Haupt-/Lechtstr. und Rathausplatz		754106711037 754106711047	FinHH


Projektleiter Fachber. 67: **Hansjoachim Heck** Telefon: **2632**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2011	2012	2013	2014	2015		
HH-Einstellung	10.079	37.917	1.718.269	350.000	0	2.116.265	
Zahlungsstand: 31.01.2015	10.079	37.917	1.718.269	63.598	0	1.829.863	
Kostenschätzung	vom						
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 10. Okt. 2012					1.885.000	
Abrechnung (geschätzt)						1.885.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**

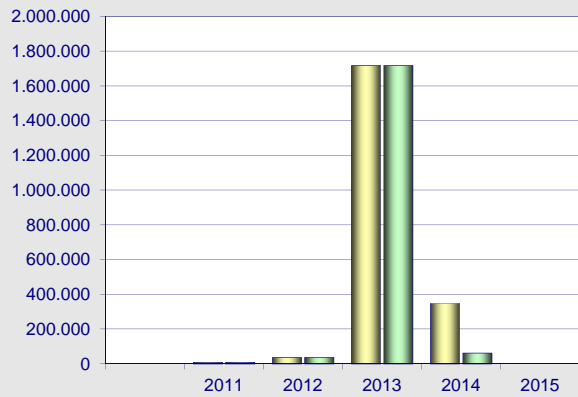

€ brutto **Budgetkontrolle**

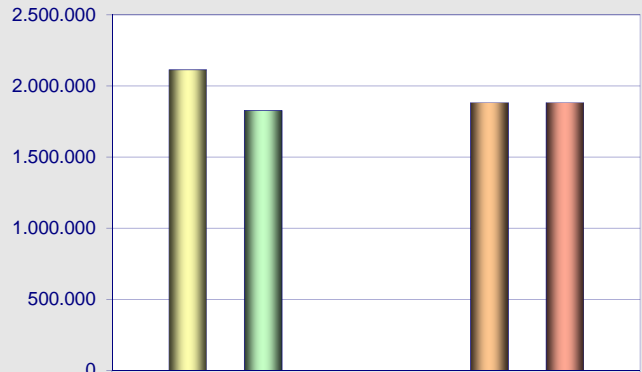

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2015

■ HH-Einstellung
 ■ Zahlungsstand: 31.01.2015
 ■ Kostenschätzung
 ■ Kostenberechnung
 ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
 ■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen



Phase	SOLL		STATUS
	von	bis	
Grundlagenermittlung	2008	2009	●
Planung	Aug. 2010	Dez. 2012	●
Ausführung	Jan. 2013	Okt. 2013	●
Meilenstein	bis		
Ausschreibung	Okt. 2012	Nov. 2012	●
Vergabebeschuß		12.12.2012	●
Baubeginn		04.03.2013	●
Fertigstellung		Okt. 2013	

Hinweise: HH-Ansatz 2013 enthält 199.400 € HH-Reste aus 2012
 Freigabe für den Verkehr in der KW 43. Offizielle Einweihung in Verbindung mit dem Kiesranzenfest im Mai 2014
 Schlussrechnung liegt seit 30.7.2014 bei FB Revision

Projekt	Stand: 31.01.2015	Investitionsauftrag	5
Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße		754106704047	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Jürgen Müller** Telefon: **2435**

KOSTEN	bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			50.000	50.000	150.000	580.000	830.000
Zahlungsstand: 31.01.2015			0	0			0
Kostenschätzung	vom siehe HH-Einstellung						830.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

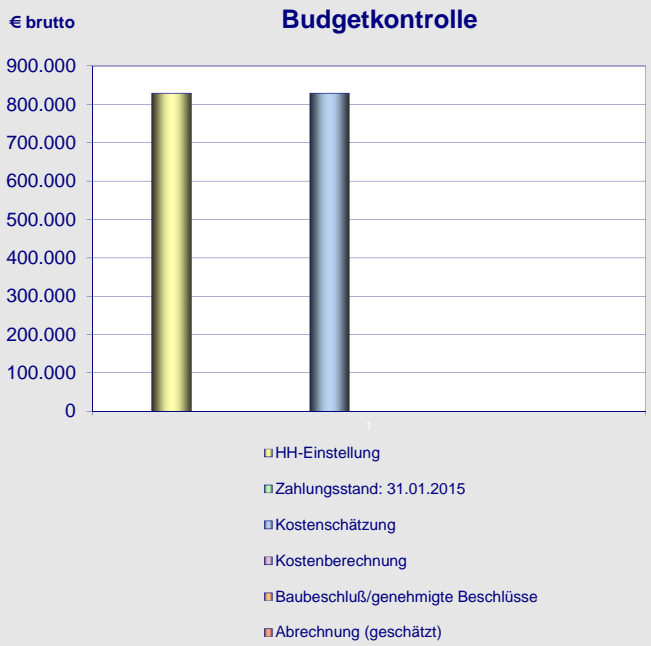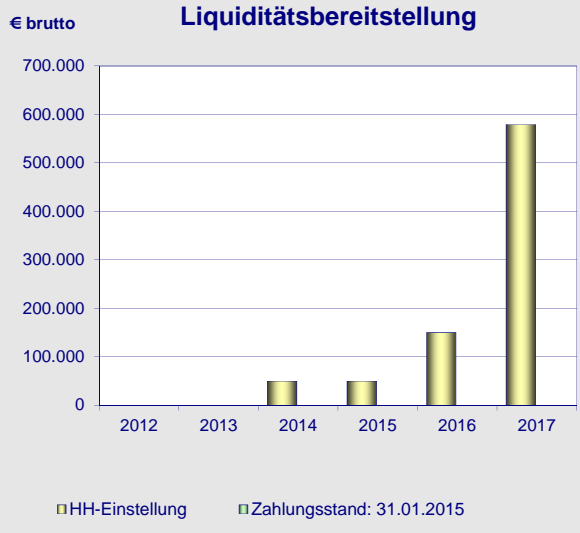

Erläuterungen

Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.



Phase	TERMINE		SOLL				STATUS
	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2014	Juli 2014					●
Planung	Aug. 2014	April 2016					●
Ausführung	Okt. 2016	Aug. 2017					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							●
Vergabebeschluß							●
Baubeginn							●
Fertigstellung							●
Hinweise:							

Projekt	Stand: 31.01.2015	Investitionsauftrag						6
Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße		754106710017	FinHH					
Projektleiter Fachber. 67:		Jürgen Müller					Telefon:	2435
KOSTEN		bis einschl.						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	Gesamt	
HH-Einstellung		10.700	18.811	517.818	150.000	0	697.329	
Zahlungsstand: 31.01.2015		10.700	18.811	517.818	5.815	0	553.144	
Kostenschätzung vom 28.07.2011							530.000	
Kostenberechnung vom 24.05.2012							530.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 07.03.2013							527.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	527.000	
€ brutto Liquiditätsbereitstellung 				€ brutto Budgetkontrolle 				
■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2015				■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2015 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)				
Erläuterungen								
<ul style="list-style-type: none"> - Kreisverkehrsanlage Anfang Oktober fertiggestellt - Schlußrechnung liegt vor und wird zur Zeit geprüft 								
TERMINE		SOLL					STATUS	
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	Jan. 2010	März 2011					●	
Planung	April 2011	März 2013					●	
Ausführung	April 2013	Okt. 2013					●	
Meilenstein	bis							
Ausschreibung	Jan. 2013	Feb. 2013					●	
Bau- und Vergabebeschluss		März 2013					●	
Baubeginn		April 2013					●	
Fertigstellung		Okt. 2013					●	
Hinweise	HH-Ansatz 2013 enthält 150.400 € HH-Reste aus 2012							

Projekt Eberhardstraße 1. BA + 2. BA	Stand: 31.01.2015	Investitionsauftrag 754106701087	FinHH	7
--	-------------------	--	--------------	----------

Projektleiter Fachber. 67: **Martin Renz** Telefon: **2694**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
HH-Einstellung			68.777	667.555	800.000	0	1.536.332
Zahlungsstand: 31.01.2015			68.777	667.555	630.080	0	1.366.412
Kostenschätzung							1.240.000
Kostenberechnung	390.000 1. BA + 850.000 2. BA						1.240.000
Baubeschluß	430.000 1. BA + 1.100.000 2. BA						1.530.000
Abrechnung (geschätzt)					98%	-30.000	1.500.000

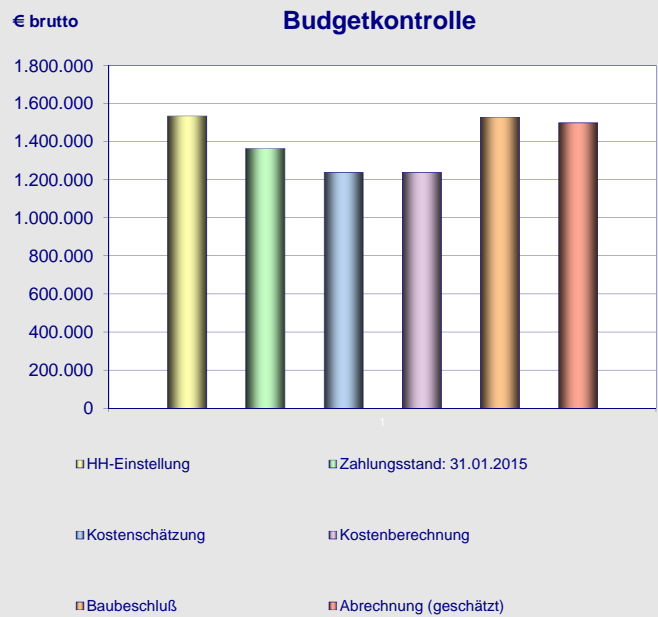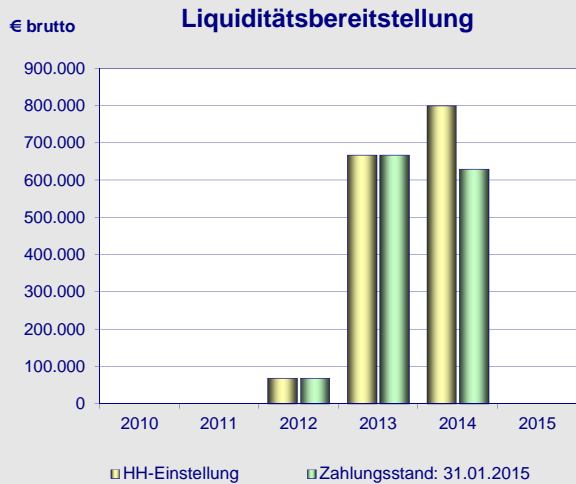

Erläuterungen

- Kanalkosten sind nicht in Projektkosten enthalten, Kostentragung durch SEL
- Beginn 2. Bauabschnitt September 2013 | / Bauende Ende Mai 2014

Phase	TERMINE		SOLL		2. Bauabschnitt		STATUS
	von	bis	von	bis	von	bis	
Grundlagenermittlung		Feb. 2012					●
Planung	März 2012	Sept. 2012					●
Ausführung	Okt. 2012	Mai 2013			Sept. 2013	Juni 2014	●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Aug. 2012					●
Vergabebeschluß		Sept. 2012					●
Baubeginn		Okt. 2012					●
Fertigstellung		Jun 14					●

Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2015	Investitionsauftrag						8
Synagogenplatz		754106701017						FinHH
Projektleiter Fachber. 67:	Bernd Wenger						Telefon: 2759	
KOSTEN	bis einsch.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			1.942	120.000	120.000	0	0	241.942
Zahlungsstand: 31.01.2015			1.942	290.060	0			292.002
Kostenschätzung	vom Okt. 2013							360.000
Kostenberechnung	vom							
Entwurfs- und Baubeschluß	vom 06.11.2013							360.000
Abrechnung (geschätzt)								360.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: □ HH-Einstellung □ Zahlungsstand: 31.01.2015

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: □ HH-Einstellung □ Zahlungsstand: 31.01.2015
□ Kostenschätzung □ Kostenberechnung
□ Entwurfs- und Baubeschluß □ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

- 120.000 € Baukosten sollen über Sponsorengelder finanziert werden.
- 100.000 € wurden als Zuwendung vom Förderverein Synagogenplatz e.V. im Jahr 2014 von der Stadt Ludwigsburg angenommen (Vorl.Nr. 016/15 Annahme von Spenden, Schenkungen u.ä. Zuwendungen)



Phase	SOLL					STATUS
	von	bis				
Grundlagenermittlung	Jan. 2013	Juli 2013				●
Planung	Aug. 2013	Juli 2014				●
Ausführung	Aug. 2014	Okt. 2014				●
Meilenstein						
Ausschreibung						●
Vergabebeschluß						●
Baubeginn		Aug. 2014				●
Fertigstellung		Okt. 2014				●

Hinweise:	Die Beschichtung der Asphaltdecke mit einem Possehlbelag erfolgt witterungsabhängig im Frühjahr 2015.
------------------	--

Parkraumkonzeption Oststadt incl. Parkplätze Hindenburgstraße	754600004007 754106704097	FinHH
--	------------------------------	--------------

Projektleiter Fachber. 67:	Thorsten Conte	Telefon: 2310
----------------------------	-----------------------	----------------------

KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2010	2011	2012	2013	2014	2015		
HH-Einstellung			9.192	694.103	200.000	0	903.295	
Zahlungsstand: 31.01.2015			9.192	694.103	128.218	0	831.513	
Kostenschätzung	vom							
Kostenberechnung	vom Juni 2012							1.050.000
Baubeschluß	vom 25.07.12 Vorl.Nr. 227/12							1.050.000
Abrechnung (geschätzt)	●						1.050.000	

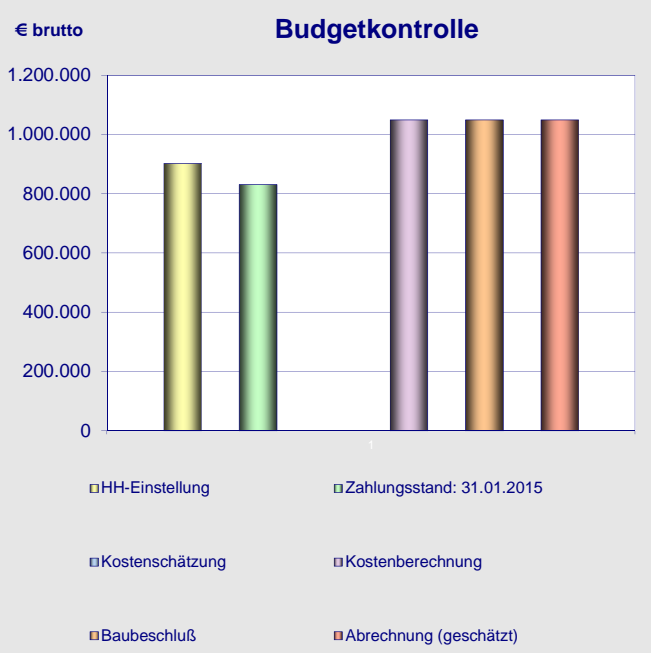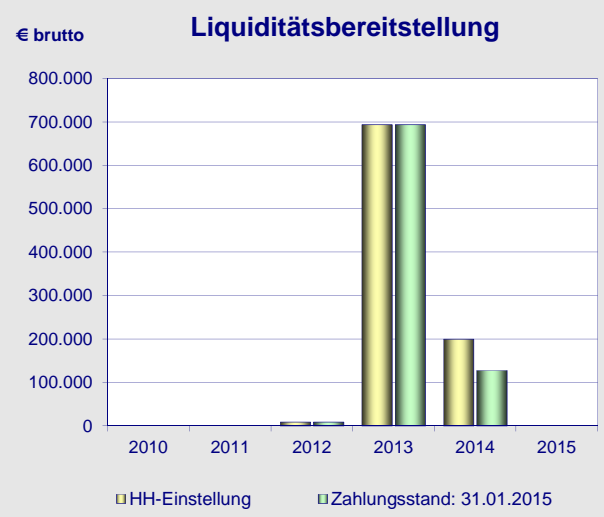

Erläuterungen

- Schlußrechnung für Parkplätze in der Hindenburgstraße wurde angefordert

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2007	2012					●
Planung	2010	Jan. 2013					●
Ausführung	März 2013	Juni 2013					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Feb. 2013					●
Vergabebeschuß		März 2013					●
Baubeginn		März 2013					●
Fertigstellung		Juni 2013					●

Hinweise:

Projekt	Stand: 31.01.2015	Investitionsauftrag						10
Brücke Radweg Neckarterrasse		754106711017						FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Mundt	Telefon: 2592					
KOSTEN		bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung	12.944	45.591	180.000	820.000	0	0	1.000.000	
Zahlungsstand: 31.01.2015	12.944	45.591	37.510	0			96.045	
Kostenschätzung vom 15.10.2012							1.000.000	
Kostenberechnung vom 19.11.2012							1.000.000	
Baubeschluß vom 21.03.2013							1.000.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	1.000.000	
€ brutto Liquiditätsbereitstellung 				€ brutto Budgetkontrolle 				
Erläuterungen								
*- Förderung über LGVFG/RL-Radinfrastruktur bewilligt								
TERMINE		SOLL			STATUS			
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	März 2011	Juli 2012					●	
Planung	Juli 2012	Okt. 2014					●	
Ausführung	Nov. 2014	Dez. 2015					●	
Meilenstein	bis							
Ausschreibung		Aug. 2014						
Vergabebeschuß		Okt. 2014						
Baubeginn		Nov. 2014						
Fertigstellung		Dez. 2015						
Hinweise:	HH-Mittelanmeldung für das Jahr 2015 mit Gesamtsumme von 1.000.000 €							

Projekt		Stand: 31.01.2015		Investitionsauftrag			11
Straßenbau Comburgstraße				754106709017			FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck			Telefon: 2632		
KOSTEN		bis einsch.					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			150.000	1.200.000	1.900.000	400.000	3.650.000
Zahlungsstand: 31.01.2015	24.926		44.030	0			68.956
Kostenschätzung		vom		01.08.2014			3.500.000
Kostenberechnung		vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom					
Abrechnung (geschätzt)							

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.01.2015 (green)

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.01.2015 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (purple), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (orange), Abrechnung (geschätzt) (red)

Erläuterungen

- Es handelt sich um die Comburgstraße zwischen DJK Vereinsheim und Schorndorferstr. sowie der Max-Reger-Str.(bis zur Schumannstr.)
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.
- Die Kostenschätzung wurde im Zuge der Haushaltseinstellung durchgeführt.
- Der Kreisverkehr Comburg-/Schorndorferstr. ist kostenmäßig enthalten.



TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		2013					●
Planung	2014	2015					●
Ausführung	Okt. 2015	2017					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:	
------------------	--

Resterschließung Hartenecker Höhe	FinHH
--	--------------

Projektleiter Fachber. 67:	Hansjoachim Heck	Telefon: 2632
----------------------------	-------------------------	----------------------

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
HH-Einstellung					800.000		800.000
Zahlungsstand: 31.01.2015				22.269	0		22.269
Kostenschätzung	vom 11. Aug. 14						800.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)	●						

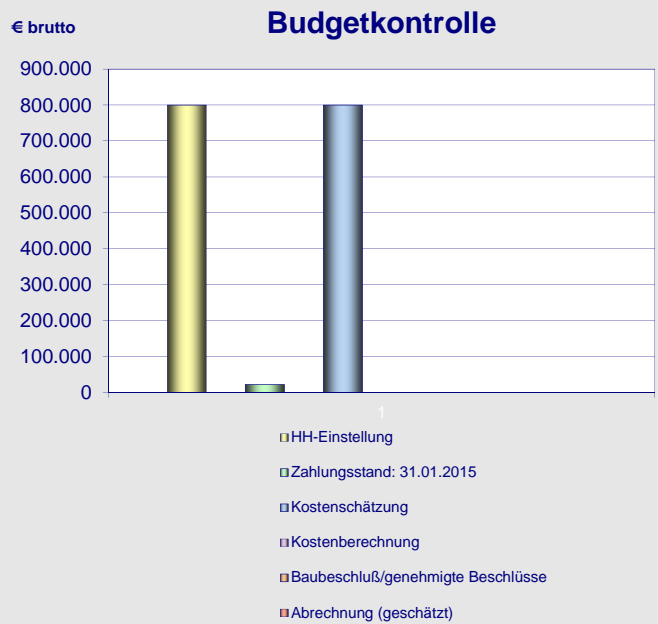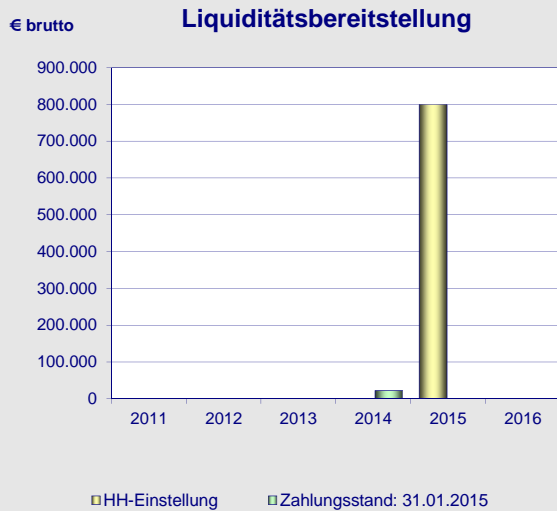

Erläuterungen



- Endausbau (Einbau der Deckschicht) Hartenecker Höhe**
- Elfriede-Breitenbach-Str.
 - Elisabeth-Kranz-Str.
 - Anna Neff Str.
 - sowie Wohnwege zur Cäsar von Hofacker Anlage

TERMINE	SOLL	STATUS
Phase	von	bis
Grundlagenermittlung		●
Planung		März 2015 ●
Ausführung		2015 ●
Meilenstein	bis	
Ausschreibung		März 2015 ●
Vergabebeschluss		April 2015 ●
Baubeginn		Mai 2015 ●
Fertigstellung		Aug. 2015 ●
Hinweise:		

Projekt	Stand: 31.01.2015	Investitionsauftrag	13
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA		754106709037	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Gabriele Heusel-Voraus** Telefon: **2073**

KOSTEN	bis einschl.						Gesamt
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
HH-Einstellung							1.330.000
Zahlungsstand: 31.01.2015	28.745	43.118	708.466	513.656	43.088	0	1.337.073
Kostenschätzung	vom 09.06.2010 (Planstatt Senner)						1.300.789
Kostenberechnung	vom 03.03.2011 (Planstatt Senner)						1.363.817
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 26.10.11 V.Nr. 395/11, Vergabeb. 26.04.12, V.Nr. 120/12						1.330.000
Abrechnung (geschätzt)							1.330.000

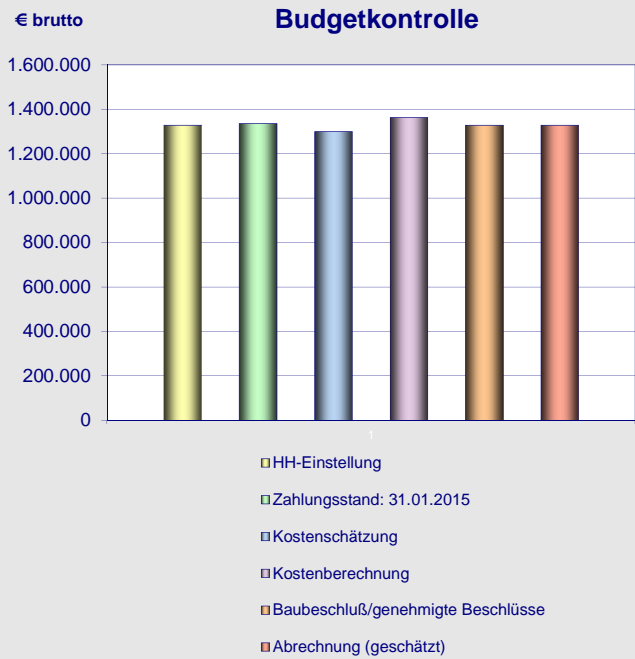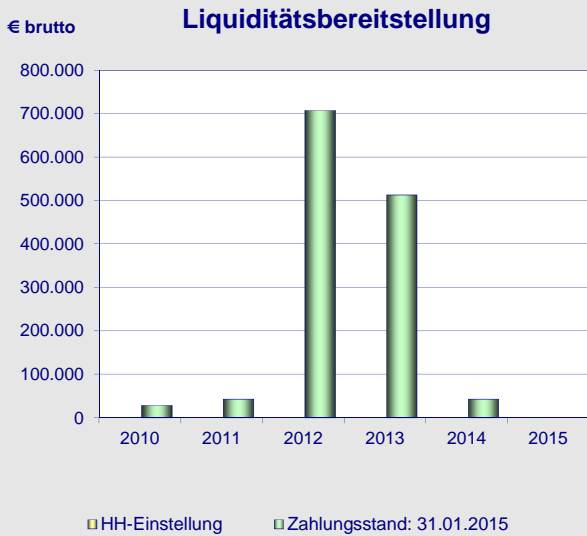

Erläuterungen



- Schlußrechnung liegt vor und wird zur Zeit geprüft

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 10	Dez. 10					●
Planung	Jan. 11	April 12					●
Ausführung	Mai 12	Okt. 13					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Feb. 12					●
Vergabebeschuß		April 12					●
Baubeginn		Mai 12					●
Fertigstellung		Okt. 13					●
Hinweise:							

Projekt	Stand: 31.01.2015	Investitionsauftrag	14
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA		754106709037	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Gabriele Heusel-Voraus/Hajo Her** Telefon: **2073/2632**

KOSTEN	bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			1.700.000	370.000			2.070.000
Zahlungsstand: 31.01.2015			734.022	0			734.022
Kostenschätzung	vom Jan. 2014 (Planstatt Senner)						1.000.000
Kostenberechnung	vom Feb. 2014 (Planstatt Senner)						837.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 26.10.2011 V.Nr. 395/11, 03.04.2014, V.Nr. 095/14						840.000
Abrechnung (geschätzt)							●

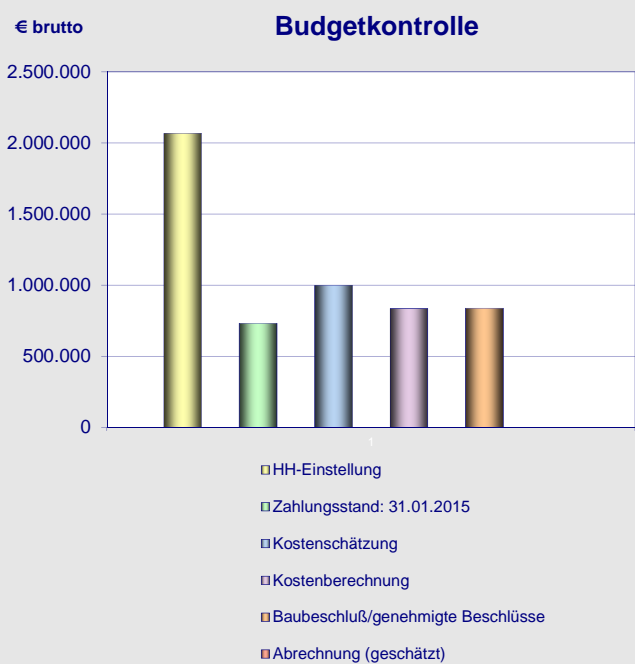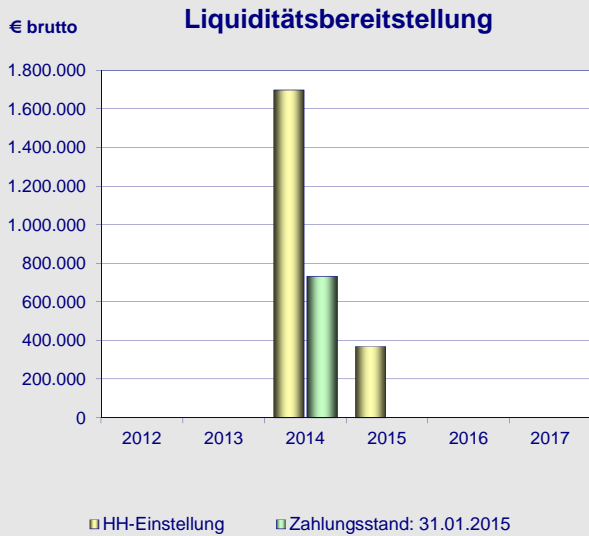

Erläuterungen

Die Haushaltseinstellungen 2014 für das gesamte Wohngebiet Hartenecker Höhe betragen 1.700.000 €. Die Haushaltseinstellungen für den Bauabschnitt II der Cäsar-von-Hofacker-Anlage, in Höhe von 1.200.000 €, beinhalten u.a. noch Restzahlungen des BA I, Restarbeiten KiFaz und Spielplatz und Fußwege im Wohngebiet Hartenecker Höhe.

Bauabschnitt II ist seit November fertiggestellt und freigegeben. Aufbringung des gelben Possehl-Belags erst im Frühjahr 2015 (witterungsbedingt)

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 10	Dez. 10					●
Planung	Juli 13	Apr. 14					●
Ausführung	Mai 14	Dez. 14					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Feb. 14					
Vergabebeschuß		April 14					●
Baubeginn		Mai 14					●
Fertigstellung		Dez. 14					●


Hinweise:	
-----------	--

Projekt	Stand: 31.01.2015	Investitionsauftrag						15
Gemeinschaftsschule Innenstadt - Außenanlagen		721100201017						FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Michael Habermann	Telefon: 2162					
KOSTEN		bis einsch.						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung				50.000	320.000			370.000
Zahlungsstand: 31.01.2015				11.196	0			11.196
Kostenschätzung		vom						
Kostenberechnung		vom 12.09.2013						370.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 20.03.2014, Vorl. Nr. 029/14; 06.11.2014, Vorl. Nr. 400/14						370.000
Abrechnung (geschätzt)								370.000
								●
<p>€ brutto</p> <p>Liquiditätsbereitstellung</p>				<p>€ brutto</p> <p>Budgetkontrolle</p>				
<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.01.2015</p>		<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.01.2015</p> <p>■ Kostenschätzung</p> <p>■ Kostenberechnung</p> <p>■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse</p> <p>■ Abrechnung (geschätzt)</p>						
Erläuterungen								
TERMINE		SOLL		STATUS				
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung							●	
Planung	Juni 2013	Feb. 2015					●	
Ausführung	März 2015	Aug. 2015					●	
Meilenstein	bis							
Ausschreibung		Dez. 2014					●	
Vergabebeschluß		Jan. 2015					●	
Baubeginn		März 2015					●	
Fertigstellung		Aug. 2015					●	
Hinweise:	Ausführung in Abhängigkeit von Hochbau							

Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen	755100001027	FinHH
---	---------------------	--------------

Projektleiter Fachber. 67: Michael Habermann	Telefon: 2162
---	----------------------

KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
HH-Einstellung			40.000	300.000			340.000	
Zahlungsstand: 31.01.2015			12.996	0			12.996	
Kostenschätzung	vom 14.03.2014						340.000	
Kostenberechnung	vom 12.05.2014						312.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 23.07.2014, Vorl. Nr. 164/14						312.000	
Abrechnung (geschätzt)	●						312.000	

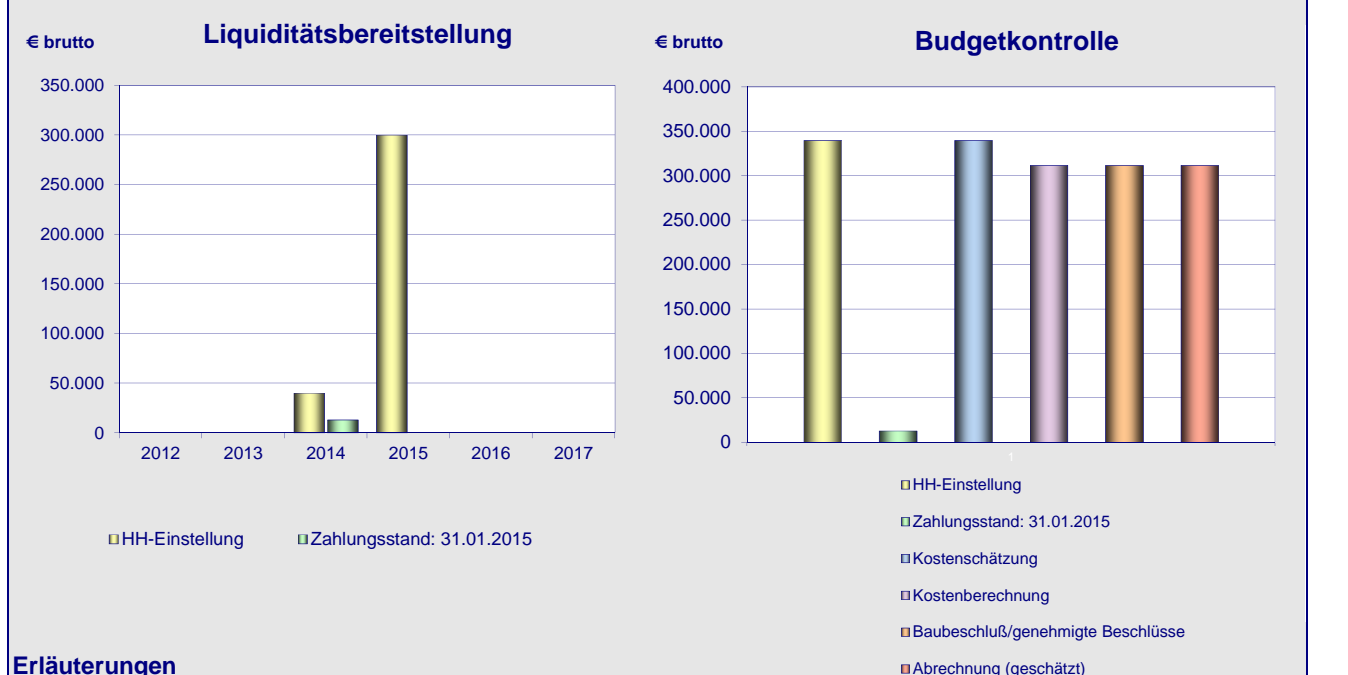

Erläuterungen



TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Okt. 2013					●
Planung	Nov. 2013	Juni 2015					●
Ausführung	Aug. 2015	Nov. 2015					●
Meilenstein			bis				
Ausschreibung				April 2015			●
Vergabebeschuß				Mai 2015			●
Baubeginn				Aug. 2015			●
Fertigstellung				Nov. 2015			●

Hinweise:	Ausführung in Abhängigkeit von Hochbau
------------------	---

Projekt	Stand: 31.01.2015	Investitionsauftrag	17
Erweiterung Kita Reichertshalde - Außenanlagen		736501108017	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Michael Habermann** Telefon: **2162**

KOSTEN	bis einsch.						Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
HH-Einstellung		10.000	50.000	240.000	50.000		350.000
Zahlungsstand: 31.01.2015		5.700	9.983	2.269			17.952
Kostenschätzung vom 28.02.2014							350.000
Kostenberechnung vom 14.03.2014							335.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 03.04.2014, Vorl. Nr.091/14							335.000
Abrechnung (geschätzt)						●	335.000

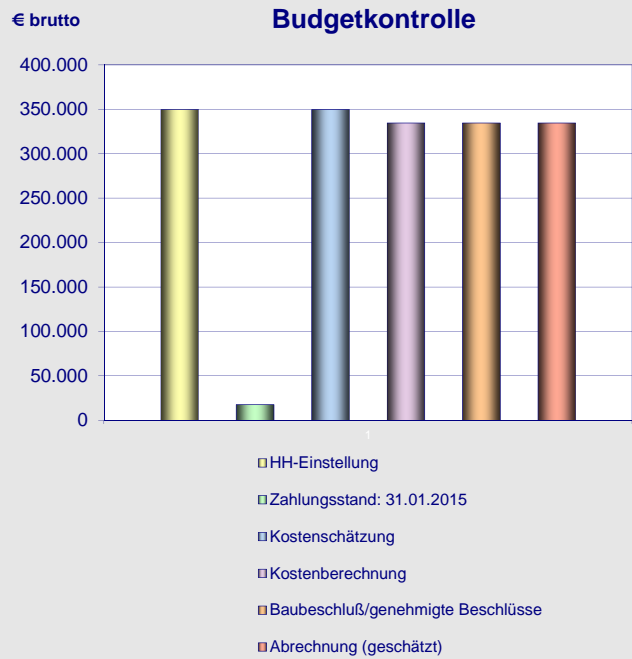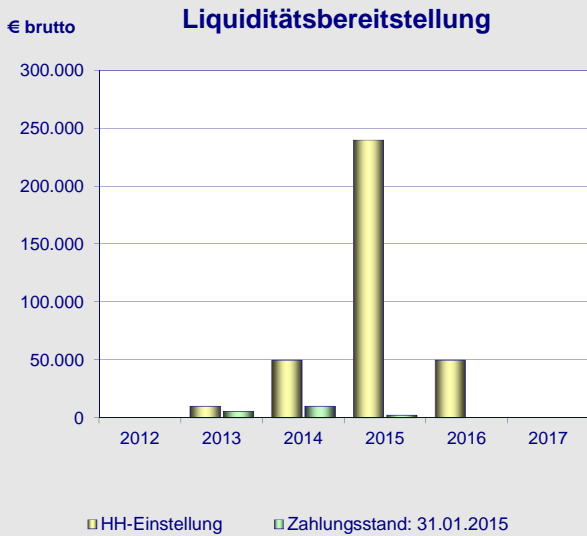

Erläuterungen

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Sept. 2013					●
Planung	Okt. 2013	Feb. 2015					●
Ausführung	April 2015	Okt. 2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Dez. 2014					●
Vergabebeschluß		Jan 2015					●
Baubeginn		April 2015					●
Fertigstellung		Okt. 2015					●



Hinweise: Ausführung in Abhängigkeit von Hochbau (Verschiebung bei Hochbau mit Baubeginn u. Fertigstellung)

Projekt		Stand: 31.01.2015		Investitionsauftrag			18
KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen				736501112017			FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Horst Grieshaber			Telefon: 2747		
KOSTEN		bis einsch.					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Gesamt					
HH-Einstellung				340.000	100.000	15.000	455.000
Zahlungsstand: 31.01.2015				93.133	21.780		114.913
Kostenschätzung		vom					655.000
Kostenberechnung		vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 23.07.2014, Vorl.-Nr. 255/14					415.000
Abrechnung (geschätzt)							●
		415.000					
<p>€ brutto</p> <p>Liquiditätsbereitstellung</p>				<p>€ brutto</p> <p>Budgetkontrolle</p>			
<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.01.2015</p>				<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 31.01.2015</p> <p>■ Kostenschätzung</p> <p>■ Kostenberechnung</p> <p>■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse</p> <p>■ Abrechnung (geschätzt)</p>			
Erläuterungen							
- Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.							
- Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.							
- Ausführung bzw. Verzögerungen in Abhängigkeit von Hochbaumaßnahmen							
TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase		von	bis				
Grundlagenermittlung		Aug. 2013	Okt. 2013				●
Planung		Nov. 2013	Sept. 2014				●
Ausführung		Okt. 2014	Juni 2015				●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung			Aug. 2014				●
Vergabebeschuß			Sept. 2014				●
Baubeginn			Okt. 2014				●
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme			Jan. 2015				●
Fertigstellung			Mrz 2015				●
Hinweise:							

Ausbau dynamische Fahrgastinformationsanlagen (DFI) **754700000007** **FinHH**

Projektleiter Fachber. 67: **Thorsten Conte** Telefon: **2310**

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
HH-Einstellung			325.000	295.000			620.000	
Zahlungsstand: 31.01.2015			67.292	0			67.292	
Kostenschätzung	vom 3.7.2014						620.000	
Kostenberechnung	vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom							
Abrechnung (geschätzt)								

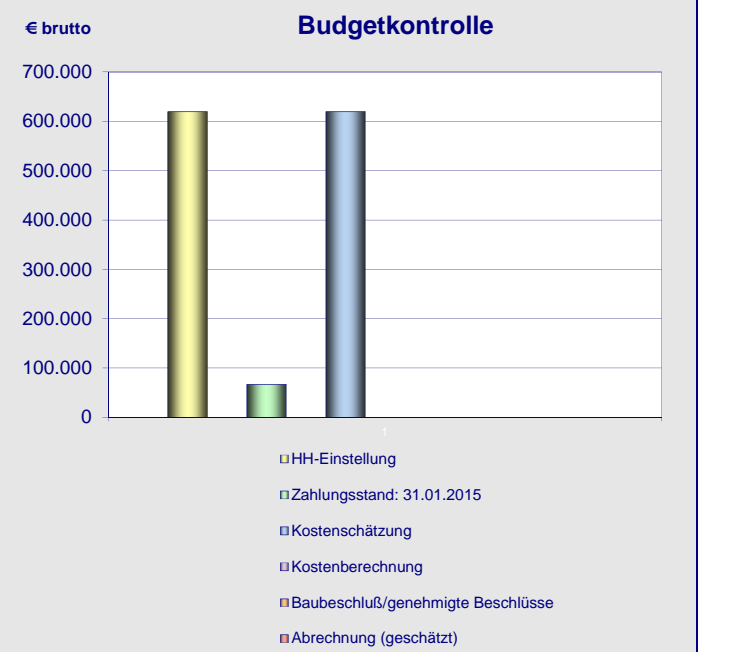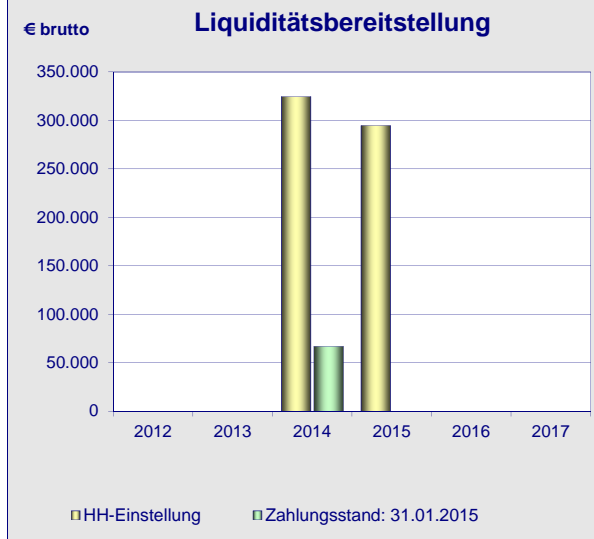

Erläuterungen

- 2015 ist mit Zuschüssen in Höhe von 45.750 € zu rechnen.

TERMINE	SOLL					STATUS
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung						●
Planung	Mai 2013	Juni 2014				●
Ausführung	Feb. 2015	Juni 2015				●
Meilenstein	bis					
Ausschreibung	25.08.2014	17.09.2014				●
Vergabebeschluß	23.10.2014					●
Baubeginn	Feb. 2015	Juni 2015				●
Fertigstellung						●
Hinweise:						
