
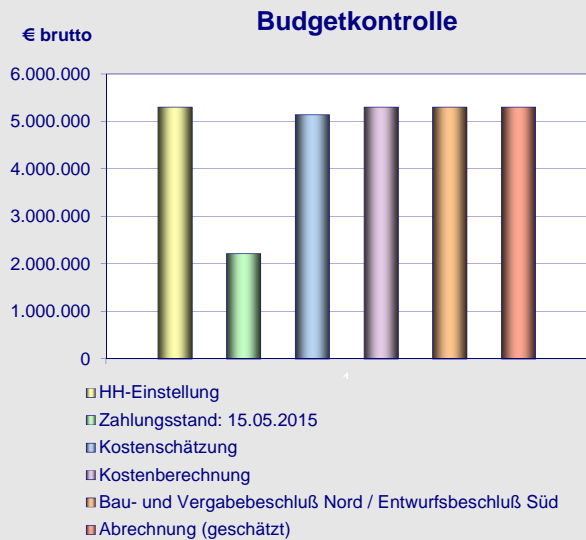


KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
HH-Einstellung			2.000.000	2.310.000	1.000.000			5.310.000
Zahlungsstand: 15.05.2015			2.105.256	116.762				2.222.018
Kostenschätzung	vom							5.150.000
Kostenberechnung	vom							5.310.000
Bau- und Vergabebeschuß Nord / Entwurfsbeschuß Süd	vom 09.12.2013 / GR 26.02.2014							5.310.000
Abrechnung (geschätzt)						●		5.310.000

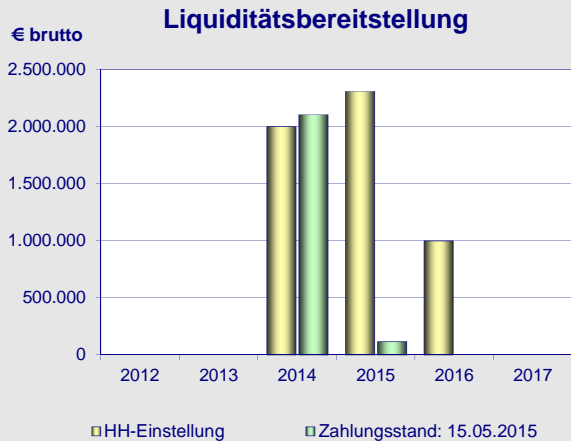

Erläuterungen

BA Nord: 2.820.000 €
BA Süd: 2.490.000 €
gesamt: 5.310.000 €
Überplanmäßige VE wird mit Baubeschluss Süd beantragt



TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung Nord		März 2013					●
Planung Nord	März 2013	Dez. 2013					●
Ausführung Nord	Jan. 2014	Dez. 2014					●
Grundlagenermittlung Süd							●
Planung Süd	Aug. 2013	Aug. 2014					●
Ausführung Süd	Sept. 2014	Okt. 2015					●
Meilenstein			bis				
Ausschreibung		Okt. 2013					●
Vergabebeschuß Nord		09.12.2013					●
Ausbau Nord	Jan. 2014	Nov. 2014					●
Fertigstellung Nord		Dez. 2014					●
Ausschreibung							●
Vergabebeschuß Süd		Juli 2014					●
Ausbau Süd	Sept. 2014						●
Fertigstellung Süd		Okt. 2015					●

Hinweise:

Projekt Alt-Württemberg-Allee	Stand: 15.05.2015	Investitionsauftrag 754106704017	FinHH 2
---	-------------------	--	-------------------

Projektleiter Fachber. 67: **Oskar Frühwirth** Telefon: **2495**

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2012	2013	2014	2015	2016	2017		
HH-Einstellung			10.807	50.000	600.000	500.000		1.160.807
Zahlungsstand: 15.05.2015			10.807	20.749	81.541			113.097
Kostenschätzung	vom							1.200.000
Kostenberechnung	vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom 22.01.2015 u. 28.01.2015 u. 07.05.2015							1.200.000
Abrechnung (geschätzt)								1.200.000

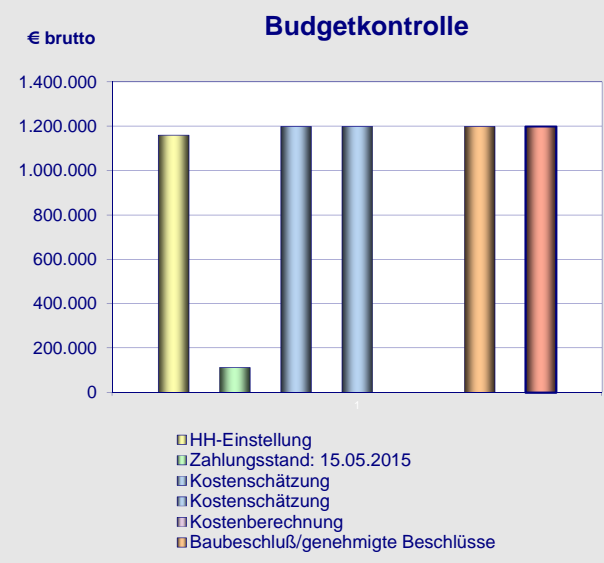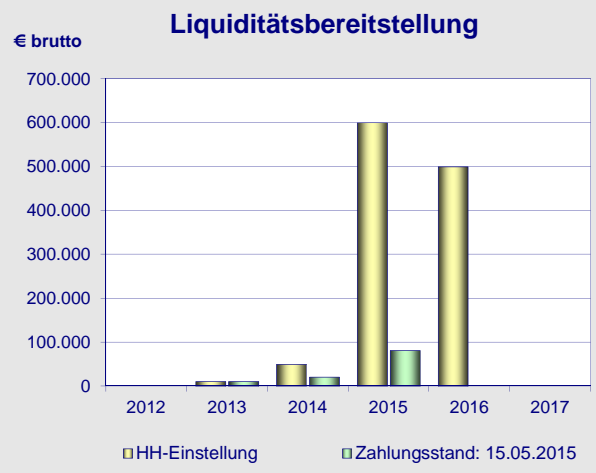

Erläuterungen



75.000, -- € Finanzierung über Historische Alleen

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Feb. 2014	Mai 2014					●
Planung	Juni 2014	Mai 2015					●
Ausführung	Juni 2015	März 2016					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung	März 2015						●
Vergabebeschluß	Mai 2015						●
Baubeginn	Juni 2015						●
Fertigstellung	März 2016						●
Hinweise:							

Projekt	Stand: 15.05.2015	Investitionsauftrag	3
Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße		754106704047	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Jürgen Müller** Telefon: **2435**

KOSTEN	bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			50.000	50.000	150.000	580.000	830.000
Zahlungsstand: 15.05.2015			0	809			809
Kostenschätzung	vom siehe HH-Einstellung						830.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

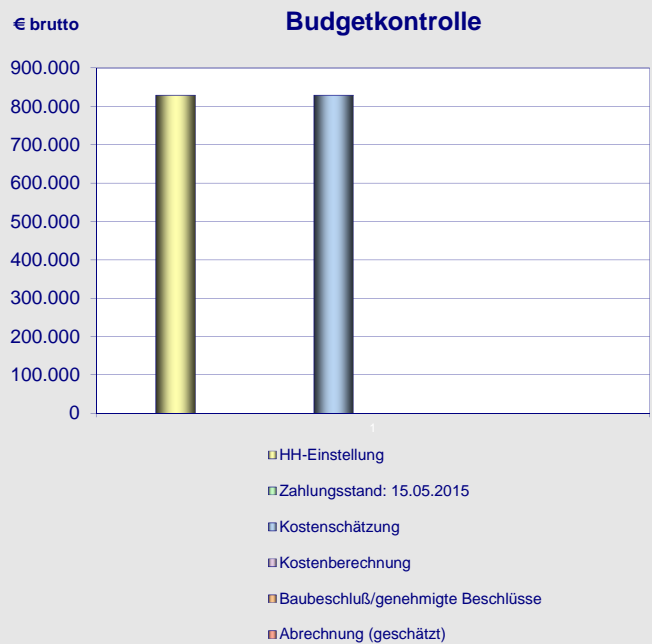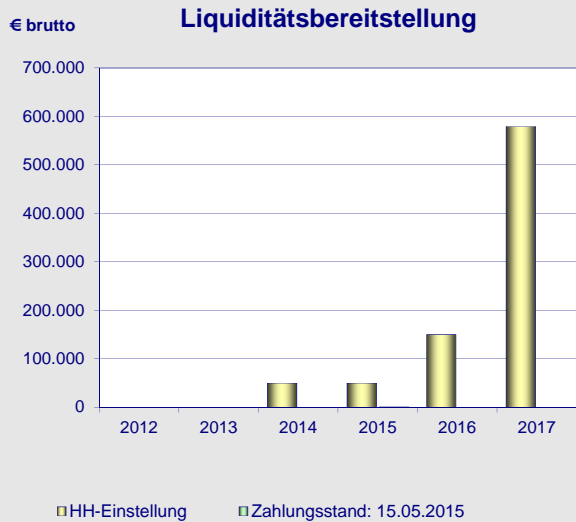

Erläuterungen

Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

Phase	TERMINE		SOLL				STATUS
	von	bis					
Grundlagenermittlung	März 2014	Juli 2014					●
Planung	Aug. 2014	April 2016					●
Ausführung	Okt. 2016	Aug. 2017					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							●
Vergabebeschuß							●
Baubeginn							●
Fertigstellung							●
Hinweise:							

Projekt	Stand: 15.05.2015	Investitionsauftrag						4
Synagogenplatz		754106701017						FinHH
Projektleiter Fachber. 67:	Bernd Wenger					Telefon:	2759	
KOSTEN	bis einsch.							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung		1.942	120.000	120.000	0	0	241.942	
Zahlungsstand: 15.05.2015		1.942	290.060	10.269			302.271	
Kostenschätzung	vom Okt. 2013						360.000	
Kostenberechnung	vom							
Entwurfs- und Baubeschluß	vom 06.11.2013						360.000	
Abrechnung (geschätzt)							360.000	

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 15.05.2015
2012	0	0
2013	0	0
2014	120.000	290.060
2015	10.269	10.269
2016	0	0
2017	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 15.05.2015	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Entwurfs- und Baubeschluß	Abrechnung (geschätzt)
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	0	0	0	0	0
2014	120.000	290.060	360.000	360.000	360.000	360.000
2015	10.269	10.269	360.000	360.000	360.000	360.000
2016	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000
2017	0	0	360.000	360.000	360.000	360.000

Erläuterungen

- Die abschließende Beschichtung der Asphaltflächen mit einem Possehl-Belag erfolgt bis Ende III. Quartal 2015.

TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2013	Juli 2013					●
Planung	Aug. 2013	Juli 2014					●
Ausführung	Aug. 2014	Okt. 2014					●
Meilenstein							
Ausschreibung							●
Vergabebeschluß							●
Baubeginn		Aug. 2014					●
Fertigstellung		Okt. 2014					●

Hinweise:

Projekt	Stand: 15.05.2015	Investitionsauftrag						5
Brücke Radweg Neckarterrasse		754106711017	FinHH					
Projektleiter Fachber. 67:		Martin Mundt					Telefon:	2592
KOSTEN		bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung	12.944	45.591	180.000	820.000	0	0	1.000.000	
Zahlungsstand: 15.05.2015	12.944	45.591	37.510	42.568			138.613	
Kostenschätzung vom 15.10.2012							1.000.000	
Kostenberechnung vom 19.11.2012							1.000.000	
Baubeschluß vom 21.03.2013							1.000.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	1.000.000	
€ brutto Liquiditätsbereitstellung 				€ brutto Budgetkontrolle 				
Erläuterungen - Förderung über LGVFG/RL-Radinfrastruktur bewilligt								
TERMINE		SOLL		STATUS				
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	März 2011	Juli 2012					●	
Planung	Juli 2012	Okt. 2014					●	
Ausführung	Nov. 2014	Okt. 2015					●	
Meilenstein	bis							
Ausschreibung		Aug. 2014						
Vergabebeschuß		Okt. 2014						
Baubeginn		Nov. 2014						
Fertigstellung		Okt. 2015						
Hinweise:	HH-Mittelanmeldung für das Jahr 2015 mit Gesamtsumme von 1.000.000 €							


Projekt		Stand: 15.05.2015		Investitionsauftrag			6
Straßenbau Comburgstraße				754106709017			FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck			Telefon: 2632		
KOSTEN		bis einsch.					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
		Gesamt					
HH-Einstellung				150.000	1.200.000	1.900.000	400.000
Zahlungsstand: 15.05.2015		24.926		44.030	0		
Kostenschätzung		vom		01.08.2014			3.500.000
Kostenberechnung		vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom					
Abrechnung (geschätzt)							
€ brutto		Liquiditätsbereitstellung			€ brutto		
		<ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 15.05.2015 			<ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 15.05.2015 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt) 		
Erläuterungen							
<ul style="list-style-type: none"> - Es handelt sich um die Comburgstraße zwischen DJK Vereinsheim und Schorndorferstr. sowie der Max-Reger-Str.(bis zur Schumannstr.) - Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab. - Die Kostenschätzung wurde im Zuge der Haushaltseinstellung durchgeführt. - Der Kreisverkehr Comburg-/Schorndorferstr. ist kostenmäßig enthalten. 							
TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase		von	bis				
Grundlagenermittlung			2013				●
Planung		2014	2015				●
Ausführung		April 2016	2017				●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							
Hinweise:							

Projekt		Stand: 15.05.2015			Investitionsauftrag		FinHH	7	
Resterschließung Hartenecker Höhe		Hansjoachim Heck			Telefon:		2632		
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck			Telefon:		2632		
KOSTEN		bis einschl.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	Gesamt
HH-Einstellung							800.000		800.000
Zahlungsstand: 15.05.2015					22.269	27.139			49.408
Kostenschätzung		vom		11. Aug. 14				800.000	
Kostenberechnung		vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom		26.3.2015 Vorl.-Nr.100/15				640.000	
Abrechnung (geschätzt)				100%		●			
<p>€ brutto</p> <p>Liquiditätsbereitstellung</p>		<p>€ brutto</p> <p>Budgetkontrolle</p>							
<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 15.05.2015</p>		<p>■ HH-Einstellung</p> <p>■ Zahlungsstand: 15.05.2015</p> <p>■ Kostenschätzung</p> <p>■ Kostenberechnung</p> <p>■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse</p> <p>■ Abrechnung (geschätzt)</p>							
Erläuterungen									
<p>Endausbau (Einbau der Deckschicht) Hartenecker Höhe</p> <p>- Elfriede-Breitenbach-Str.</p> <p>- Elisabeth-Kranz-Str.</p> <p>- Anna Neff Str.</p> <p>- sowie Wohnwege zur Cäsar von Hofacker Anlage</p> <p>- Fertigstellung bis August 2015</p>									
TERMINE		SOLL		STATUS					
Phase		von		bis					
Grundlagenermittlung						●			
Planung				März 2015		●			
Ausführung				2015		●			
Meilenstein				bis					
Ausschreibung				Februar 2015		●			
Vergabebeschluß				März 2015		●			
Baubeginn				April 2015		●			
Fertigstellung				Aug. 2015		●			
Hinweise:									

Projekt	Stand: 15.05.2015	Investitionsauftrag	8
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA		754106709037	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Gabriele Heusel-Voraus/Hansjoachim Heck** Telefon: **2073/2632**

KOSTEN	bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			1.700.000	370.000			2.070.000
Zahlungsstand: 15.05.2015			734.022	0			734.022
Kostenschätzung vom Jan. 2014 (Planstatt Senner)							1.000.000
Kostenberechnung vom Feb. 2014 (Planstatt Senner)							837.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 26.10.2011 V.Nr. 395/11, 03.04.2014, V.Nr. 095/14							840.000
Abrechnung (geschätzt)							●

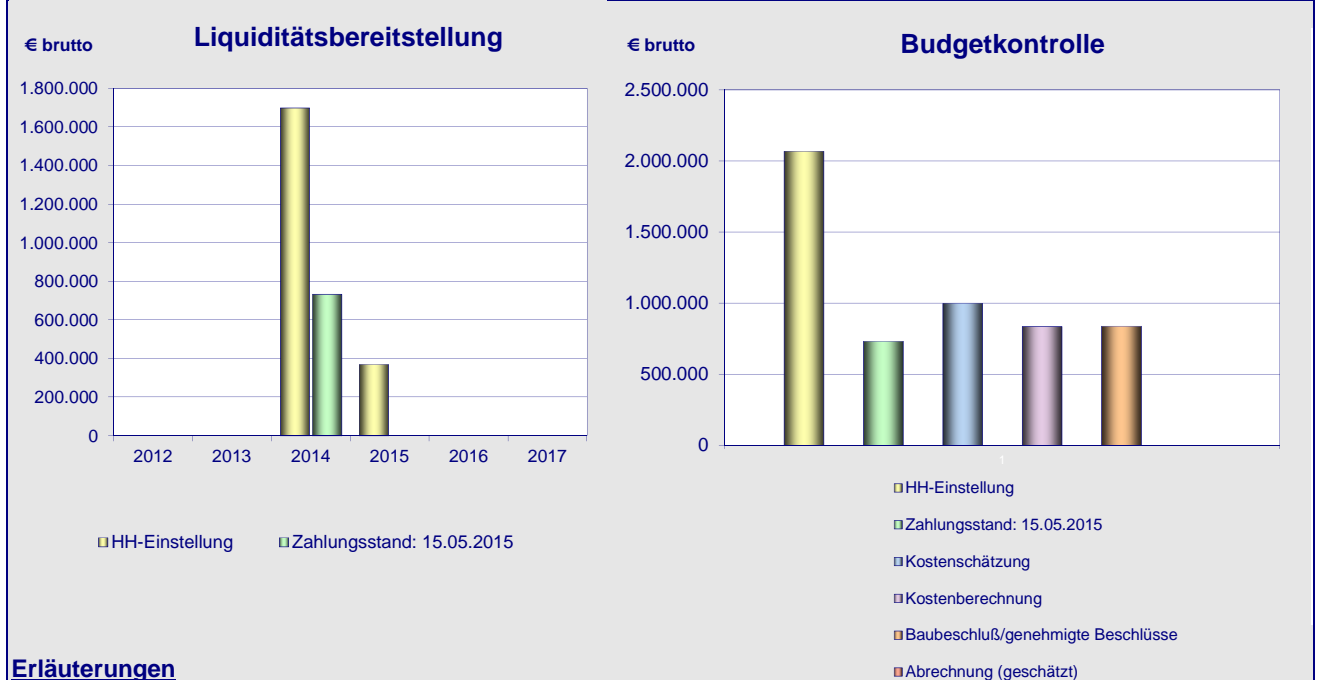

Erläuterungen

Die Haushaltseinstellungen 2014 für das gesamte Wohngebiet Hartenecker Höhe betragen 1.700.000 €. Die Haushaltseinstellungen für den Bauabschnitt II der Cäsar-von-Hofacker-Anlage, in Höhe von 1.200.000 €, beinhalten u.a. noch Restzahlungen des BA I, Restarbeiten KiFaz und Spielplatz und Fußwege im Wohngebiet Hartenecker Höhe.

Bauabschnitt II ist seit November fertiggestellt und freigegeben.
Aufbringung des gelben Possehl-Belags im Juni 2015 (witterungsbedingt)



TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 10	Dez. 10					●
Planung	Juli 13	Apr. 14					●
Ausführung	Mai 14	Dez. 14					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Feb. 14					●
Vergabebeschuß		April 14					●
Baubeginn		Mai 14					●
Fertigstellung		Dez. 14/Juni 15					●

Hinweise:

Projekt	Stand: 15.05.2015	Investitionsauftrag	9
Gemeinschaftsschule Innenstadt - Außenanlagen		721100201017	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Michael Habermann** Telefon: **2162**

KOSTEN	bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			50.000	320.000			370.000
Zahlungsstand: 15.05.2015			11.196	9.520			20.716
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 12.09.2013							370.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 20.03.2014, Vorl. Nr. 029/14; 06.11.2014, Vorl. Nr. 400/14							370.000
Abrechnung (geschätzt)						●	370.000

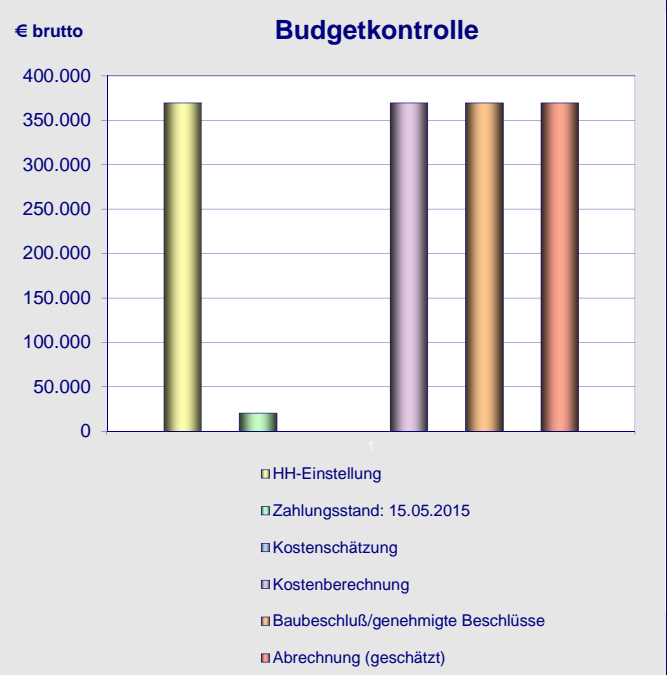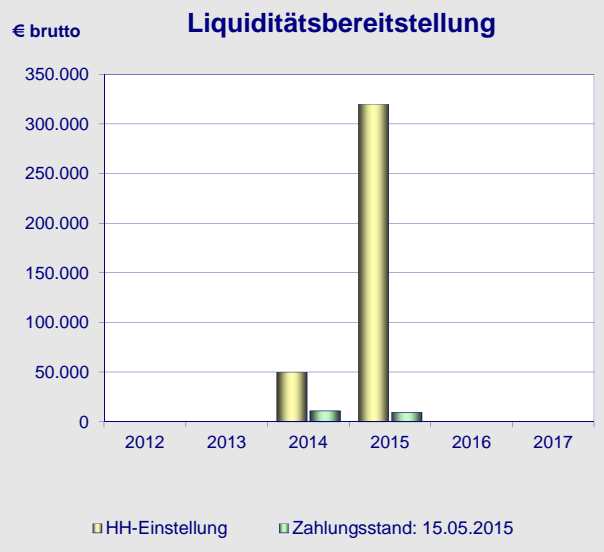

Erläuterungen



TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung							●
Planung	Juni 2013	Feb. 2015					●
Ausführung	März 2015	Aug. 2015					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung		Dez. 2014					●
Vergabebeschluß		Jan. 2015					●
Baubeginn		März 2015					●
Fertigstellung		Aug. 2015					●

Hinweise:

Projekt	Stand: 15.05.2015	Investitionsauftrag	10
Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen		755100001027	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Michael Habermann** Telefon: **2162**

KOSTEN	bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			40.000	300.000			340.000
Zahlungsstand: 15.05.2015			12.996	10.834			23.830
Kostenschätzung vom 14.03.2014							340.000
Kostenberechnung vom 12.05.2014							312.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 23.07.2014, Vorl. Nr. 164/14; Vorl. Nr. 148/15							312.000
Abrechnung (geschätzt)						●	312.000

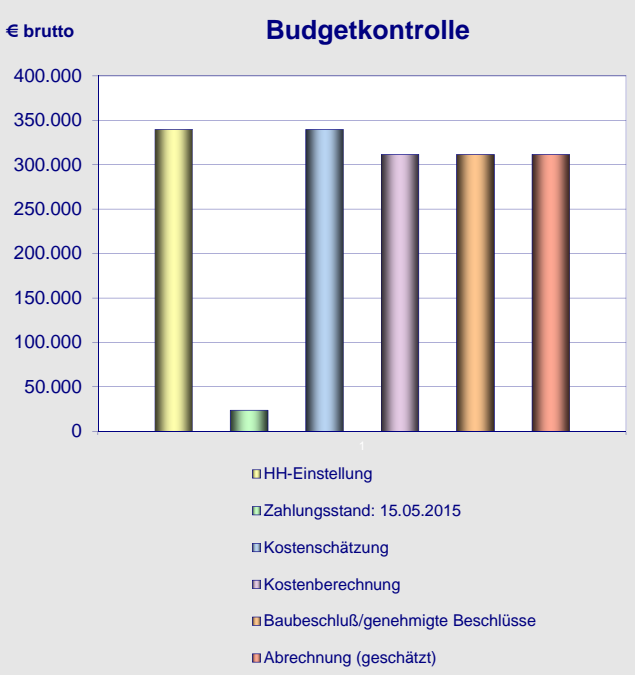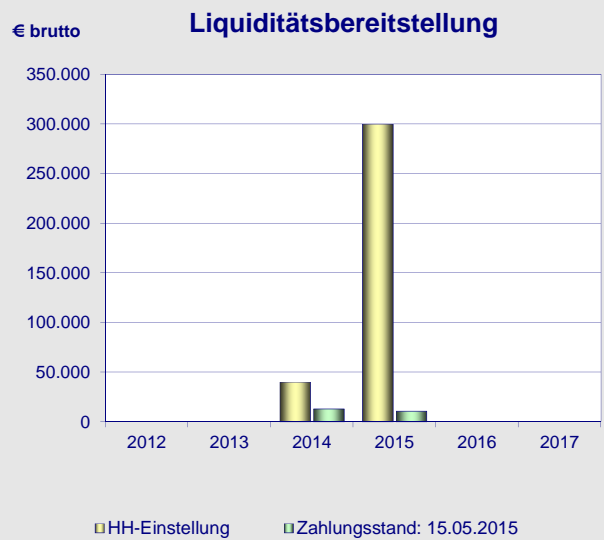

Erläuterungen


Phase	SOLL		STATUS			
	von	bis				
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Okt. 2013				●
Planung	Nov. 2013	Juli 2015				●
Ausführung	Aug. 2015	Nov. 2015				●
Meilenstein		bis				
Ausschreibung		April 2015				●
Vergabebeschuß		Mai 2015				●
Baubeginn		Aug. 2015				●
Fertigstellung		Nov. 2015				●

Hinweise: Ausführung in Abhängigkeit von Hochbau

Projekt	Stand: 15.05.2015	Investitionsauftrag	11
Erweiterung Kita Reichertshalde - Außenanlagen		736501108017	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Michael Habermann** Telefon: **2162**

KOSTEN	bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung		10.000	50.000	240.000	50.000		350.000
Zahlungsstand: 15.05.2015		5.700	9.983	35.896			51.579
Kostenschätzung vom 28.02.2014							350.000
Kostenberechnung vom 14.03.2014							335.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 03.04.2014, Vorl. Nr.091/14; Vorl. Nr. 559/14							335.000
Abrechnung (geschätzt)						●	335.000

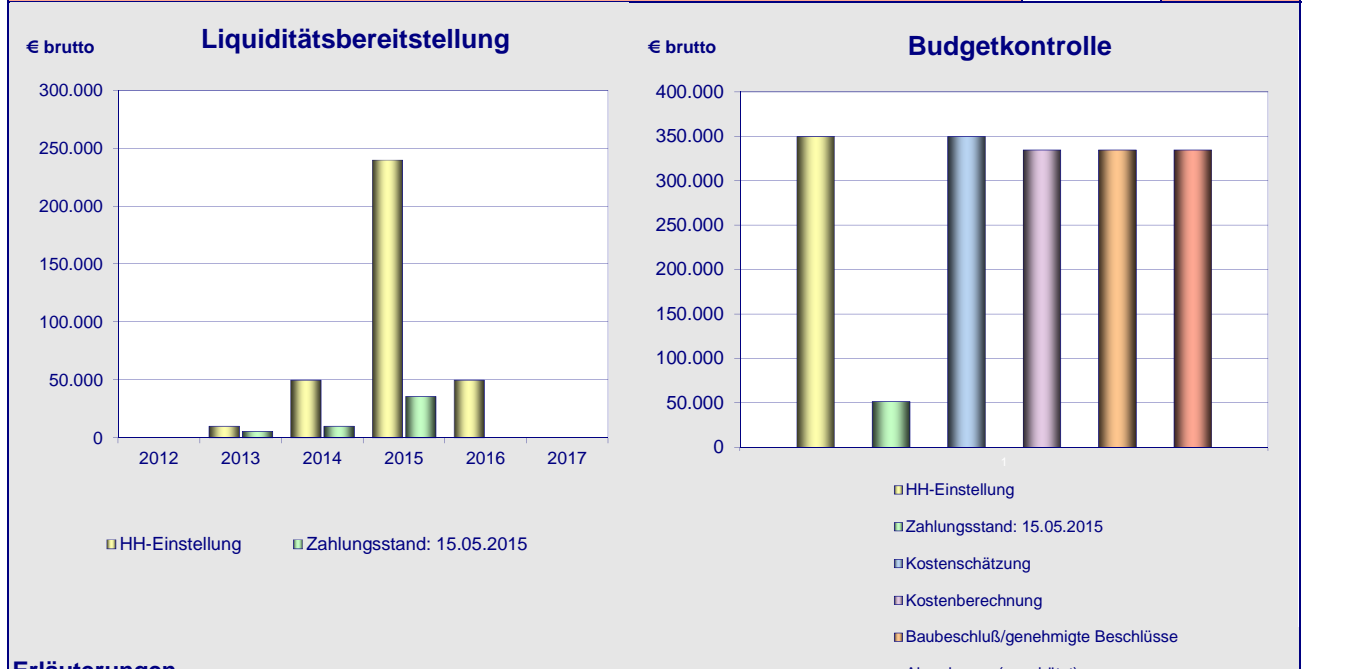

Erläuterungen



TERMINE	SOLL						STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Sept. 2013					●
Planung	Okt. 2013	März 2015					●
Ausführung	April 2015	Okt. 2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Dez. 2014					●
Vergabebeschluß		Jan 2015					●
Baubeginn		April 2015					●
Fertigstellung		Okt. 2015					●
Hinweise:							

Projekt	Stand: 15.05.2015	Investitionsauftrag						12
KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen		736501112017						FinHH
Projektleiter Fachber. 67:		Horst Grieshaber					Telefon:	2747
KOSTEN		bis einsch.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung			340.000	100.000	15.000		455.000	
Zahlungsstand: 15.05.2015			93.133	126.179			219.312	
Kostenschätzung vom							655.000	
Kostenberechnung vom								
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 23.07.2014, Vorl.-Nr. 255/14							415.000	
Abrechnung (geschätzt)						●	415.000	
€ brutto Liquiditätsbereitstellung 				€ brutto Budgetkontrolle 				
<ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 15.05.2015 				<ul style="list-style-type: none"> ■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 15.05.2015 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt) 				
Erläuterungen								
<ul style="list-style-type: none"> - Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt. - Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz. - Ausführung bzw. Verzögerungen in Abhängigkeit von Hochbaumaßnahmen 								
TERMINE		SOLL		STATUS				
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	Aug. 2013	Okt. 2013					●	
Planung	Nov. 2013	Sept. 2014					●	
Ausführung	Okt. 2014	Juni 2015					●	
Meilenstein		bis						
Ausschreibung		Aug. 2014					●	
Vergabebeschuß		Sept. 2014					●	
Baubeginn		Okt. 2014					●	
Fertigstellung Zugänge wegen Inbetriebnahme		Jan. 2015					●	
Fertigstellung		Juni 2015					●	
Hinweise:								

Projekt	Stand: 15.05.2015	Investitionsauftrag	13
Ausbau dynamische Fahrgastinformationsanlagen (DFI)		75470000007	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Torsten Conte** Telefon: **2310**

KOSTEN	bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung			325.000	295.000			620.000
Zahlungsstand: 15.05.2015			67.292	186.621			253.913
Kostenschätzung	vom 3.7.2014						620.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

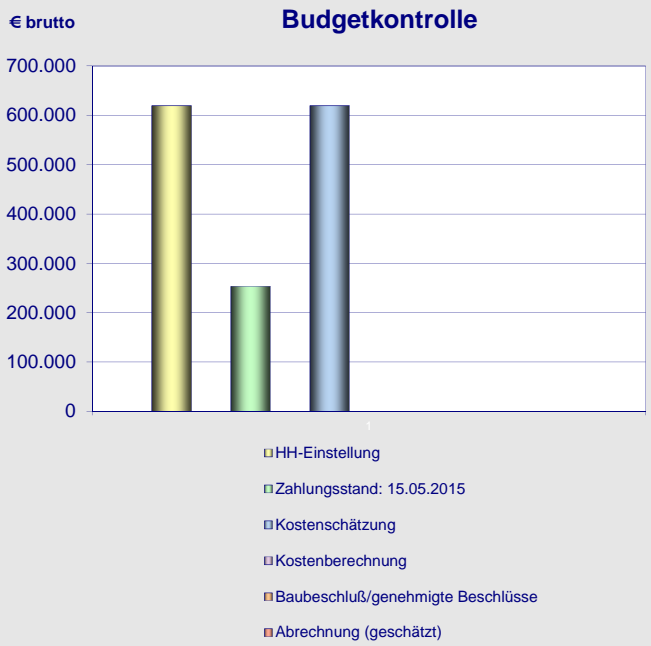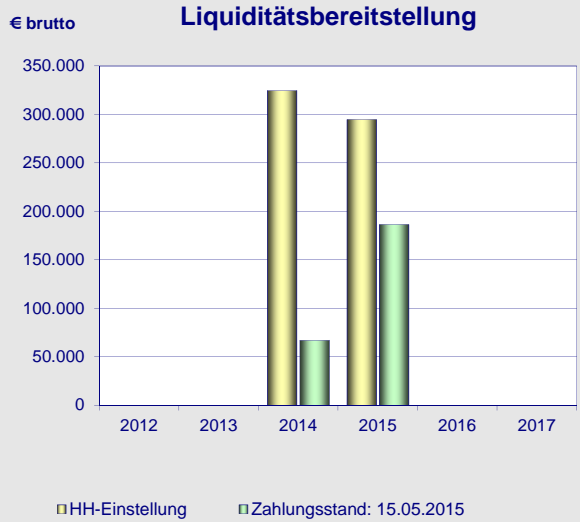

Erläuterungen



- 2015 ist mit Zuschüssen in Höhe von 45.750 € zu rechnen.

Phase	SOLL		STATUS		
	von	bis			
Grundlagenermittlung					●
Planung	Mai 2013	Juni 2014			●
Ausführung	Feb. 2015	Juni 2015			●
Meilenstein	bis				
Ausschreibung	25.08.2014	17.09.2014			●
Vergabebeschluß	23.10.2014				●
Baubeginn	Feb. 2015	Juni 2015			●
Fertigstellung		Juni 2015			●
Hinweise:					

Projekt	Stand: 15.05.2015	Investitionsauftrag	14
Sanierung und Neugestaltung Asperger Straße		754106701167	FinHH

Projektleiter Fachber. 67: **Jürgen Müller** Telefon: **2435**

KOSTEN	bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung				450.000	200.000		650.000
Zahlungsstand: 15.05.2015				0			0
Kostenschätzung	vom 04.05.2015						496.000
Kostenberechnung	vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	vom						
Abrechnung (geschätzt)							

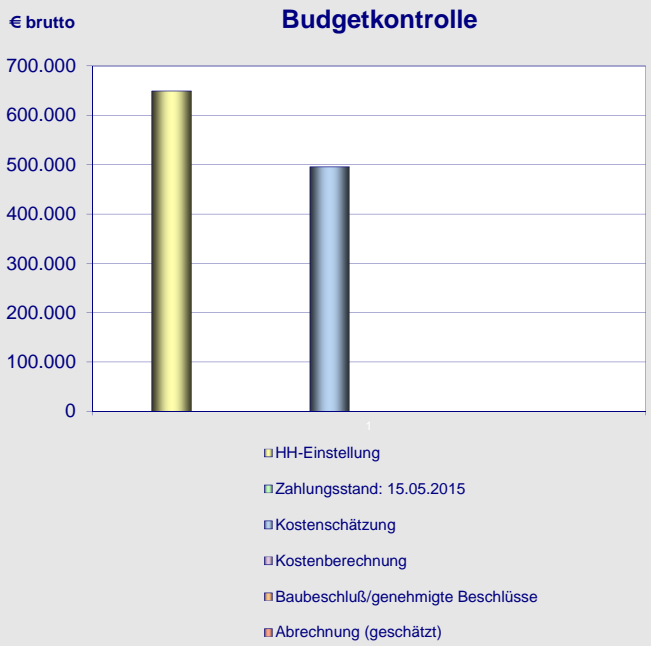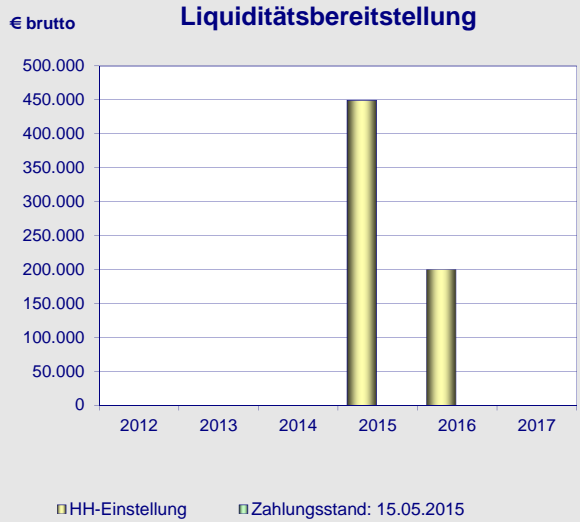

Erläuterungen

- Bau- und Vergabebeschluss im BTU 21.05.2015

Phase	TERMINE		SOLL				STATUS
	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2015	März 2015					●
Planung	April 2015	Mai 2015					●
Ausführung	Juni 2015	Nov. 2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		24.04.2015					●
Vergabebeschluss		21.05.2015					●
Baubeginn		Juni 2015					●
Fertigstellung		Nov. 2015					●

Hinweise:
