
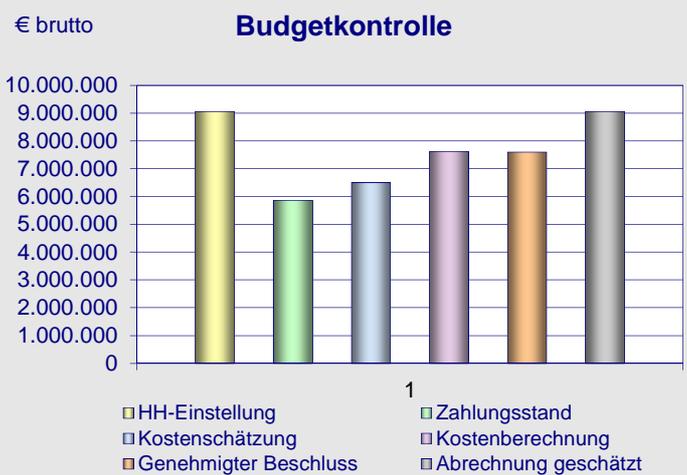


Projekt GS Gemeinsch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21)	Stand <b>9/2016</b>	Auftrag <b>721100201017</b>	8
---	------------------------	--------------------------------	---

Projektleiter Fachber. 65: <b>Schuhmacher</b>							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021		und ff.
<b>KOSTEN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	7.057.000	1.793.000	200.000				<b>9.050.000</b>
Zahlungsstand	5.683.085	163.455					<b>5.846.540</b>
Kostenschätzung vom 16. Aug 11							<b>6.500.000</b>
Kostenberechnung vom 31. Mai 12							<b>7.610.800</b>
Genehmigter Beschluss vom 21. Jul 10 27. Jun 12 25. Jul 12							<b>7.600.000</b>
Abrechnung geschätzt					119%	1.450.000	●
							<b>9.050.000</b>


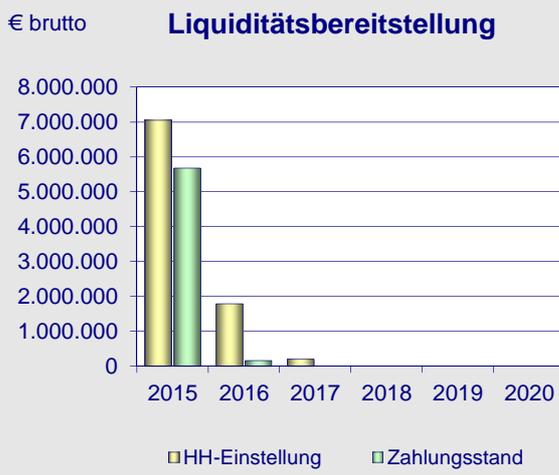


**Erläuterungen**

Das Projekt wird derzeit schlussgerechnet.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	7 / 2013			erledigt	●
Ausführung	8 / 2013	7 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		2 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2015			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projektleiter Fachber. 65: <b>Block</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	2.860.000	1.000.000					<b>3.860.000</b>
Zahlungsstand	3.076.998	237.201					<b>3.314.200</b>
Kostenschätzung vom 11. Mrz 12							<b>3.700.000</b>
Kostenberechnung vom 30. Aug 12							<b>3.860.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11   10. Okt 12   23. Jul 13							<b>3.860.000</b>
Abrechnung geschätzt					103%	120.000	<span style="color: red; font-size: 20px;">●</span>

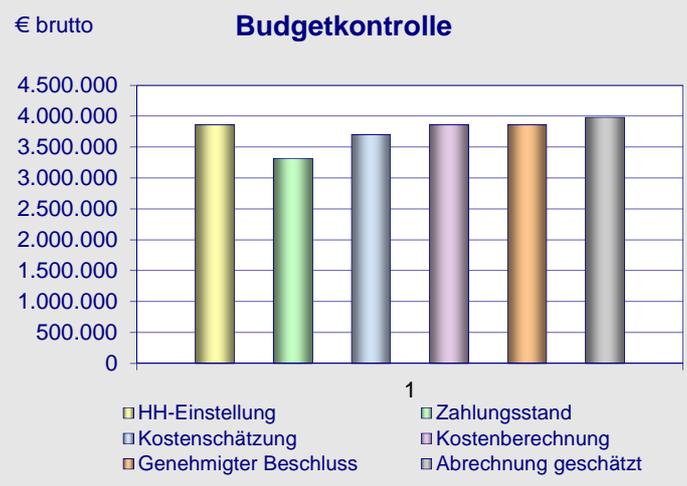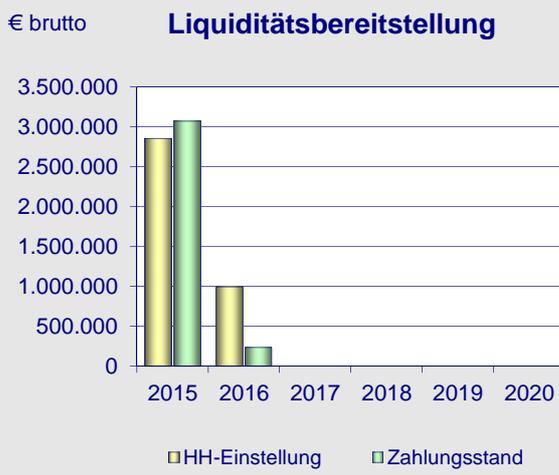

**Erläuterungen**

Die Schadenersatzansprüche der Nachbar befinden sich im Klärungsprozess.

Der Neubau mit Mensa und Bewegungsraum ist zum Schuljahresbeginn im September 2015 in Betrieb gegangen.

Die Schlussrechnungen liegen noch nicht vollständig vor.

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**


Phase	von	bis			
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt ●
Planung	3 / 2012	9 / 2013			erledigt ●
Ausführung	10 / 2013	9 / 2015			erledigt ●
<b>Meilenstein bis</b>					
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt ●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt ●
Baubeginn		10 / 2013			erledigt ●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt ●

**Hinweise:**

Die Maßnahmen für die Baugrubenproblematik (Sanierung Nachbargebäude, Rechtsstreit usw.) können kostenmäßig derzeit nicht beziffert werden. Diese werden nachgereicht.

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	10
GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)			721100112017	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Pfletschinger</b>							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2021 und ff.							
<b>KOSTEN</b>	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	650.000	1.000.000	150.000				1.800.000
Zahlungsstand	44.683	644.287					688.970
Kostenschätzung vom 6. Nov 14							1.800.000
Kostenberechnung vom 20. Nov 14							1.800.000
Genehmigter Beschluss vom 18. Jul 12 11. Dez 13 11. Dez 14							1.800.000
Abrechnung geschätzt 100% 0							1.800.000

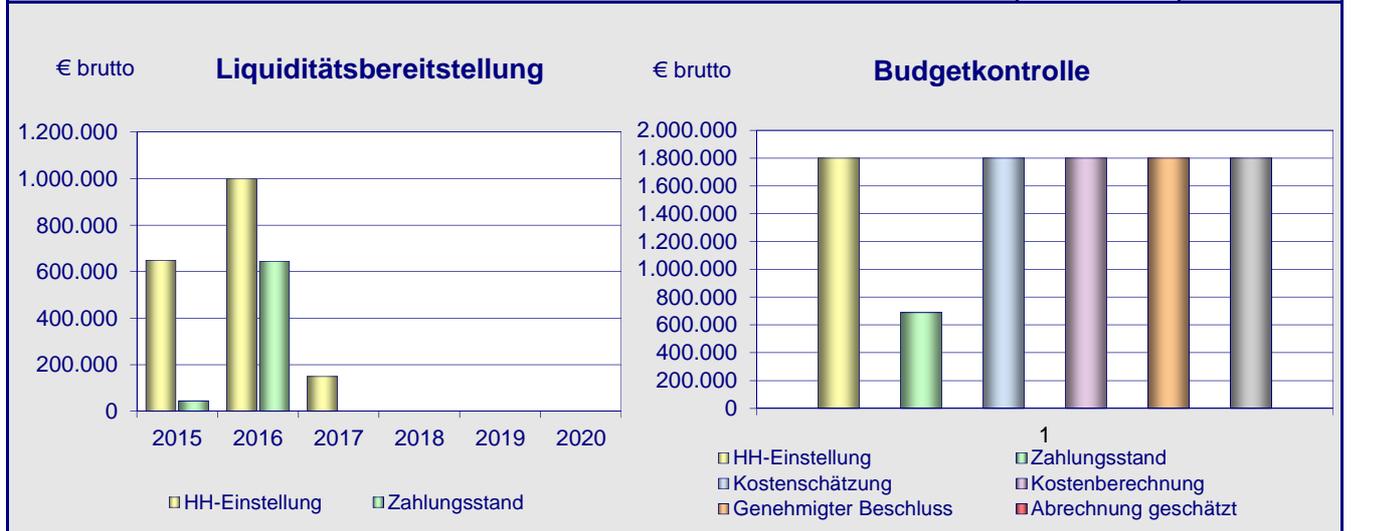

**Erläuterungen**

Aktuell finden die Trockenbau- und Putzarbeiten statt. Anschluss sind die Schreiner- und Malerarbeiten geplant. Im

Nach Abbau des Außengerüstes, gegen Ende des Jahres, erfolgt die Aufstellung der Fluchttreppe.


TERMINE	SOLL	STATUS
Phase	von bis	
Grundlagenermittlung	- 11 / 2014	erledigt ●
Planung	9 / 2014 11 / 2015	erledigt ●
Ausführung	12 / 2015 3 / 2017	im Plan ●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>	
Raumprogramm	-	erledigt ●
Baugesuch	12 / 2014	erledigt ●
Baubeginn	12 / 2015	erledigt ●
Fertigstellung	3 / 2017	unkritisch ●
<b>Hinweise:</b>		

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	12
San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)			<b>konsumtiv + investiv</b>	


Projektleiter Fachber. 65: **Joas**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	200.000	200.000					400.000	
Zahlungsstand	201.591	59.696					261.287	
Kostenschätzung		vom						
Kostenberechnung		vom 15. Okt 13						398.320
Genehmigter Beschluss		vom 25. Sep 14						400.000
Abrechnung geschätzt		105%		20.000		●		420.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**

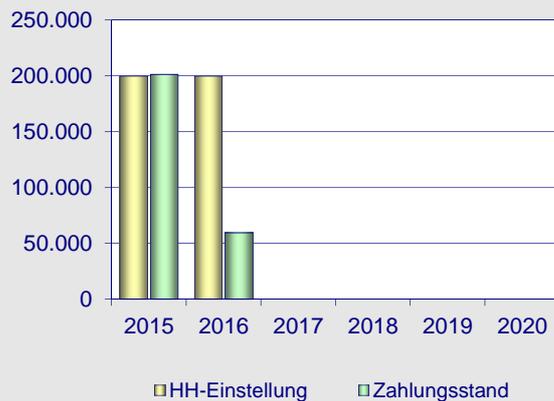

€ brutto **Budgetkontrolle**

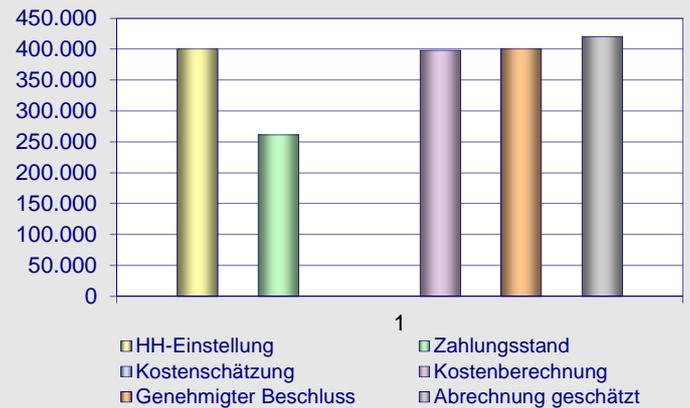

### Erläuterungen

Die Arbeiten für den 1. Fachklassenraum M 303 + M 304 sind abgeschlossen. Die Inbetriebnahme erfolgte zum Beginn des Neuen Schuljahres am 12.09.2016.

Der frühere Naturkundliche Vorbereitungsraum M 311 wurde in den Sommerferien umgebaut zum Raum "Differenziertes Unterrichten". Die Inbetriebnahme erfolgte zum Beginn des neuen Schuljahres am 12.09.2016.

Die Abruch- und Rohbauarbeiten sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung der Decke für den 2. Fachklassenraum, Raum 305 + 306 sind abgeschlossen. Die Ausbaurbeiten und Fachklassenausstattung erfolgen bis zum Frühjahr 2017.

Die Fertigstellung des 2. Fachklassenraums ist spätestens Ende der Pfingstferien 2017 geplant.

### TERMINE

### SOLL


### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	6 / 2013	7 / 2013			erledigt	●
Planung	8 / 2013	8 / 2016			erledigt	●
Ausführung	7 / 2014	5 / 2017			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		7 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2017			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt NB Obdachlosenunterkunft (Riedle 25)	Stand <b>9/2016</b>	Auftrag <b>731403202007</b>	20
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	592.000	150.000					<b>742.000</b>
Zahlungsstand	621.554	0					<b>621.554</b>
Kostenschätzung vom 19. Aug 14							<b>742.000</b>
Kostenberechnung vom 19. Aug 14							<b>742.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 8. Okt 14 26. Mrz 15							<b>742.000</b>
Abrechnung geschätzt					84%	-120.000	<b>622.000</b>

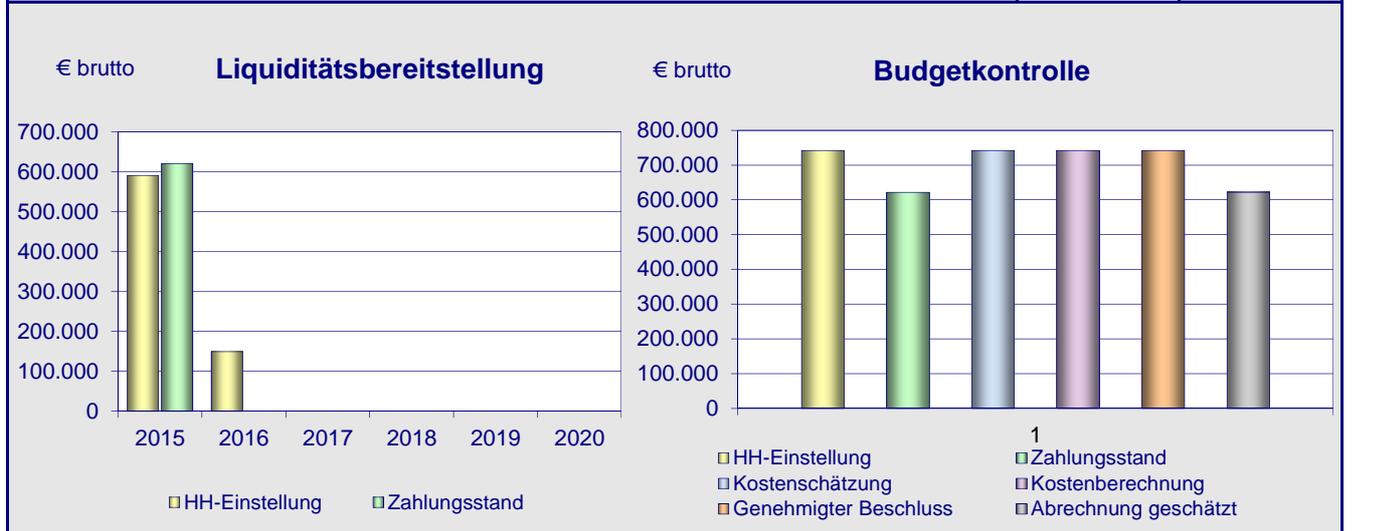


**Erläuterungen**

- Projekt schlußgerechnet mit 622.000 EUR

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2014	12 / 2014			erledigt	●
Planung	12 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	7 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		12 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		4 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt SAN Obdachlosenunterkunft (Teinacher- 11)	Stand <b>9/2016</b>	Auftrag <b>konsumtiv</b>	21
--	------------------------	-----------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Schneider</b>							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021		und ff.
<b>KOSTEN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		650.000					650.000
Zahlungsstand	19.448	362.814					382.262
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 4. Sep 14							
Genehmigter Beschluss vom 1. Okt 14							
Abrechnung geschätzt 100% 0 ●							

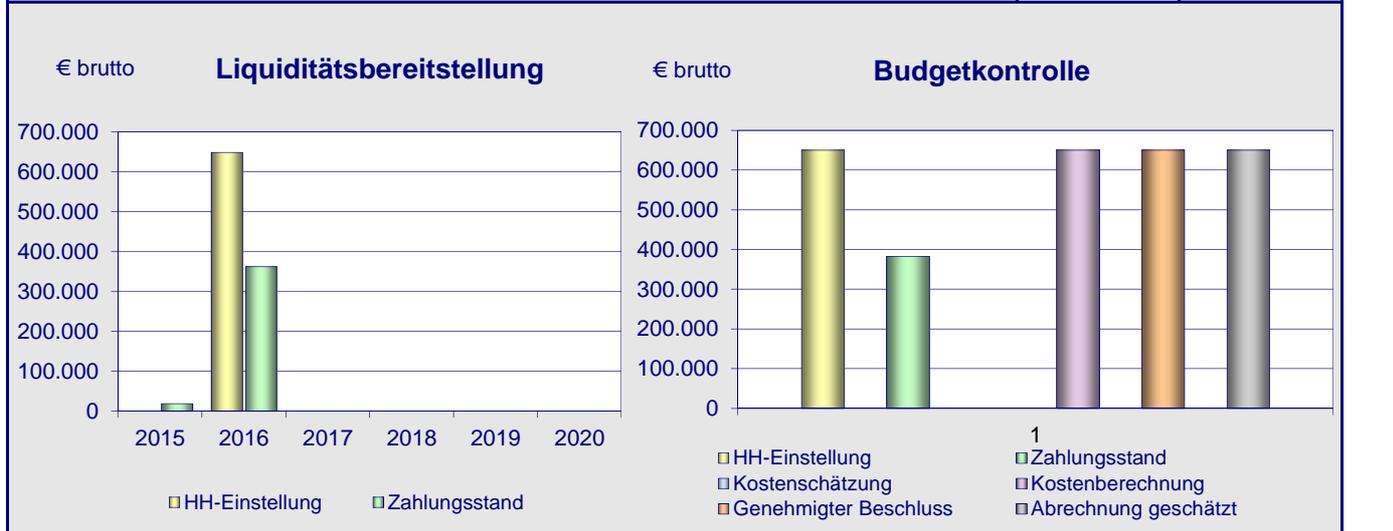

**Erläuterungen**

Nach Genehmigung des Bauantrags am 26.10.2015 wurde mit den Arbeiten im November 2015 begonnen.


Das Projekt ist seit Mitte April fertig gestellt und die ersten Bewohner sind eingezogen.

Das Projekt ist fast schlussgerechnet.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2014	1 / 2015			erledigt	●
Planung	6 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
Ausführung	11 / 2015	4 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		1 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		11 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		4 / 2016			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	22
Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25)			721100601427	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	800.000	375.000					1.175.000
Zahlungsstand	773.560	25.037					798.597
Kostenschätzung			vom 7. Aug 14				1.175.000
Kostenberechnung			vom 7. Aug 14				1.175.000
Genehmigter Beschluss			vom 19. Nov 14				1.175.000
Abrechnung geschätzt				77%	-275.000	●	900.000

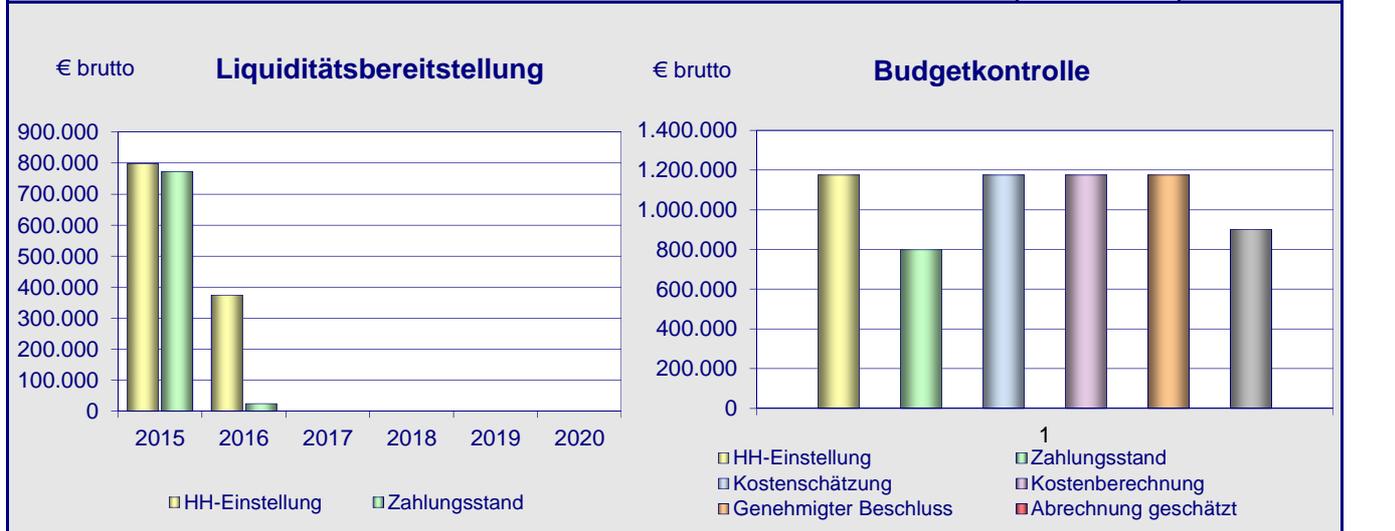

**Erläuterungen**


Projekt ist in Abrechnung.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	1 / 2014			erledigt	●
Planung	2 / 2014	9 / 2014			erledigt	●
Ausführung	1 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		2 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		10 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		1 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	23
Brandschutz Hirschbergschule I (Tammer-32)			<b>konsumtiv + investiv</b>	

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	330.000	370.000					700.000	
Zahlungsstand	330.856	216.262					547.118	
Kostenschätzung			vom 30. Nov 14			700.000		
Kostenberechnung			vom 24. Feb 15			700.000		
Genehmigter Beschluss			vom 4. Dez 14		18. Mrz 15			700.000
Abrechnung geschätzt			100%		0	●	700.000	

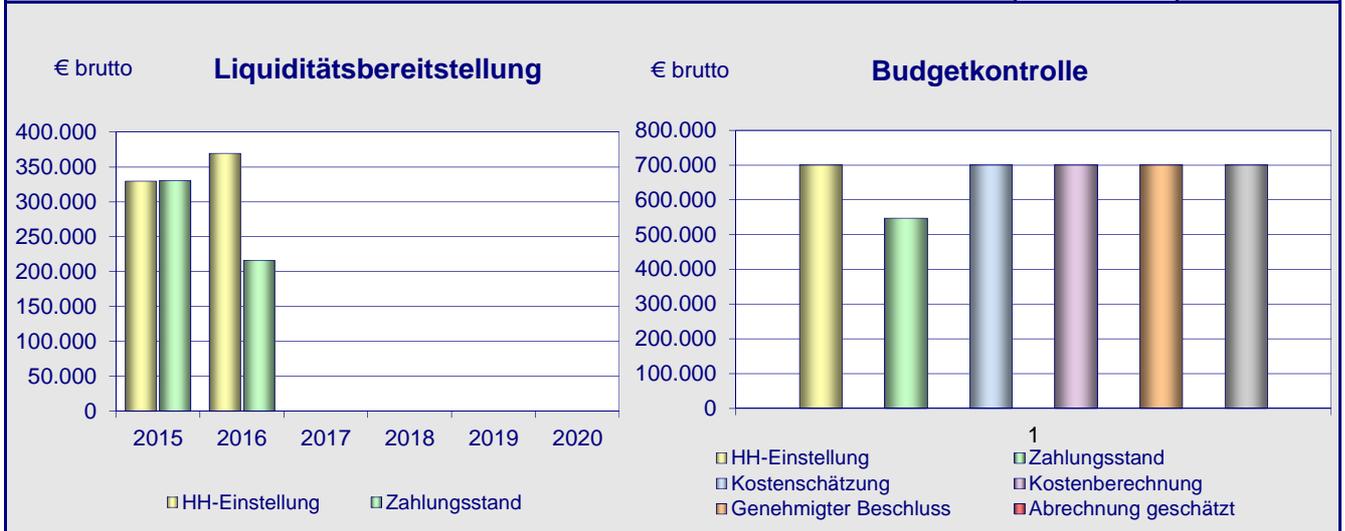

**Erläuterungen**

Im März 2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss durch den Gemeinderat beschlossen.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wurde eine Verlängerung für die Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Ende 2016 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

In den Sommerferien wurde die Decken montiert, die Türen dichtschießend hergestellt, ein RWA-Oberlicht eingebaut und ein Großteil der LED-Leuchten eingebaut.

Die notwendigen Finanzmittel über die Haushaltsmitteleinstellung in 2016 hinaus werden über Haushaltsresten von 2015 gedeckt.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	6 / 2015	12 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		-				
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2016			unkritisch	●


**Hinweise:** Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt.

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	28
Brandschutz Hirschbergschule II (Tammer-34)			<b>konsumtiv + investiv</b>	


Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	205.000	380.000	215.000				800.000	
Zahlungsstand	204.038	176.507					380.545	
Kostenschätzung			vom 30. Nov 14			800.000		
Kostenberechnung			vom 24. Feb 15			800.000		
Genehmigter Beschluss			vom 4. Dez 14		18. Mrz 15			800.000
Abrechnung geschätzt			100%		0	●	800.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**

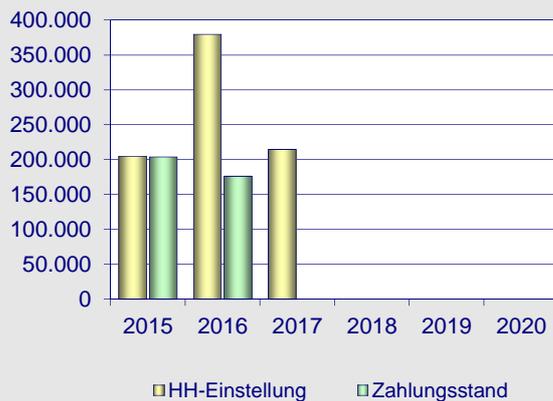

€ brutto **Budgetkontrolle**

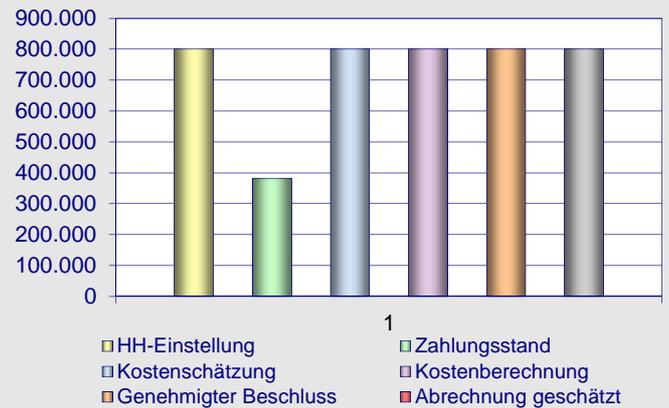

### Erläuterungen

Im März 2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss durch den Gemeinderat beschlossen.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wurde eine Verlängerung für die Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Ende 2016 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

Die Fluchttreppe ist fertig gestellt. In den Sommerferien wird mit der Montage der Decken in den Fluren begonnen.

Die notwendigen Finanzmittel über die Haushaltsmitteleinstellung in 2016 hinaus werden über Haushaltsresten von 2015 gedeckt.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	6 / 2015	12 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		3 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2016			unkritisch	●

### Hinweise:

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt.

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	29
Brandschutz Oststadtschule I (Berliner Platz 2)			<b>konsumtiv + investiv</b>	


Projektleiter Fachber. 65: **Drienko**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt	
HH-Einstellung	445.000	315.000	75.000				835.000	
Zahlungsstand	443.015	209.185					652.200	
Kostenschätzung			vom 12. Feb 15			835.000		
Kostenberechnung			vom 25. Feb 15			835.000		
Genehmigter Beschluss			vom 2. Okt 14		18. Mrz 15			835.000
Abrechnung geschätzt			100%		0	●	835.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

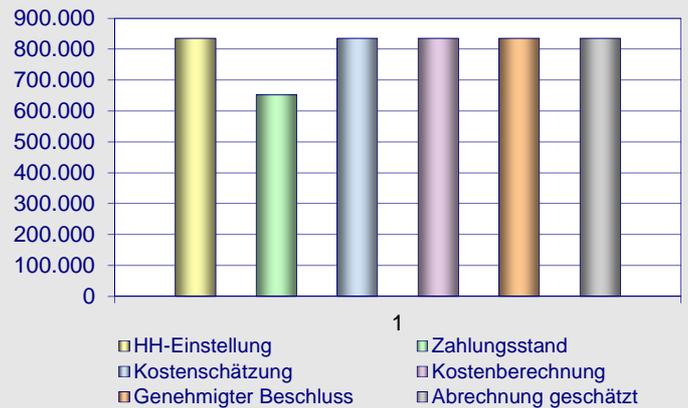

### Erläuterungen

Im März 2015 wurde im Gemeinderat der Entwurf- und Baubeschluss zur Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen gefasst.

Da die Bauarbeiten nur in den Schulferien ausgeführt werden können, ist die Fertigstellung der Maßnahmen bis Ende 2016 geplant. Eine Fristverlängerung wurde beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

Die Fluchttreppen sind fertiggestellt. In den Sommerferien werden die Klassenzimmertüren im Altbau erneuert. Die Schreinerarbeiten sind beauftragt.

Die notwendigen Finanzmittel über die Haushaltsmitteleinstellung in 2016 hinaus (vgl. Vorlage 056/15) werden über Haushaltsreste von 2015 (779480100007 "Brandschutz an Schulen") und über das Budget Gebäudeunterhaltung 2016 gedeckt.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS


Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2014	1 / 2015			erledigt	●
Planung	2 / 2015	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	12 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		0 / 0				
Baugesuch		5 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2016			unkritisch	●

### Hinweise:

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgeteilt.

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	30
NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)			721100109007	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Schneider</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021	und ff.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung		312.000	2.555.000	7.220.000	3.935.000	1.278.000	15.300.000
Zahlungsstand	149.855	160.454					310.309
Kostenschätzung		vom 28. Jan 16					13.900.000
Kostenberechnung		vom 18. Aug 16					15.300.000
Genehmigter Beschluss		vom 6. Apr 16		28. Sep 16			15.300.000
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	15.300.000

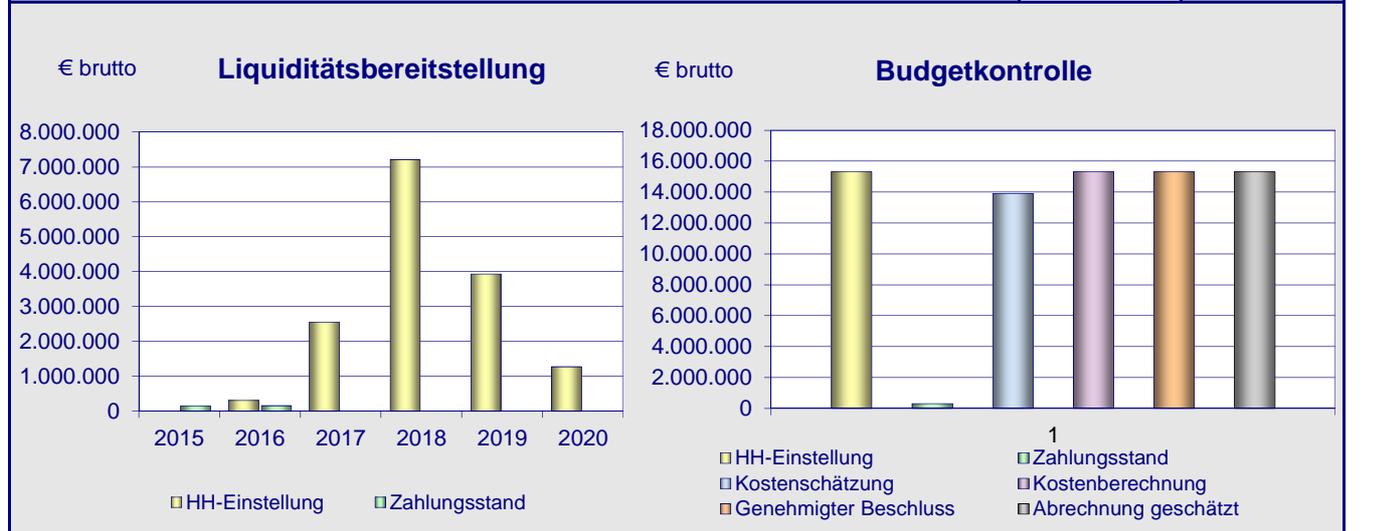

**Erläuterungen**


Am 24.06.2015 wurde das Raumprogramm für den Ausbau der August-Lämmle-Schule zur Ganztageschule mit Betreuungsräumen und Mensa (Vorl.-Nr. 220/15) sowie die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen beschlossen.

Der Entwurfs- und Baubeschluss erfolgte am 28.09.2016 (Vorl.-Nr. 290/16).

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2015	6 / 2015			erledigt	●
Planung	7 / 2015	3 / 2017			im Plan	●
Ausführung	4 / 2017	9 / 2020			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		6 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2016			im Plan	●
Baubeginn		4 / 2017			unkritisch	●
Fertigstellung		9 / 2020			unkritisch	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	31
Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)			<b>konsumtiv + investiv</b>	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Raiber</b>							
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021	und ff.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	49.500	242.000	1.144.000	1.064.500			2.500.000
Zahlungsstand	50.428	99.661					150.088
Kostenschätzung vom 24. Sep 15							2.750.000
Kostenberechnung vom 9. Dez 15							2.500.000
Genehmigter Beschluss vom 9. Dez 15							2.500.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●

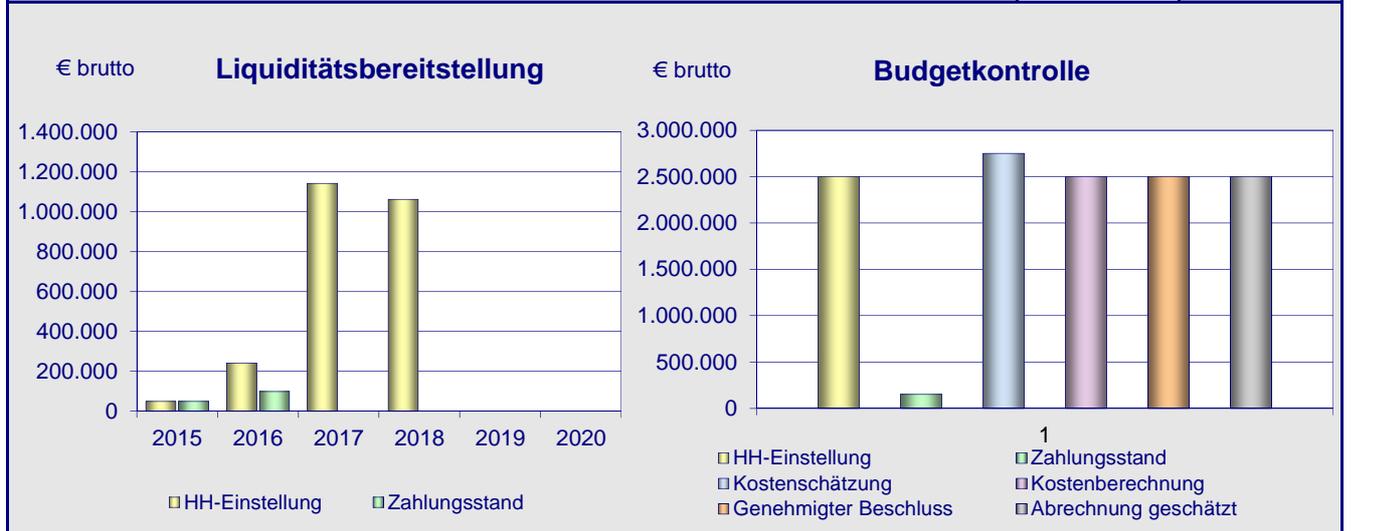

**Erläuterungen**

Am 09.12.2015 erfolgte im GR der Entwurfs- und Baubeschluss mit einer Gesamtprojektsumme (Investiv+Konsumtiv) in Höhe von 2.500.000,-€.

Der Bauantrag wurde am 22.04.2016 eingereicht.

In den Sommerferien erfolgten die Abbrucharbeiten.



Der Baubeginn ist für Ende Oktober (KW 43/2016) geplant.

Phase	von	bis	SOLL	STATUS
Grundlagenermittlung	1 / 2015	1 / 2015		erledigt ●
Planung	1 / 2015	9 / 2016		im Plan ●
Ausführung	10 / 2016	12 / 2018		unkritisch ●
<b>Meilenstein bis</b>				
Raumprogramm		1 / 2015		erledigt ●
Baugesuch		3 / 2016		im Plan ●
Baubeginn		10 / 2016		unkritisch ●
Fertigstellung		12 / 2018		unkritisch ●

**Hinweise:**

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalts aufgeteilt.

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		654.000					<b>654.000</b>
Zahlungsstand		267.976					<b>267.976</b>
Kostenschätzung		vom 14. Apr 16					<b>654.000</b>
Kostenberechnung		vom 14. Apr 16					<b>654.000</b>
Genehmigter Beschluss		vom 14. Apr 16					<b>654.000</b>
Abrechnung geschätzt		100%		0	●		<b>654.000</b>

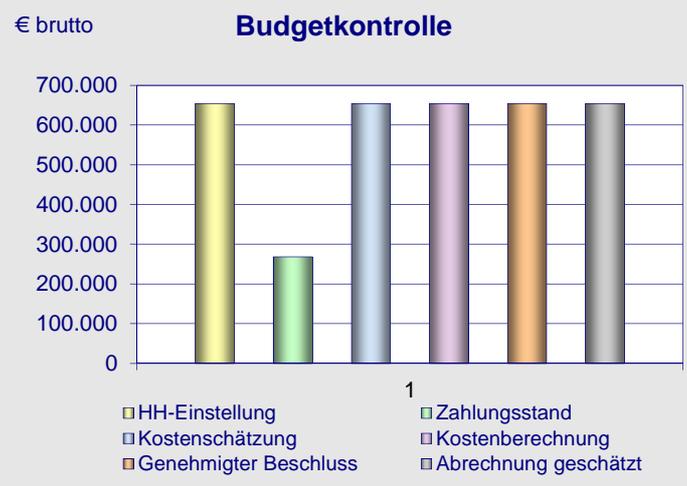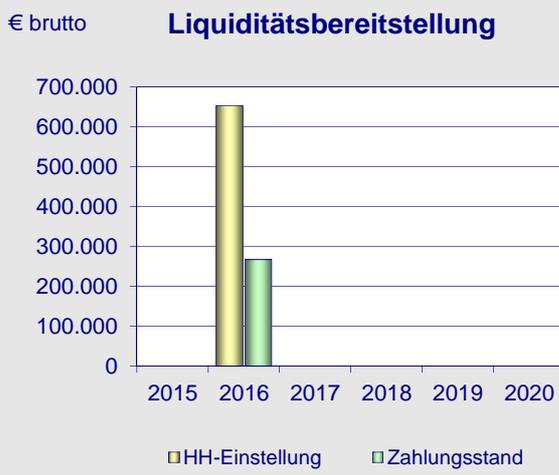

**Erläuterungen**

Baubeginn planmäßig erfolgt am 13.05.2016.  
Fertigstellung planmäßig am 09.09.2016

Projekt in Abrechnung

**TERMINE**

**SOLL**


**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2016	2 / 2016			erledigt	●
Planung	3 / 2016	4 / 2016			erledigt	●
Ausführung	5 / 2016	9 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		1 / 2016			erledigt	●
Baugesuch		0 / 0			-	●
Baubeginn		5 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2016			erledigt	●

Hinweise:

Projekt	Stand	9/2016	Auftrag	34
NB Schulsporthalle Hoheneck (Ostertag-7)			742410008017	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021	und ff.
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung		500.000	1.500.000	300.000			2.300.000
Zahlungsstand		205.648					205.648
Kostenschätzung vom 19. Feb 16							
Kostenberechnung vom							
Genehmigter Beschluss vom 29. Jul 15							
Abrechnung geschätzt 100% <span style="float: right;">●</span>							

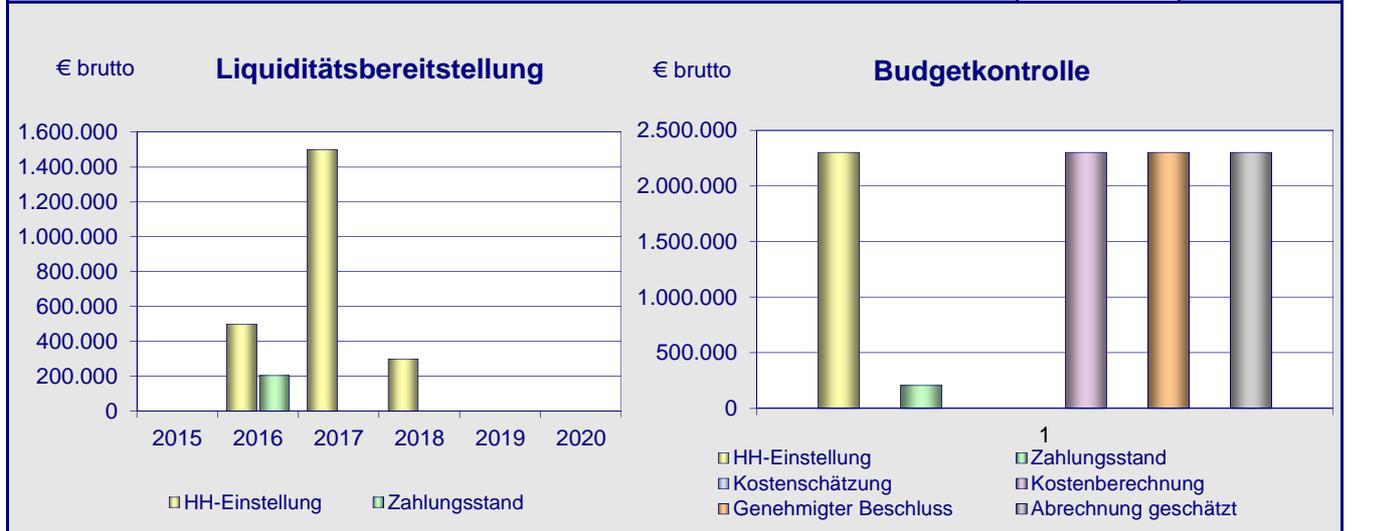

**Erläuterungen**

Der Generalübernehmervertrag wurde Anfang Juli erteilt. Die Einreichung des Bauantrags ist für Ende September / Anfang Oktober 2016 vorgesehen.

Der Rahmenterminplan des Generalübernehmers sieht eine Bauzeit von November 2016 bis Dezember 2017 vor.

Der Rückbau der alten Halle sowie die Herstellung der restlichen Aussenanlagen erfolgt im Frühjahr 2018.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
Planung	9 / 2015	10 / 2016			im Plan	●
Ausführung	11 / 2016	7 / 2018			im Plan	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		7 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		0 / 0			im Plan	●
Baubeginn		11 / 2016			im Plan	●
Fertigstellung		7 / 2018			im Plan	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	Stand <b>9/2016</b>	Auftrag <b>721100601417</b>	49
---	------------------------	--------------------------------	----


Projektleiter Fachber. 65: **Fischer**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021		und ff.	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung	1.810.000	4.500.000	8.000.000	5.000.000	3.960.000		<b>23.270.000</b>	
Zahlungsstand	1.732.502	1.301.117					<b>3.033.619</b>	
Kostenschätzung			vom 17. Jul 13				<b>23.440.000</b>	
Kostenberechnung			vom 20. Feb 14				<b>23.270.000</b>	
Genehmigter Beschluss			vom 2. Mrz 10		19. Mrz 14		<b>23.270.000</b>	
Abrechnung geschätzt			100%		0	●	<b>23.270.000</b>	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

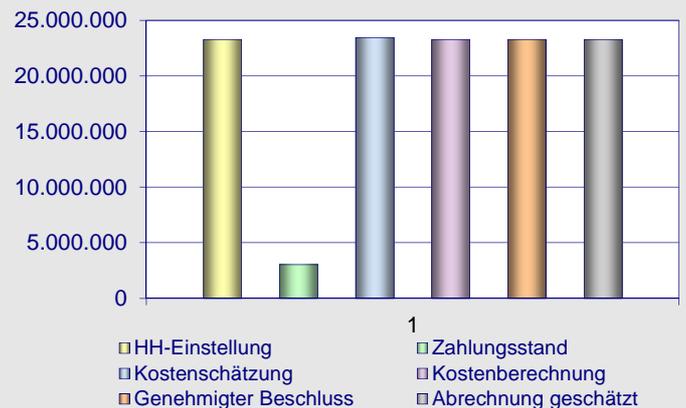

**Erläuterungen**

Derzeit wird an der Ausführungsplanung und weiteren Ausschreibungen gearbeitet. Zu drei Ausschreibungspaketen wurden bis Februar 2016 Vergaben beschlossen und die Firmen beauftragt.

Ca. 80% des baulichen Gesamtaufwandes sind vergeben.

Der Umbau wird in 2 Bauabschnitten realisiert. Die Fertigstellung des Gebäudes in der Seestraße ist im Sommer 2017 geplant. Die Gesamtfertigstellung ist Anfang 2019 geplant.

Während der Ausführung wurden unvorhergesehene Maßnahmen erforderlich. Zusätzliche Betonsanierung, Ersatz von Estrichflächen, Entfernen schadstoffbelasteter Wandfarben, etc.


Die Kosten können zum jetzigen Zeitpunkt im Rahmen des beschlossenen Budgets gedeckt werden. Auswirkungen auf den Fertigstellungstermin sind hier bereits berücksichtigt und im Bauzeitenplan fortgeschrieben.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●
Planung	3 / 2013	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	2 / 2019			im Plan	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		2 / 2019			im Plan	●

**Hinweise:**

Projekt KUZ- Umbau Museumsräume (Wilhelm-9/1)	Stand 9/2016	Auftrag 756100501007	68
--	-----------------	-------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Müllich</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamt
HH-Einstellung	1.601.000	544.000	100.000				2.245.000
Zahlungsstand	1.899.649	146.708					2.046.357
Kostenschätzung vom 25. Feb 13							2.000.000
Kostenberechnung vom 29. Mai 13							2.245.000
Genehmigter Beschluss vom 26. Jun 13							2.245.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●


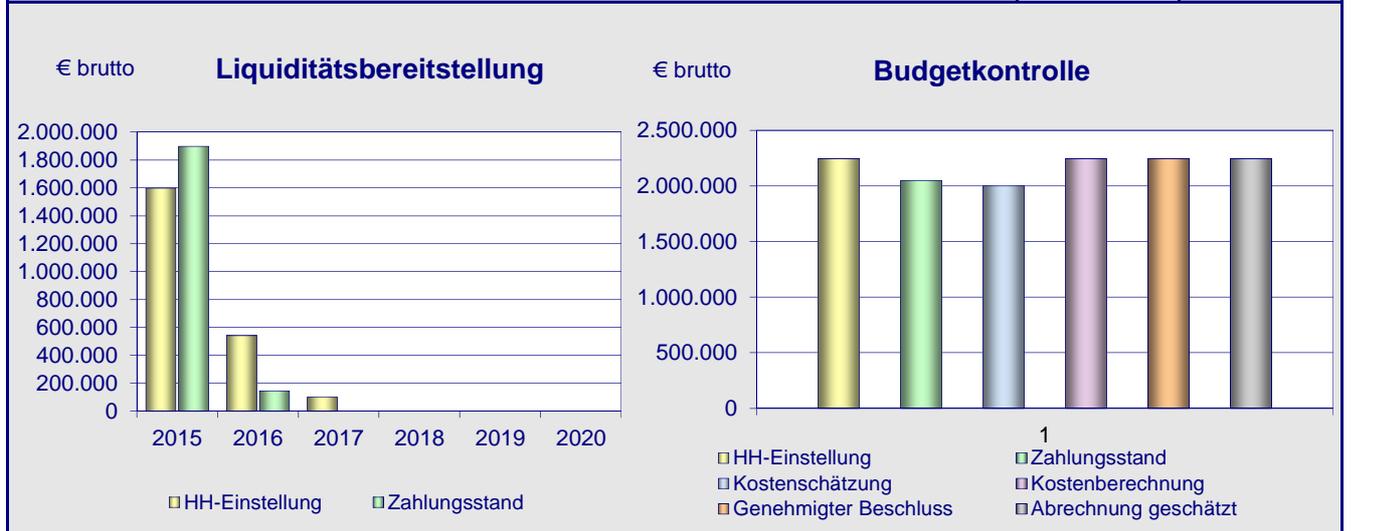


**Erläuterungen**

Aktuell erfolgen die Schlussabrechnung der Gewerke.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2013	1 / 2013			erledigt	●
Planung	1 / 2013	6 / 2014			erledigt	●
Ausführung	6 / 2013	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		2 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projektleiter Fachber. 65: <b>Raiber</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	1.290.000	385.000	100.000				<b>1.775.000</b>
Zahlungsstand	1.267.883	220.616					<b>1.488.500</b>
Kostenschätzung vom 2. Mai 13							<b>1.700.000</b>
Kostenberechnung vom 23. Sep 13							<b>1.775.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 6. Nov 13							<b>1.775.000</b>
Abrechnung geschätzt						100% <span style="color: green;">●</span>	<b>1.775.000</b>

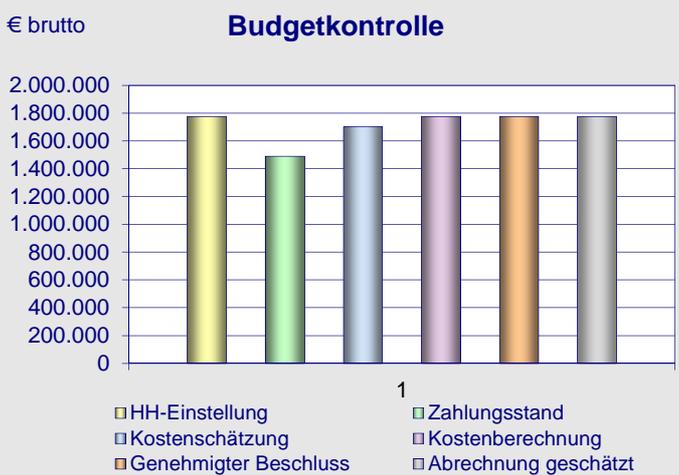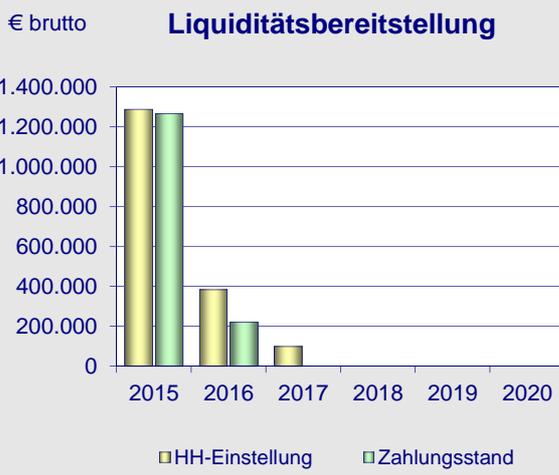

**Erläuterungen**


Aktuell werden die vorliegenden Schlussrechnungen geprüft.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2012	10 / 2012			erledigt	●
Planung	11 / 2012	3 / 2014			erledigt	●
Ausführung	3 / 2014	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		7 / 2012			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●

**Hinweise:**

Projekt KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)	Stand <b>9/2016</b>	Auftrag <b>736501111007</b>	75
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Hüttig</b>							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2021 und ff.		
<b>KOSTEN</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	125.000	1.000.000	3.225.000	3.000.000	1.000.000		<b>8.350.000</b>
Zahlungsstand	106.888	439.949					<b>546.837</b>
Kostenschätzung vom 31. Aug 15							<b>8.335.000</b>
Kostenberechnung vom 11. Nov 15							<b>8.350.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 9. Dez 15							<b>8.350.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	0	<b>8.350.000</b>

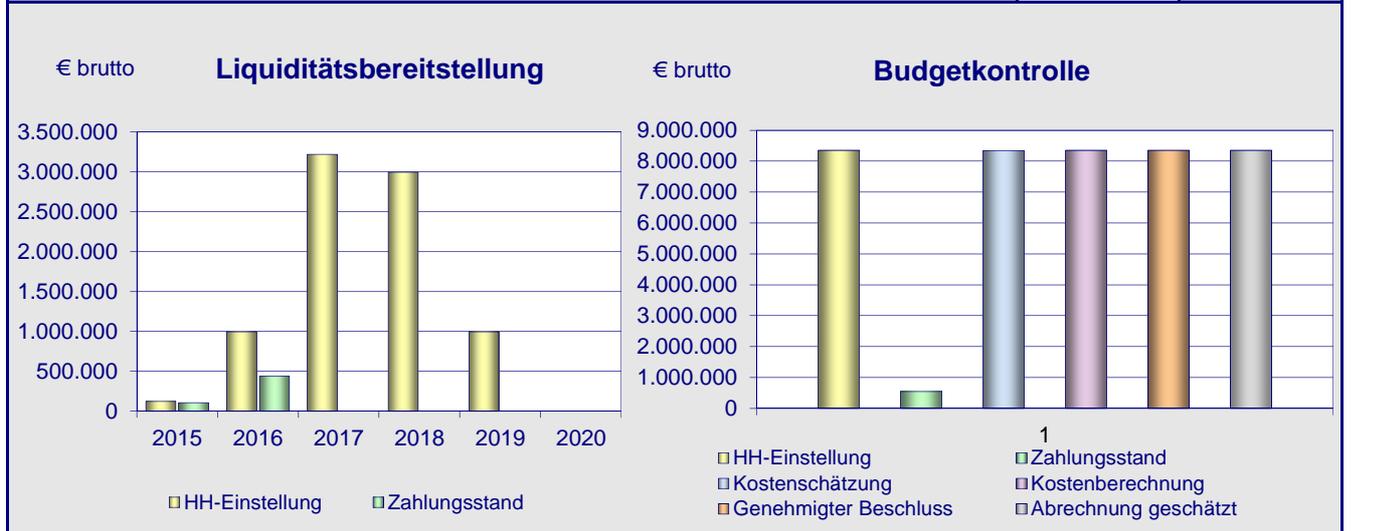

**Erläuterungen**

- Abbrucharbeiten (bis etwa Anfang 10/2016)
- Vergabe von Bauleistungen (1. Ausschreibungspaket mit Rohbau und Technik-Gewerken)

Beginn der Rohbauarbeiten im Oktober 2016.


TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	im Plan	im Plan			im Plan	●
Ausführung	im Plan	im Plan			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		1 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2018			unkritisch	●
<b>Hinweise:</b>						

Projektleiter Fachber. 65: <b>Hüttig</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2021 und ff.	
	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	3.400.000	400.000					<b>3.800.000</b>
Zahlungsstand	3.558.818	82.531					<b>3.641.349</b>
Kostenschätzung vom 17. Apr 12							<b>3.870.000</b>
Kostenberechnung vom 26. Sep 12							<b>3.800.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11   13. Dez 12   23. Jul 13							<b>3.800.000</b>
Abrechnung geschätzt					105%	●	<b>3.990.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

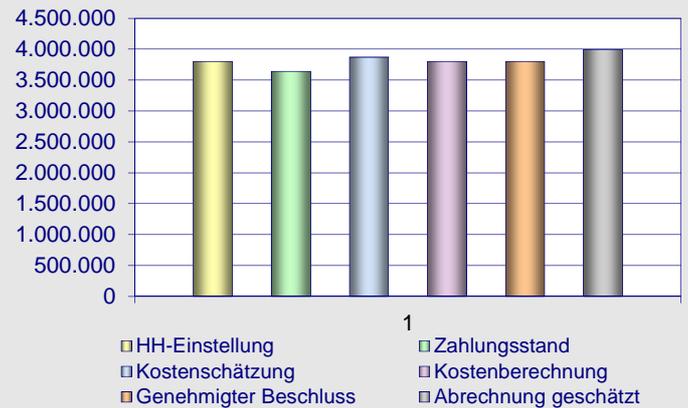

**Erläuterungen**

in Abrechnung

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	-			erledigt	●
Planung	-	-			erledigt	●
Ausführung	-	-			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>						
		<b>bis</b>				
Raumprogramm		12 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		2 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2015			erledigt	●

**Hinweise:**
