

| | | | | |
|----------------------------|-------------------|--|-----------|----|
| Projekt | Stand: 31.05.2009 | Finanzposition | HHST | 1a |
| Uferwiesen Hoheneck | | 2.6110.9550.000-0002 PSP - I00530408400903F | VH | |

Projektleiter Fachber. 67: **Bernd Wenger** Telefon: **2759**


| KOSTEN | bis einschl. | | | | | | | Gesamt |
|------------------------------------|--------------|--------|----------------|--------|------|------|----------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| HH-Einstellung Uferwiesen | 40.000 | 70.000 | 450.000 | 65.000 | | | 625.000 | |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | 39.245 | 69.509 | 97.729 | | | | 206.483 | |
| Kostenberechnung ohne WSA-Anteil | | | vom 28.03.2008 | | | | 580.000 | |
| Bau- und Vergabebeschuß BTU 578/08 | | | vom 17.12.2008 | | | | 625.000 | |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | | |



| TERMINE | SOLL | | IST | | STATUS |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------|------|--------|
| | von | bis | von | bis | |
| Grundlagenermittlung | | | 2004 | 2006 | ● |
| Planung | 2006 | 2008 | 2006 | 2008 | ● |
| Ausführung | 2008 | 2010 | | | ● |
| Meilenstein | bis | | bis | | |
| Ausschreibung (inzwischen aufgehoben) | Juni 2008 | Juli 2008 | | | ● |
| Ausschreibung (neu) | Sept. 2008 | Nov. 2008 | Sept. 2008 | | ● |
| Vergabebeschuß | | Dez. 2008 | | | ● |
| Baubeginn | Feb. 2009 | März 2009 | März 2009 | | ● |
| Fertigstellung | | Nov. 2009 | | | ● |

Hinweise:


| KOSTEN | bis einschl. | | | | | | | Gesamt |
|-----------------------------------|---------------|--------|-----------|---------|---------|---------|------------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| HH-Einstellung Zugewiesen | 240.000 | 30.000 | 1.000.000 | 500.000 | 200.000 | 130.000 | 2.100.000 | |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | 239.416 | 29.562 | 35.512 | | | | 304.490 | |
| Kostenschätzung | vom Dez. 2007 | | | | | | 2.100.000 | |
| Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse | vom | | | | | | | |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | | |

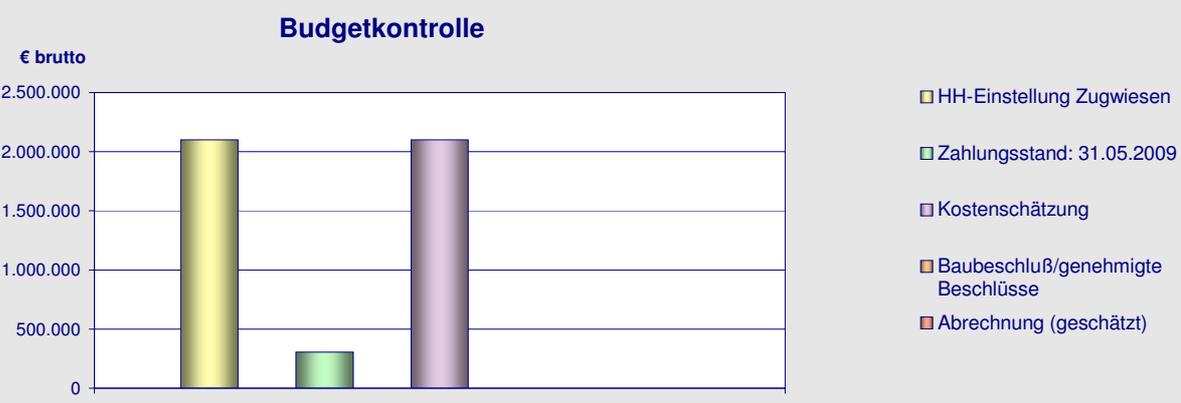

| TERMINE | SOLL | | IST | | STATUS |
|----------------------|------------|-----------|------------|------|--------|
| | von | bis | von | bis | |
| Grundlagenermittlung | | | 1998 | 1999 | ● |
| Planung | | | 2000 | 2009 | ● |
| Ausführung | 2010 | 2012 | | | ● |
| Meilenstein | bis | | bis | | |
| Ausschreibung | Okt. 2009 | Dez. 2009 | | | ● |
| Vergabebeschluß | | Dez. 2009 | | | ● |
| Baubeginn | | Jan. 2010 | | | ● |
| Fertigstellung | | März 2012 | | | ● |



| | |
|------------------|--------------------|
| Hinweise: | - ohne Grunderwerb |
|------------------|--------------------|

| | | | | | | | |
|--|-------------------|-----------------------------|-----------|-------------|---------|---------|----------------|
| Projekt | Stand: 31.05.2009 | Finanzposition | HHST | 2 | | | |
| Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten | | 2.6153.9610.000-1103 | VH | | | | |
| Projektleiter Fachber. 67: | | Herbert Wieland | Telefon: | 2593 | | | |
| KOSTEN bis einsch. | | | | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Gesamt |
| HH-Einstellung | | 0 | 100.000 | 0 | 300.000 | 260.000 | 660.000 |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | | | 0 | | | | 0 |
| Kostenschätzung FB 67 vom 23. Sep 05 | | | | | | | 660.000 |
| Kostenberechnung vom | | | | | | | |
| Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom | | | | | | | |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | |

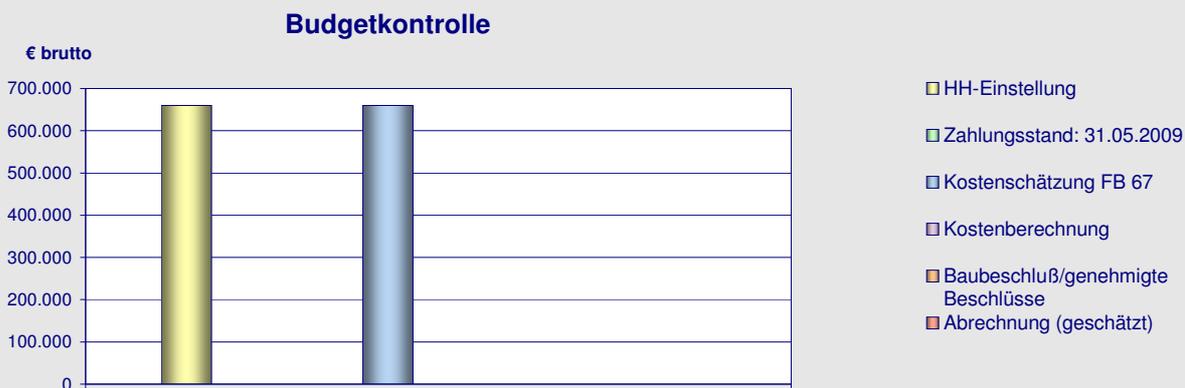

| Phase | TERMINE | | SOLL | | IST | | STATUS |
|----------------------|--|------------|------|------------|-----|-----|--------|
| | von | bis | von | bis | von | bis | |
| Grundlagenermittlung | | | | | | | |
| Planung | | | | | | | |
| Ausführung | | | | | | | |
| Meilenstein | | bis | | bis | | | |
| Ausschreibung | | | | | | | |
| Vergabebeschuß | | | | | | | |
| Baubeginn | | | | | | | |
| Fertigstellung | | | | | | | |
| Hinweise: | - Ansatz 2009 ist Haushaltsrest aus 2008 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------------|
| Projekt | Stand: 31.05.2009 | Finanzposition | HHST | 3 | | | |
| Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Ortsmitte | | 2.6153.9610.000-1104 | VH | | | | |
| Projektleiter Fachber. 67: | Herbert Wieland | | Telefon: | 2593 | | | |
| KOSTEN bis einsch. | | | | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Gesamt |
| HH-Einstellung | | | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 1.250.000 |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | | | 0 | | | | 0 |
| Kostenschätzung Wüstenrot vom Juni 2002 (ohne Hochbaumaßnahmen) | | | | | | | 1.465.000 |
| Kostenberechnung vom | | | | | | | |
| Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom | | | | | | | |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | |

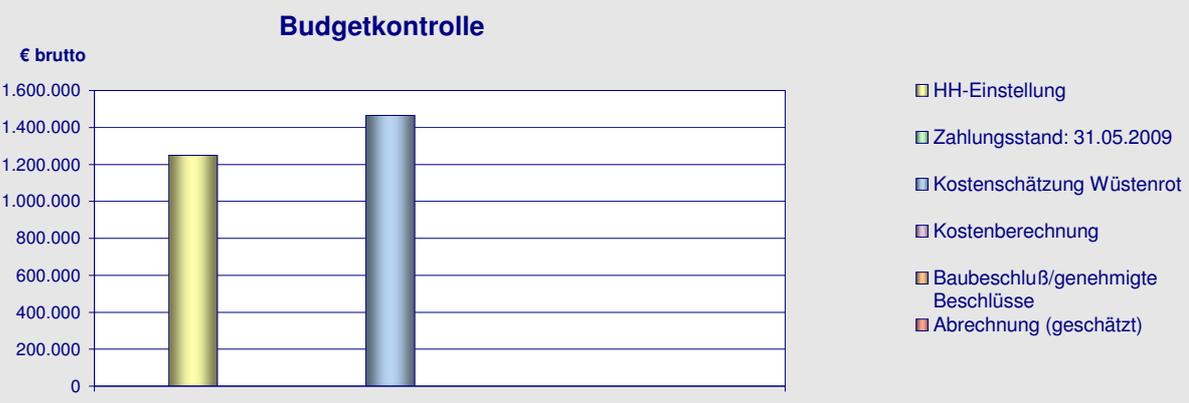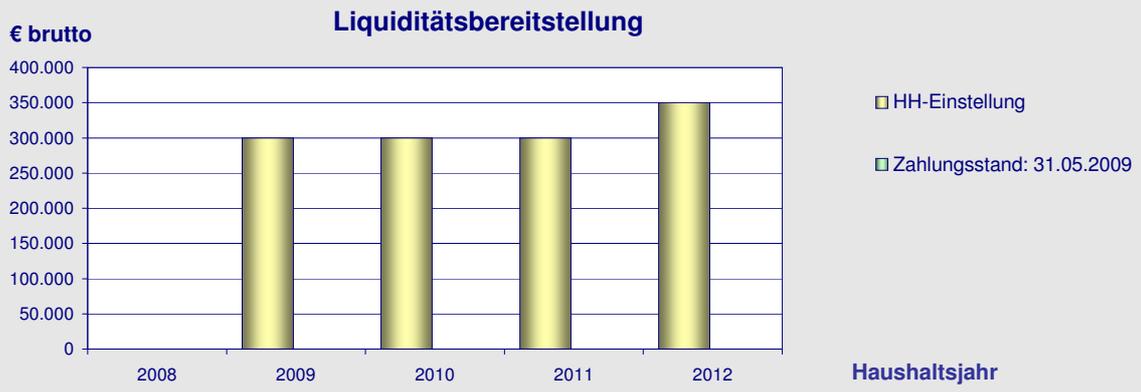


| Phase | TERMINE | | SOLL | | IST | | STATUS |
|----------------------|---------|------------|------|------------|-----|-----|--------|
| | von | bis | von | bis | von | bis | |
| Grundlagenermittlung | | | | | | | |
| Planung | | | | | | | |
| Ausführung | | | | | | | |
| Meilenstein | | bis | | bis | | | |
| Ausschreibung | | | | | | | |
| Vergabebeschuß | | | | | | | |
| Baubeginn | | | | | | | |
| Fertigstellung | | | | | | | |
| Hinweise: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------|------|------|-----------|
| Projekt | Stand: 31.05.2009 | Finanzposition | HHST | 4 | | | |
| Akademiehof Oberflächengestaltung (städt. Anteil) | | 2.6157.9640.000-0112 | VH | | | | |
| Projektleiter Fachber. 67: | Achim Leban | | Telefon: | 2596 | | | |
| | | Anteil PAG: | 650.000 € | | | | |
| | | Anteil Stadt: | 1.550.000 € | | | | |
| | | Gesamt Oberfläche: | 2.200.000 € | | | | |
| KOSTEN | bis einschl. | | | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Gesamt |
| HH-Einstellung (nur Stadtanteil) | | 132.000 | 1.268.000 | 150.000 | | | 1.550.000 |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | | 131.933 | 0 | | | | 131.933 |
| Kostenschätzung | vom 02.10.2007 mit PAG-Anteil | | | | | | 2.200.000 |
| Kostenberechnung | vom 16.04.2008 mit PAG-Anteil | | | | | | 2.211.020 |
| Entwurfsbeschluß BTU 199/08 | vom 28.05.2008 mit PAG-Anteil | | | | | | 2.200.000 |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | |

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

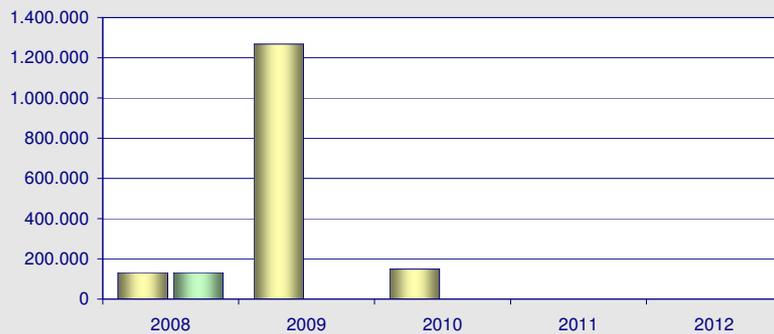


■ HH-Einstellung (nur Stadtanteil)
■ Zahlungsstand: 31.05.2009

Haushaltsjahr

€ brutto

Budgetkontrolle

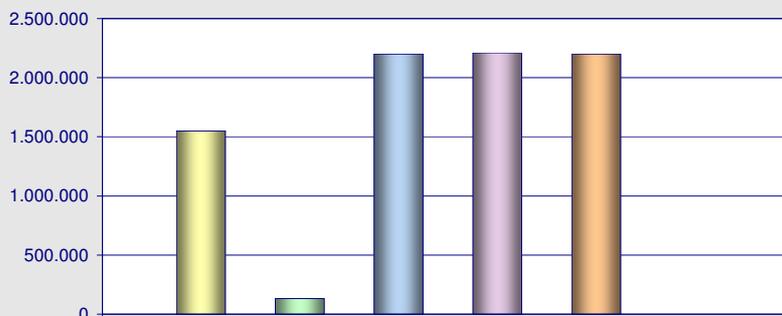

■ HH-Einstellung (nur Stadtanteil)
■ Zahlungsstand: 31.05.2009
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Entwurfsbeschluß BTU 199/08
■ Abrechnung (geschätzt)


TERMINE

| Phase | SOLL | | IST | | STATUS |
|----------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------|
| | von | bis | von | bis | |
| Grundlagenermittlung | | | Juli 2007 | Dez. 2007 | ● |
| Planung | | Nov. 2008 | Jan. 2008 | Nov. 2008 | ● |
| Ausführung | Mai 2009 | Nov. 2009 | | | ● |
| Meilenstein | bis | | bis | | |
| Ausschreibung | Nov/Dez 2008 | Jan. 2009 | Dez. 2008 | Jan. 2009 | ● |
| Vergabebeschuß | Feb. 2009 | März 2009 | | 12.03.2009 | ● |
| Baubeginn | Mai 2009 | Juni 2009 | April 2009 | | ● |
| Fertigstellung | | Nov. 2009 | | | ● |

Hinweise:

- Im Untergrund wurden verschiedene unbekannte Keller und Verfüllungen angetroffen. Für die Bespielung des Akademiehofs durch die ADK sind zusätzlich Aufwendungen erforderlich (ca. 120.000 €).
Im Ansatz 2009 sind 268.000 € HH-Reste aus 2008 enthalten, die im Nachtrag neu beantragt wurden.

| | | | | | | | |
|--|-------------------|---|-------------------------|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Projekt Kaffeeberg Planung und Umgestaltung | Stand: 31.05.2009 | Finanzposition 2.6157.9640.000-0131 | HHST VH | 5 | | | |
| Projektleiter Fachber. 67: Martin Renz | | | Telefon: 2694 | | | | |
| KOSTEN bis einsch. | | | | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Gesamt |
| HH-Einstellung | | 690.000 | 200.000 | | | | 890.000 |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | | 685.617 | 60.351 | | | | 745.968 |
| Kostenschätzung vom | | | | | | | |
| Kostenberechnung vom Nov. 2007 | | | | | | | 850.000 |
| Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 133/08 vom 09.04.2008 | | | | | | | 890.000 |
| Abrechnung (geschätzt) vom 09.04.2008 Gesamtkosten | | | | | | | 890.000 |

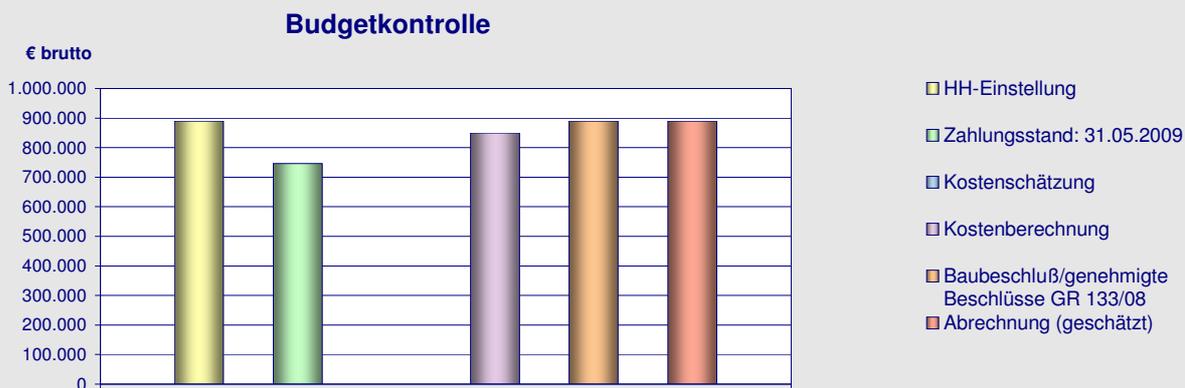


| Phase | TERMINE | | SOLL | | IST | | STATUS |
|----------------------|--|-----------|------------|-----|------------|------------|--------|
| | von | bis | von | bis | von | bis | |
| Grundlagenermittlung | | | | | | | |
| Planung | | | | | | Feb. 2008 | ● |
| Ausführung | April 2008 | Nov. 2008 | | | April 2008 | | ● |
| Meilenstein | | | bis | | bis | | |
| Ausschreibung | | | | | | 29.02.2008 | ● |
| Vergabebeschuß | | | | | | 09.04.2008 | ● |
| Baubeginn | April 2008 | | | | | 16.04.2008 | ● |
| Fertigstellung | | Nov. 2008 | | | | Okt. 2008 | ● |
| Hinweise: | - Ansatz 2009 ist Haushaltsrest aus 2008 | | | | | | |

| KOSTEN | bis einschl. | | | | | | | Gesamt |
|--|--------------|---------|------------------|------|------|------|----------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| HH-Einstellung | | 254.000 | 75.000 | | | | 329.000 | |
| HH-Einstellung Straßenbau | | 226.000 | 75.000 | | | | | |
| HH-Einstellung Alleen | | 28.000 | 0 | | | | | |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | | 253.248 | 45.633 | | | | 298.881 | |
| Straßenbau Stand: 31.05.2009 | | 225.807 | 45.633 | | | | | |
| Alleen Stand: 31.05.2009 | | 27.441 | 0 | | | | | |
| Kostenschätzung | | | vom Aug. 2007 | | | | 460.000 | |
| Kostenberechnung BTU 376/07 | | | vom 15. Nov 2008 | | | | 455.000 | |
| Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse BTU 079/08 | | | vom 13. Mrz 2008 | | | | 415.000 | |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | 415.000 | |

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

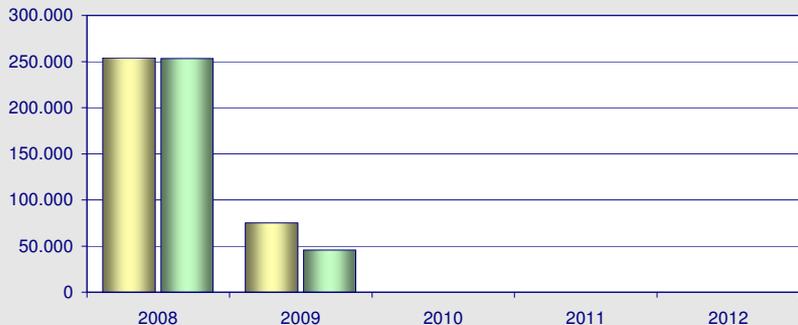


Legend for Liquiditätsbereitstellung:

- HH-Einstellung
- Zahlungsstand: 31.05.2009

Haushaltsjahr

€ brutto

Budgetkontrolle

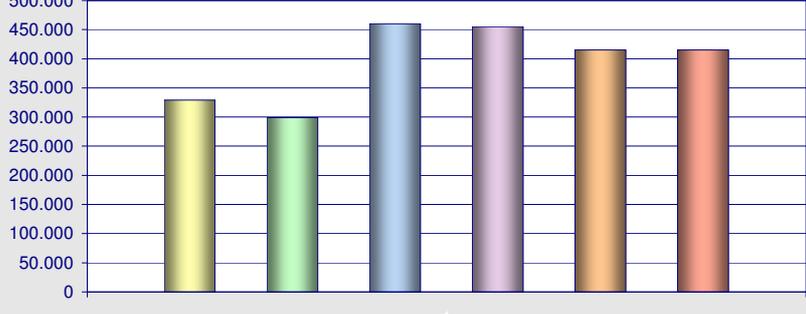

Legend for Budgetkontrolle:

- HH-Einstellung
- Zahlungsstand: 31.05.2009
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung BTU 376/07
- Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse BTU 079/08
- Abrechnung (geschätzt)


| TERMINE | SOLL | | IST | | STATUS |
|---------------------------|-------------|-----------|------------|------------|---------------|
| Phase | von | bis | von | bis | |
| Grundlagenermittlung | | | | | |
| Planung | | | Mai 2007 | Aug. 2007 | ● |
| Ausführung | März 2008 | Nov. 2008 | März 2008 | Nov. 2008 | ● |
| Meilenstein | bis | | bis | | |
| Ausschreibung | | | | | |
| Vergabebeschuß | | | | 13.03.2008 | ● |
| Baubeginn | | | | März 2008 | ● |
| Fertigstellung Straßenbau | | Aug. 2008 | | Aug. 2008 | ● |
| Fertigstellung Alleen | | Nov. 2008 | | Nov. 2008 | ● |

Hinweise: - Ansatz 2009 ist Haushaltsrest aus 2008

| KOSTEN | bis einsch. | | | | | | | Gesamt |
|---|-------------|---------|---------|------|------|------|------------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| HH-Einstellung | 109.000 | 784.000 | 587.000 | | | | 1.480.000 | |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | 109.032 | 783.128 | 371.467 | | | | 1.263.627 | |
| Kostenberechnung vom Juni 2007 | | | | | | | 1.480.000 | |
| Entwurfs/Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 197/07 vom 27.06.2007 | | | | | | | 1.480.000 | |
| Vergabebeschlüsse gesamt | | | | | | | 1.478.000 | |
| Vergabebeschuß Straßenbau BTU 401/07 Sept.2007 | | | | | | | 1.220.000 | |
| sonstige Vergaben (Grünfläche, Straßenbeleuchtung) | | | | | | | 130.000 | |
| Planungskosten BTU 055/03 43.000 € / BTU 182/07 85.000€ | | | | | | | 128.000 | |

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

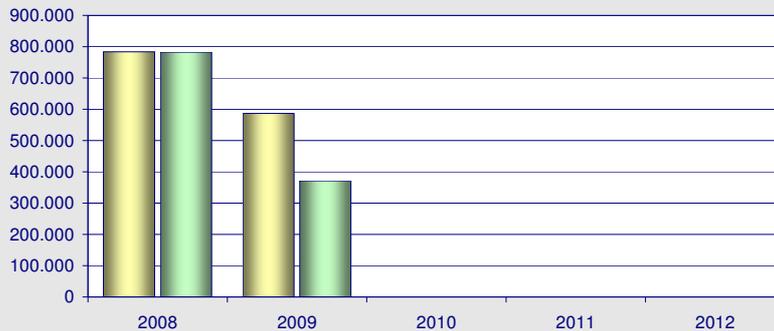


- HH-Einstellung
- Zahlungsstand: 31.05.2009

Haushaltsjahr

Budgetkontrolle

€ brutto

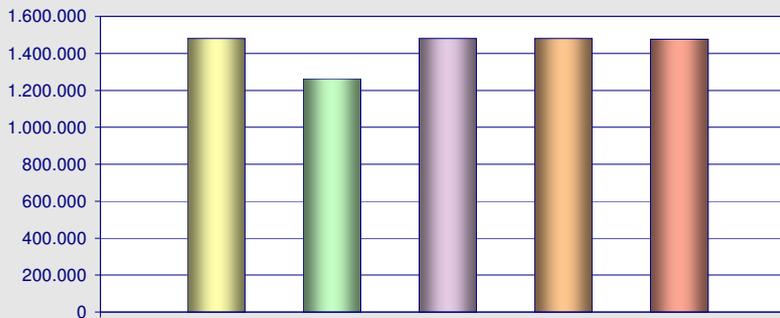

- HH-Einstellung
- Zahlungsstand: 31.05.2009
- Kostenberechnung
- Entwurfs/Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 197/07
- Vergabebeschlüsse gesamt

TERMINE

SOLL

IST

STATUS

| Phase | von | bis | von | bis | STATUS |
|---------------------------|------------|-----------|------------|------------|--------|
| Grundlagenermittlung | | | | | |
| Planung | | | | | |
| Ausführung | Okt. 2007 | Nov. 2008 | Okt. 2007 | Dez. 2008 | ● |
| Meilenstein | bis | | bis | | |
| Ausschreibung | | | | 09.08.2007 | |
| Vergabebeschuß BTU 401/07 | | | | 13.09.2007 | |
| Baubeginn | Okt. 2007 | | | 15.10.2007 | ● |
| Fertigstellung | | Dez. 2008 | | 19.12.2008 | ● |

Hinweise:

- Summe Vergabebeschuß wird voraussichtlich nicht erreicht; Schlußabrechnung liegt ungeprüft mit 1.045.000 € vor
- Ansatz 2009 enthält Haushaltsrest aus 2008 in Höhe von 407.000 €

| | | | | |
|---|-------------------|-----------------------------|-----------|----|
| Projekt | Stand: 31.05.2009 | Finanzposition | HHST | 8a |
| Bauausgaben Bahnsteigunterführung ab HH 2009 | | 2.7920.9610.000-0101 | VH | |

Projektleiter Fachber. 67: **Hansjoachim Heck** Telefon: **2632**

| KOSTEN | bis einsch. | | | | | | | Gesamt |
|--|-------------|---------|---------|------|------|------|------------------|--------|
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| HH-Einstellung | | 487.500 | 812.500 | | | | 1.300.000 | |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | | 468.500 | 0 | | | | 468.500 | |
| Kostenschätzung vom Feb. 2005 ohne MwSt-Erhöhung | | | | | | | 1.185.000 | |
| Kostenberechnung vom Okt. 2005 DB | | | | | | | 1.237.000 | |
| Entwurfsbeschluß vom Feb. 2005 Vorlage Nr. 051/05 | | | | | | | 1.195.000 | |
| Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit DB GR 635/07 vom 20.12.2007 | | | | | | | 1.300.000 | |



| Phase | TERMINE | | SOLL | | IST | | STATUS |
|----------------------|----------|-----------|------|-----|----------|-----------|--------|
| | von | bis | von | bis | von | bis | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Meilenstein | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Ausschreibung Tunnel | Jan 2008 | März 2008 | | | Jan 2008 | März 2008 | ● |
| Rohbau Tunnel | Mai 2008 | Juli 2008 | | | Mai 2008 | Juli 2008 | ● |
| Ausbau Tunnel | Nov 2008 | Sept 2009 | | | | | ● |

Hinweise:

| | | | | | | | |
|---|--|---|-------------------|------|------|------|-----------|
| Projekt Bauausgaben Pflugfelder Straße | Stand: 31.05.2009 ab HH 2009 | Finanzposition 2.7920.9640.000-0101 | HHST VH | 8b | | | |
| Projektleiter Fachber. 67: Hansjoachim Heck | | Telefon: 2632 | | | | | |
| KOSTEN bis einsch. | | | | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Gesamt |
| HH-Einstellung | | 337.800 | 812.200 | | | | 1.150.000 |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | 181.534 | 14.753 | 353.225 | | | | 549.512 |
| Kostenschätzung Büro Baldauf vom Feb. 2005 | | | | | | | 1.215.000 |
| Kostenberechnung Büro ISTW vom 25.03.2008 | | | | | | | 960.000 |
| Entwurfsbeschluß vom Feb. 2005 Vorlage Nr. 051/05 | | | | | | | 1.215.000 |
| Baubeschluß vom 26.11.2008 Vorlage Nr. 529/08 | | | | | | | 990.000 |

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Haushaltsjahr

- HH-Einstellung
- Zahlungsstand: 31.05.2009

Budgetkontrolle

€ brutto

- HH-Einstellung
- Zahlungsstand: 31.05.2009
- Kostenschätzung Büro Baldauf
- Kostenberechnung Büro ISTW
- Entwurfsbeschluß
- Baubeschluß

| Phase | SOLL | | IST | | STATUS |
|---|--------------|-------------|-----------|------------|--------|
| | von | bis | von | bis | |
| Grundlagenermittlung | | | | | |
| Planung Pflugfelderstr. | Jan 2008 | Juli 2008 | | | ● |
| Ausführung Pflugfelderstr. | Okt 2008 | Sept 2009 | Nov 2008 | Sept 2009 | ● |
| Meilenstein | | bis | | bis | |
| Ausschreibung Pflugfelderstr | Juli 2008 | Sept 2008 | Juli 2008 | 18.09.2008 | ● |
| Baubeginn Pflugfelderstr | | Okt 2008 | Feb 2009 | | ● |
| Fertigstellung Pflugfelderstr | | Sept 2009 | | Sept 2009 | ● |
| Bau- und Vergabebeschuß voraussichtlich | BTU 06.11.08 | GR 26.11.08 | | | ● |

| | |
|------------------|--|
| Hinweise: | - Ansatz 2009 enthält Haushaltsrest aus 2008 in Höhe von 312.200 € |
|------------------|--|

| | | | | |
|--|--|-----------------------------|---------------|-------------|
| Projekt | Stand: 31.05.2009 | Finanzposition | HHST | 8c |
| Anteil Hoch-/Tiefbau an Westportal ab HH 2009 | | 2.7920.9620.000-0101 | VH | |
| Projektleiter Fachber. 23: | Olaf Dienelt | Telefon: | 2701 | |
| KOSTEN | bis einsch. | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
| | 2011 | 2012 | Gesamt | |
| HH-Einstellung | | | 1.900.000 | |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | | 119.000 | 340.365 | |
| Kostenschätzung | vom Okt 2007 | | | 1.900.000 |
| Kostenberechnung | vom Okt 2007 | | | 1.900.000 |
| Entwurfsbeschluß | Vorl. Nr. 462/07 vom 18.10.2007 , Vorl. Nr. 074/09 Aufstockung 180.000 € | | | 2.080.000 |
| Liquiditätsbereitstellung | | | | |
| | | | | |
| Budgetkontrolle | | | | |
| | | | | |
| TERMINE | | | | |
| | SOLL | | STATUS | |
| Phase | von | bis | | |
| Planung | Juli 2007 | Dez. 2007 | | ● |
| Ausführung | Jan. 2008 | Okt. 2009 | | ● |
| Meilenstein | bis | | | |
| Option Westausgang | | Juli 2007 | | ● |
| Baugesuch | | Jan. 2008 | | ● |
| Baubeginn | | März 2008 | | ● |
| Fertigstellung | | Okt. 2009 | | ● |
| Hinweise: | - Aufstockung erfolgt über den Nachtragshaushalt 2009 | | | |

| | | | | | | | |
|---|--------------------|---|-------------------|--------------------------|------|------|-----------|
| Projekt Mathildenstraße | Stand: 31.05.2009 | Finanzposition 2.6157.9640.000-0114 | HHST VH | 9 | | | |
| Projektleiter Fachber. 67: | Martin Renz | | Telefon: | 2694 | | | |
| KOSTEN | bis einsch. | | | | | | |
| | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | Gesamt |
| HH-Einstellung (Gesamtkosten für 2009 angemeldet) | | 9.000 | 941.000 | 70.000 | | | 1.020.000 |
| Zahlungsstand: 31.05.2009 | | 8.755 | 279.108 | | | | 287.863 |
| Kostenschätzung | | vom | | | | | |
| Kostenberechnung | | vom 23.04.2008 | | große Lösung bis Seestr. | | | 1.080.000 |
| Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse | | vom | | | | | |
| Abrechnung (geschätzt) | | | | | | | |

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Haushaltsjahr

- HH-Einstellung (Gesamtkosten für 2009 angemeldet)
- Zahlungsstand: 31.05.2009

Budgetkontrolle

€ brutto

- HH-Einstellung (Gesamtkosten für 2009 angemeldet)
- Zahlungsstand: 31.05.2009
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung
- Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
- Abrechnung (geschätzt)

| TERMINE | SOLL | IST | STATUS | | |
|----------------------|------------|------------|------------|-----|---|
| Phase | von | bis | von | bis | |
| Grundlagenermittlung | | | | | |
| Planung | Mai 2008 | Dez. 2008 | | | ● |
| Ausführung | April 2009 | Sep. 2009 | | | ● |
| Meilenstein | bis | | bis | | |
| Ausschreibung | | Feb. 2009 | | | ● |
| Vergabebeschluß | | März 2009 | | | ● |
| Baubeginn | | April 2009 | | | ● |
| Fertigstellung | | Okt. 2009 | | | ● |

| | |
|------------------|--|
| Hinweise: | Im Ansatz 2009 sind 41.000 € HH-Reste aus 2008 enthalten, die im Nachtrag neu beantragt wurden. |
|------------------|--|
