


INKAS (Projekte > 300.000 €)		Stand: 9/2012		FB 65	Rahmenterminplan																																																						
Blatt 1		STATUS		Jahr: 2012	2012												2013												2014												2015																		
Projekt		Kosten	Termine	Finanzposition	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12							
2	Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	●	●	Sonderkonto																																																							
6	Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	●	●	2.2210.9440.000-0103																																																							
7	Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner	●	●	2.2130.9410.000-0112																																																							
8	Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule	●	●	2.2130.9410.000-0101																																																							
9	Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung	●	●	2.2110.9410.000-0103																																																							
15	Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	●	●	2.4641.9440.000-0421																																																							
16	Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	●	●	2.6158.9410.000-1003																																																							
25	Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum	●	●	Finanzierung WBL																																																							
26	Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweiningen	●	●	2.6153.9410.000-1104																																																							
47	Corneliusstraße 36 - Schloßlesfeldschule Anbau	●	●	2.2110.9410.000-0413																																																							
48	Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen	●	●	2.4641.9410.000-0901																																																							
51	Hindenburgstr.29 - Karlskas. Dachsanierung Reith.	●	●	2.3400.9460.000-0403																																																							
52	Hindenburgstr.29 - Karlskas. Techn. Infrastruktur	●	●	2.3400.9440.000-0403																																																							

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2012		Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 65		3.329.700	3.055.000
INKAS - Projekte		10.134.500	7.638.757

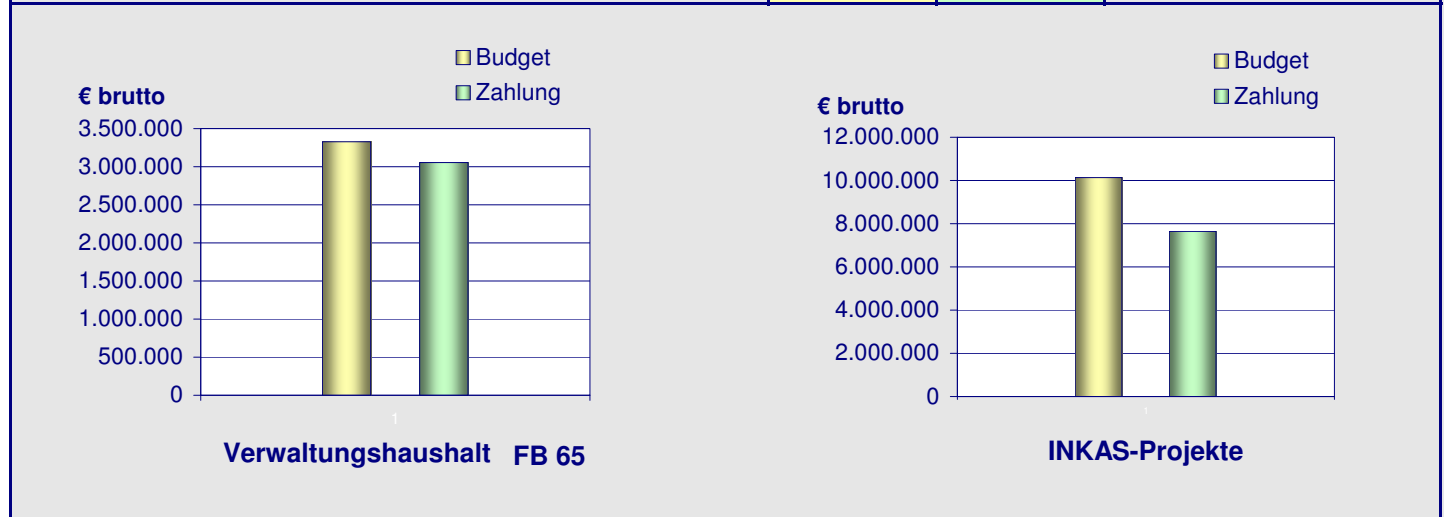

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten

- Günstiger oder nicht teurer
- bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- > 10 %, über 100.000 €

Termine

- entsprechend Rahmenterminplan
- Rahmenterminplan fraglich
- Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 2: gesch. Abrechn.ca. 250.000 € über Beschluss

zu 7: gesch. Abrechn ca. -50.000 € unter Beschluss

zu 8: Verzögerung Baubeginn

zu 15: gesch. Abrechn ca. -47.000 € unter Beschluss

zu 16: + 97.300 € über Beschluss

zu 25: + 95.000 € über Beschluss

zu 47: Verzögerung Baubeginn

zu 48: + 15.000 € über Beschluss
