


Blatt 1		STATUS			Jahr: 2013												2014												2015												2016																
Projekt	Kosten	Termine	Finanzposition	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
6	Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	●	●	2.2210.9440.000-0103																																																					
7	Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner	●	●	2.2130.9410.000-0112																																																					
8	Alleenstr. 17/21 - Gemeinschaftsch. Innenst.	●	●	2.2130.9410.000-0101																																																					
9	Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung	●	●	2.2110.9410.000-0103																																																					
15	Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	●	●	2.4641.9440.000-0421																																																					
16	Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	●	●	2.6158.9410.000-1003																																																					
25	Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum	●	●	Finanzierung WBL																																																					
26	Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweiningen	●	●	2.6153.9410.000-1104																																																					
47	Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau	●	●	2.2110.9410.000-0413																																																					
48	Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen	●	●	2.4641.9410.000-0901																																																					
51	Hindenburgstr.29 - Karlskas. Dachsanierung Reith.	●	●	2.3400.9460.000-0403																																																					
52	Hindenburgstr.29 - Karlskas. Techn. Infrastruktur	●	●	2.3400.9440.000-0403																																																					
77	Erdmannhäuser Str. 7-9 - KiFaZ Poppenweiler	●	●	2.6159.9410.000-1202																																																					

Kostenübersicht Haushaltsjahr	2013	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 65	3.435.000	878.500	
INKAS - Projekte	11.414.000	1.402.775	

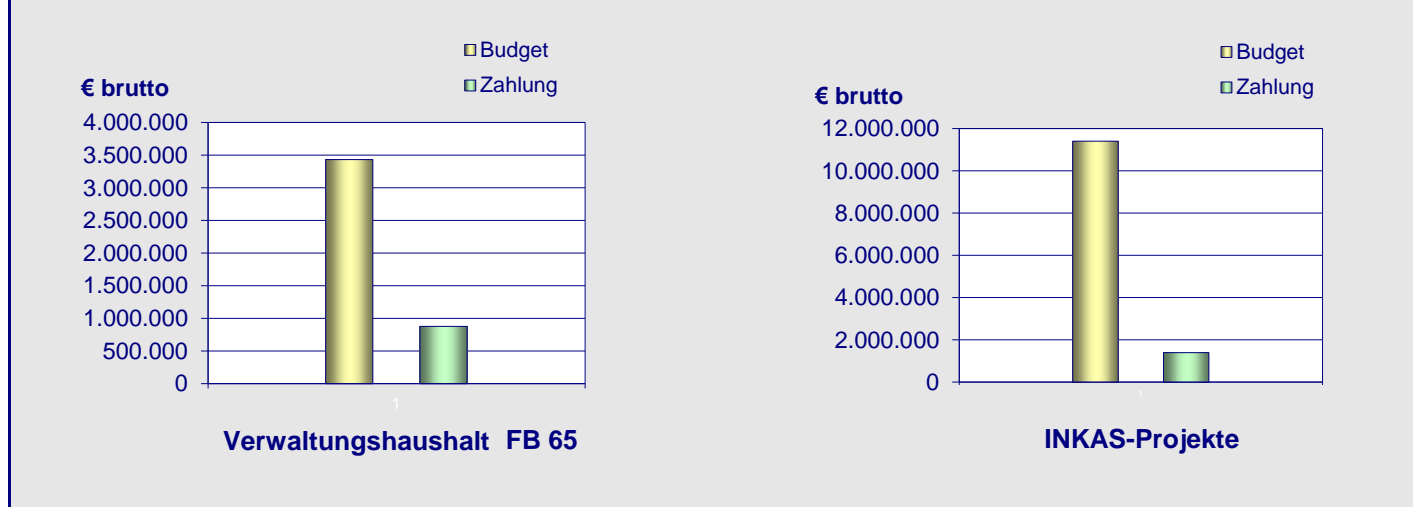

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten

- Günstiger oder nicht teurer
- bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- > 10 %, über 100.000 €

Termine

- entsprechend Rahmenterminplan
- Rahmenterminplan fraglich
- Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 7: gesch. Abrechn ca. - 50.000 € unter Beschluss

zu 8: gesch. Abrechn ca. 1.055.000 € über Beschluss

zu 16: + 113.550 € über Beschluss

zu 25: + 98.000 € über Beschluss

zu 47: enger Terminplan

zu 48: + 7.000 € über Beschluss

zu 77: + 70.000 € über Beschluss
