

STATUS				Jahr: 2013																																															
Projekt	Kosten	Termine		2012												2013												2014												2015											
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	●	●	2.6300.9640.000-0208																																																
2	●	●	2.6110.9552.000-0002																																																
3	●	●	2.6300.9640.000-0110																																																
4	●	●	2.6153.9610.000-1104 2.6153.9640.000-1104																																																
5	●	●	verschiedene HH-Stellen																																																
6	●	●	2.6158.9630.000-1003																																																
7	●	●	2.6151.9640.000-0108																																																
8	●	●	2.6158.9410.670-1003																																																
9	●	●	2.6800.9610.000-0401																																																
10	●	●	2.6300.9640.000-1102																																																
11	●	●	2.5610.9640.000-0005																																																
12	●	●	Sonderkonto																																																
13	●	●	Sonderkonto																																																
14	●	●	Sonderkonto																																																
15	●	●	Sonderkonto																																																

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2013	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 67	10.835.850	1.598.374
INKAS - Projekte - Vermögenshaushalt FB 67	4.744.400	1.033.265


Projektphasen

- Grundlagenermittlung
- Planung
- Ausführung

Anmerkungen zum Rahmenterminplan

zu 1: Leichte Verzögerungen bei den Leitungssanierungen und durch hohe Auslastung der Baufirma

zu 8: Bauverzögerungen beim Hochbau durch Konkurs der Rohbaufirma

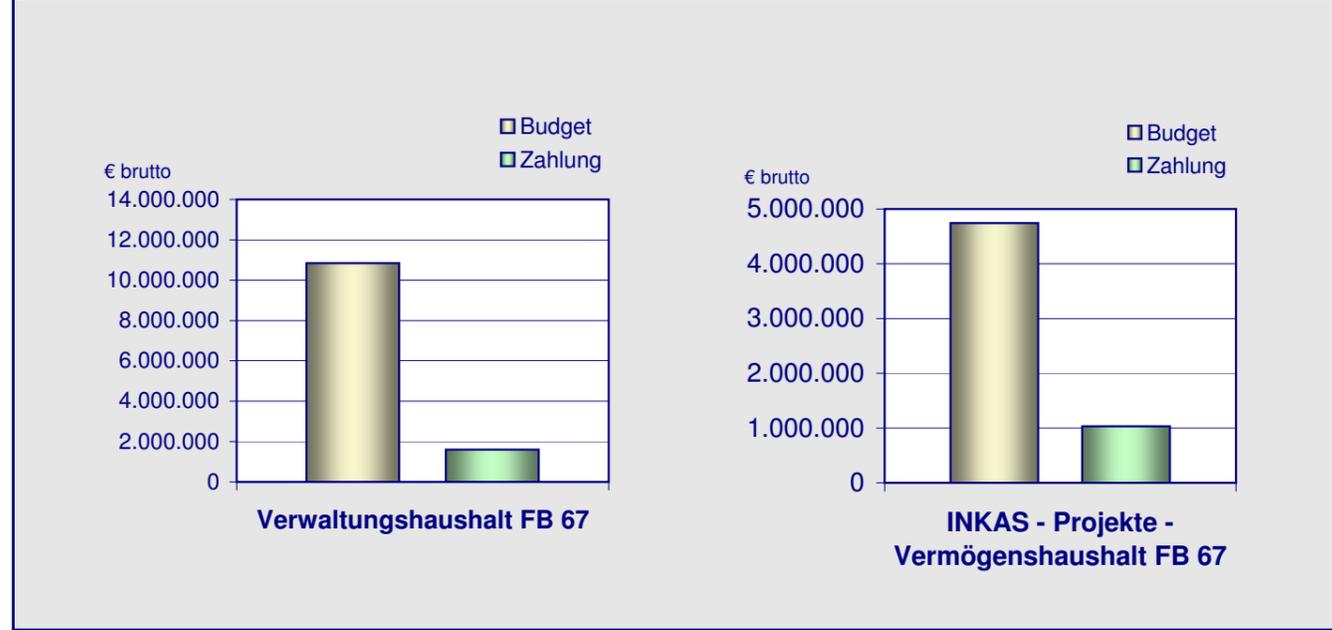

STATUS

Kosten

- Günstiger oder nicht teurer
- bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- > 10 %, über 100.000 €

Termine

- entsprechend Rahmenterminplan
- Rahmentermin fraglich
- Rahmentermin nicht möglich
