

Projekt				Stand: 31.01.2014			Investitionsauftrag		FinHH		2
Zugwiesen				755400009017							
Projektleiter Fachber. 67:				Bernd Wenger, Günter Schlecht						Telefon: 2759	
KOSTEN				bis einschl.							
				2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung Zugwiesen				77.647	298.689	2.409.801	847.630	340.996	250.000	4.224.763	
Zahlungsstand: 31.01.2014				77.647	298.689	2.409.801	847.630	340.996	6.588	3.981.351	
Kostenschätzung				vom	Juni 2009						3.400.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09				vom	22.07.2009						3.400.000
Abrechnung (geschätzt)									●	3.400.000	
Liquiditätsbereitstellung € brutto ■ HH-Einstellung Zugwiesen ■ Zahlungsstand: 31.01.2014 Budgetkontrolle € brutto ■ HH-Einstellung Zugwiesen ■ Zahlungsstand: 31.01.2014 ■ Kostenschätzung ■ Kostenschätzung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09 ■ Abrechnung (geschätzt)											
Erläuterungen - Im Zahlungstand sind Ausgaben für die Aussichtsplattform enthalten, die von Euronatur erstattet werden. - Im Zahlungsstand sind ferner Ausgaben für Kostenteile des WSA enthalten, die mit dem WSA verrechnet werden. - Beginn 2. Bauabschnitt mit Dammbau und Sanierung Neckarufer im April 2013. - Die Beauftragung und Federführung im 2. Bauabschnitt liegt beim WSA. - Fertigstellung 2. BA verschiebt sich durch Einsatz der Wasserbaufirma zur Beseitigung von Hochwasserschäden. - Ausführung von Restarbeiten im März/April 2014.											
TERMINE				SOLL		2. Bauabschnitt				STATUS	
Phase				von	bis	von	bis				
Grundlagenermittlung				1998	1999			●			
Planung				2000	Juni 2010			●			
Ausführung				2011	2012		April 2013	April 2014	●		
Meilenstein											
Ausschreibung				Dez. 2010	März 2011				●		
Vergabebeschluß					Mai 2011				●		
Baubeginn					Juli 2011		April 2013		●		
Fertigstellung 1. BA					Mai 2012		April 2014		●		
Hinweise: HH-Ansatz 2013 enthält 159.000€ HH-Reste aus 2012											

Projekt		Stand: 31.01.2014		Investitionsauftrag			FinHH		3
Alt-Württemberg-Allee		754106704017							
Projektleiter Fachber. 67:		Oskar Fröhwrth			Telefon: 2495				
KOSTEN		bis einschl.							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung			10.807	50.000	500.000	480.000		1.040.807	
Zahlungsstand: 31.01.2014			10.807	0				10.807	
Kostenschätzung			vom siehe HH-Einstellung					1.040.807	
Kostenberechnung			vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom						
Abrechnung (geschätzt)									

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.01.2014 (green)

Budgetkontrolle

€ brutto

Legend: HH-Einstellung (yellow), Zahlungsstand: 31.01.2014 (green), Kostenschätzung (blue), Kostenberechnung (orange), Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse (brown)

Erläuterungen

Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

TERMINE		SOLL					STATUS	
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	Feb. 2014	Mai 2014					●	
Planung	Juni 2014	März 2015					●	
Ausführung	April 2015	April 2016					●	
Meilenstein		bis						
Ausschreibung							●	
Vergabebeschluß							●	
Baubeginn							●	
Fertigstellung							●	
Hinweise:								

Projekt		Stand: 31.01.2014		Investitionsauftrag			FinHH		5
Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße		754106704047							
Projektleiter Fachber. 67:		Jürgen Müller			Telefon:			2435	
KOSTEN		bis einschl.							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung				50.000	500.000	250.000		800.000	
Zahlungsstand: 31.01.2014				0				0	
Kostenschätzung				vom			siehe HH-Einstellung		800.000
Kostenberechnung				vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse				vom					
Abrechnung (geschätzt)									

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2014

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.01.2014
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

TERMINE		SOLL					STATUS	
Phase	von	bis						
Grundlagenermittlung	März 2014	Juli 2014						●
Planung	Aug. 2014	April 2015						●
Ausführung	Mai 2015	Mai 2012						●
Meilenstein		bis						
Ausschreibung								●
Vergabebeschluß								●
Baubeginn								●
Fertigstellung								●
Hinweise:								

Projekt				Stand: 31.01.2014				Investitionsauftrag				FinHH		6			
Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße								754106710017									
Projektleiter Fachber. 67:								Jürgen Müller				Telefon: 2435					
KOSTEN				bis einschl.													
				2010		2011		2012		2013		2014		2015		Gesamt	
HH-Einstellung						10.700		18.811		517.818		150.000				697.329	
Zahlungsstand: 31.01.2014						10.700		18.811		517.818		0				547.329	
Kostenschätzung vom 28.07.2011																530.000	
Kostenberechnung vom 24.05.2012																530.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 07.03.2013																527.000	
Abrechnung (geschätzt)																527.000	

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2014
2010	0	0
2011	10.700	10.700
2012	18.811	18.811
2013	517.818	517.818
2014	150.000	0

€ brutto

Budgetkontrolle

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2014	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse	Abrechnung (geschätzt)
2010	0	0	0	0	0	0
2011	10.700	10.700	0	0	0	0
2012	18.811	18.811	0	0	0	0
2013	517.818	517.818	530.000	530.000	527.000	527.000
2014	150.000	0	0	0	0	0

Erläuterungen

- zusätzlich kommen Kosten zur Sanierung der Aldinger Straße sowie umfangreiche Radwegsanierungsarbeiten

- Kreisverkehrsanlage Anfang Oktober fertiggestellt

TERMINE				SOLL				STATUS					
Phase		von		bis									
Grundlagenermittlung		Jan. 2010		März 2011								●	
Planung		April 2011		Feb. 2013								●	
Ausführung		April 2013		Okt. 2013								●	
Meilenstein				bis									
Ausschreibung		Jan. 2013		Feb. 2013								●	
Bau- und Vergabebeschluss				März 2013								●	
Baubeginn				April 2013								●	
Fertigstellung				Okt. 2013								●	

Hinweise

HH-Ansatz 2013 enthält 150.400 € HH-Reste aus 2012

Erläuterungen

- zusätzlich kommen Kosten zur Sanierung der Aldinger Straße sowie umfangreiche Radwegsanierungsarbeiten
- Kreisverkehrsanlage Anfang Oktober fertiggestellt

Projekt				Stand: 31.01.2014				Investitionsauftrag				FinHH		7					
Eberhardstraße 1. BA + 2. BA								754106701087											
Projektleiter Fachber. 67:								Martin Renz				Telefon: 2694							
KOSTEN				bis einschl.															
				2009		2010		2011		2012		2013		2014		Gesamt			
HH-Einstellung										68.777		667.555		800.000		1.536.332			
Zahlungsstand: 31.01.2014										68.777		667.555		7.708		744.040			
Kostenschätzung																390.000			
Kostenberechnung																390.000 1. BA + 850.000 2. BA		1.240.000	
Baubeschluß																430.000 1. BA + 1.100.000 2. BA		1.530.000	
Abrechnung (geschätzt)										98%		-30.000		●		1.500.000			
€ brutto Liquiditätsbereitstellung € brutto Budgetkontrolle																			
Erläuterungen - Kanalkosten sind nicht in Projektkosten enthalten, Kostentragung durch SEL - Beginn 2. Bauabschnitt September 2013																			
TERMINE				SOLL				2. Bauabschnitt				STATUS							
Phase				von		bis		von		bis									
Grundlagenermittlung						Feb. 2012								●					
Planung				März 2012		Sept. 2012								●					
Ausführung				Okt. 2012		Mai 2013				Sept. 2013		Juni 2014		●					
Meilenstein				bis															
Ausschreibung						Aug. 2012								●					
Vergabebeschluß						Sept. 2012								●					
Baubeginn						Okt. 2012								●					
Fertigstellung						Jun 14								●					
Hinweise:																			

Projekt		Stand: 31.01.2014		Investitionsauftrag		FinHH		8
Synagogenplatz				754106701017				
Projektleiter Fachber. 67:		Bernd Wenger				Telefon:		2759
KOSTEN		bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung		1.942	120.000	120.000			241.942	
Zahlungsstand: 31.01.2014		1.942	0				1.942	
Kostenschätzung		vom Okt. 2013					360.000	
Kostenberechnung		vom						
Entwurfs- und Baubeschluß		vom 06.11.2013					360.000	
Abrechnung (geschätzt)							360.000	

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2014
2012	0	0
2013	0	1.942
2014	120.000	1.942
2015	120.000	0
2016	0	0
2017	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2014	Kostenschätzung	Kostenberechnung	Entwurfs- und Baubeschluß	Abrechnung (geschätzt)
2012	0	0	0	0	0	0
2013	0	1.942	0	0	0	0
2014	241.942	1.942	0	0	0	0
2015	0	0	360.000	0	0	0
2016	0	0	0	360.000	0	0
2017	0	0	0	0	360.000	0
2018	0	0	0	0	0	360.000

Erläuterungen

- Der Baubeginn ist abhängig von der Einwerbung von Sponsorengeldern.
- Entsprechend des Gemeinderatsbeschlusses müssen vor Baubeginn 50% bzw. 60.000 € an Sponsorengelder gesichert sein.
- 120.000 € sollen über Sponsorengelder finanziert werden.

TERMINE		SOLL				STATUS	
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 2013	Juli 2013					●
Planung	Aug. 2013	Juni 2014					●
Ausführung							
Meilenstein							
Ausschreibung							●
Vergabebeschluß							●
Baubeginn							●
Fertigstellung							●

Hinweise:

Projekt		Stand: 31.01.2014		Investitionsauftrag		FinHH		9
Parkierungskonzept Oststadt				754600004007				
Projektleiter Fachber. 67:		Andreas Uhl				Telefon:		2298
KOSTEN		bis einschl.						
	2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt	
HH-Einstellung				9.192	694.103	200.000	903.295	
Zahlungsstand: 31.01.2014				9.192	694.103	5.304	708.599	
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom Juni 2012							1.050.000	
Baubeschluß vom 25.07.12 Vorl.Nr. 227/12							1.050.000	
Abrechnung (geschätzt)							●	1.050.000

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

€ brutto Budgetkontrolle

Erläuterungen

- Schaffung von zusätzlichen Parkplätzen in der Hindenburgstraße wird 2014 umgesetzt.

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	2007	2012					●
Planung	2010	Jan. 2013					●
Ausführung	Feb. 2013	Juni 2013					●
Meilenstein bis							
Ausschreibung		Feb. 2013					●
Vergabebeschluß		März 2013					●
Baubeginn		März 2013					●
Fertigstellung		Juni 2013					●

Hinweise:	
------------------	--

Projekt				Stand: 31.01.2014				Investitionsauftrag				10				
Brücke Radweg Neckarterrasse								754106711017				FinHH				
Projektleiter Fachber. 67:								Martin Mundt				Telefon: 2592				
KOSTEN		bis einschl.														
		2012		2013		2014		2015		2016		2017		Gesamt		
HH-Einstellung		12.944		45.591		180.000		250.000		500.000		0		930.000		
Zahlungsstand: 31.01.2014		12.944		45.591		0								58.535		
Kostenschätzung vom 15.10.2012														1.000.000		
Kostenberechnung vom																
Baubeschluß vom 21.03.2013														1.000.000		
Abrechnung (geschätzt)													●		1.000.000	
Liquiditätsbereitstellung																
€ brutto																
Budgetkontrolle																
€ brutto																
Erläuterungen																
Kostenverteilung:																
- Brücke Radweg Neckarterrasse 930.000,- €																
- Sonderkonto Neckarterrasse 80.000,- €																
- Ausführungszeitraum ist abhängig von der Zusage der Fördermittel durch das RP Stuttgart																
TERMINE				SOLL				STATUS								
Phase		von		bis												
Grundlagenermittlung		März 2011		Juli 2012										●		
Planung		Juli 2012		Aug. 2013										●		
Ausführung																
Meilenstein bis																
Ausschreibung																
Vergabebeschluß																
Baubeginn																
Fertigstellung																
Hinweise:		HH-Ansatz 2013 enthält 47.000€ HH-Reste aus 2012														

Projekt		Stand: 31.01.2014		Investitionsauftrag			FinHH		11		
Schlößlesfeldschule Erweiterung Ganztagesbetr./Mensa - Außenanlagen				721100104217							
Projektleiter Fachber. 67:		Heike Reyser				Telefon:		2748			
KOSTEN		bis einschl.									
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt			
HH-Einstellung			43.827	335.000	40.000			418.827			
Zahlungsstand: 31.01.2014			43.827	0				43.827			
Kostenschätzung		vom 08.08.2012						367.000			
Kostenberechnung		vom 25.06.2013						480.000			
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 25.07.2013, Vorl.Nr. 249/10, 07.11.2013, Vorl.Nr. 361/13						419.000			
Abrechnung (geschätzt)								●	419.000		
Liquiditätsbereitstellung										Budgetkontrolle	
€ brutto										€ brutto	
■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2014										■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2014 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)	
Erläuterungen											
Entwurfs- und Baubeschluss, Vorlage 249/13: Beschlusssumme 480.000,- € (davon Planungshonorar 65.000,- €) Vergabebeschluss, Vorlage 361/13: Beschlusssumme 350.000,- € (zuzüglich Planungshonorar 65.000,- €)											
Baubeginn Außenanlagen aufgrund Verzögerungen beim Hochbau im Februar 2014											
TERMINE										SOLL	STATUS
Phase	von	bis									
Grundlagenermittlung	April 2012	Juli 2012							●		
Planung	August 2012	Okt. 2013							●		
Ausführung	Nov. 2013	August 2014							●		
Meilenstein											
Ausschreibung		Sept. 2013							●		
Vergabebeschluß		Nov. 2013							●		
Baubeginn		Feb. 2013							●		
Fertigstellung		August 2014							●		
Hinweise:											

Projekt		Stand: 31.01.2014		Investitionsauftrag		FinHH		12
Straßenbau Comburgstraße (Nordteil)				754106709017				
Projektleiter Fachber. 67:				Jürgen Müller		Telefon: 2435		
KOSTEN		bis einschl.						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung				150.000	500.000	500.000	350.000	1.500.000
Zahlungsstand: 31.01.2014				0				0
Kostenschätzung		vom siehe HH-Einstellung						1.500.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2014

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.01.2014
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

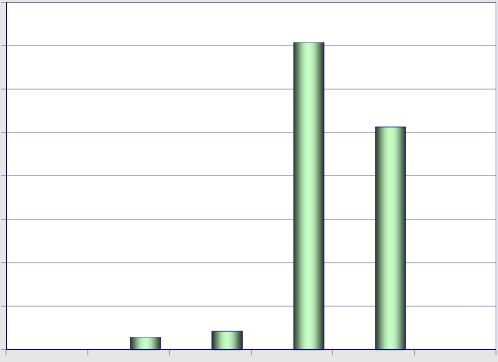
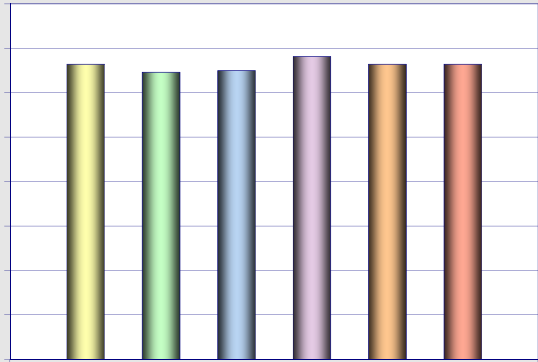
Erläuterungen

- Es handelt sich um den Nordteil der Comburgstraße zwischen Max-Reger-Str. und Walter-Flex-Str.
- Der Baubeginn hängt von der zeitlichen Entwicklung der Aufsiedelung im Baugebiet ab.
- Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
- Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

TERMINE		SOLL				STATUS	
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung		2013					●
Planung	2014	2014					●
Ausführung	2015	2015					●
Meilenstein	bis						
Ausschreibung							
Vergabebeschluß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:	
-----------	--

Projekt				Stand: 31.01.2014				Investitionsauftrag				13	
Straßenbau Walter-Flex-Straße								Sonderkonto				FinHH	
Projektleiter Fachber. 67:								Martin Renz				Telefon: 2694	
KOSTEN		bis einschl.											
		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Gesamt					
HH-Einstellung							150.000	1.405.000					
Zahlungsstand: 31.01.2014				12.600	71.938	1.371.274	0	1.455.812					
Kostenschätzung				vom 08.10.2009			1.230.000						
Kostenberechnung				vom 02.05.2012			1.370.000						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse				vom 20.09.2012			1.405.000						
Abrechnung (geschätzt)				118%			250.000	●		1.655.000			
€ brutto Liquiditätsbereitstellung HH-Einstellung Zahlungsstand: 31.01.2014 € brutto Budgetkontrolle HH-Einstellung Zahlungsstand: 31.01.2014 Kostenschätzung Kostenberechnung Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse Abrechnung (geschätzt)													
Erläuterungen Es sind deutliche Mehrkosten wegen umfangreicher Untergrundverbesserungen und Mehrmengen an belastetem Aushubmaterial zu erwarten.													
TERMINE				SOLL				STATUS					
Phase		von		bis									
Grundlagenermittlung				Feb. 2011						●			
Planung		März 2011		Mai 2012						●			
Ausführung		Okt. 2012		Okt. 2013						●			
Meilenstein				bis									
Ausschreibung													
Vergabebeschluß				Sept. 2012						●			
Baubeginn				Okt. 2012						●			
Fertigstellung				Sept. 2013						●			
Hinweise:													

Projekt				Stand: 31.01.2014				Investitionsauftrag				14				
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA								754106709037				FinHH				
Projektleiter Fachber. 67:								Gabriele Heusel-Voraus				Telefon: 2073				
KOSTEN		bis einschl.														
		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Gesamt		
HH-Einstellung														1.330.000		
Zahlungsstand: 31.01.2014				28.745		43.118		708.466		513.656		0		1.293.985		
Kostenschätzung vom 09.06.2010 (Planstatt Senner)														1.300.789		
Kostenberechnung vom 03.03.2011 (Planstatt Senner)														1.363.817		
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom 26.10.11 V.Nr. 395/11, Vergabeb. 26.04.12, V.Nr. 120/12														1.330.000		
Abrechnung (geschätzt)													●		1.330.000	
Liquidity provision																
€ brutto																
																
■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2014																
Budget control																
€ brutto																
																
■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2014 ■ Kostenschätzung ■ Kostenberechnung ■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse ■ Abrechnung (geschätzt)																
Erläuterungen																
Die privaten Bauarbeiten an den beiden Gebäuden (Torhäusern) der Fa. Pflugfelder haben sich verzögert. Aus diesem Grund erfolgt die Aufbringung des Possehl-Belags in Randbereichen der Torhäuser im Frühjahr 2014.																
TERMINES																
SOLL																
STATUS																
Phase		von		bis												
Grundlagenermittlung		Jan. 10		Dez. 10										●		
Planung		Jan. 11		Apr. 12										●		
Ausführung		Mai. 12		Okt. 12										●		
Meilenstein																
				bis												
Ausschreibung				Febr. 12												
Vergabebeschluß				April 12										●		
Baubeginn				Mai 12										●		
Fertigstellung				Okt. 13										●		
Hinweise:																

Projekt		Stand: 31.01.2014		Investitionsauftrag			FinHH		15
Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA				754106709037					
Projektleiter Fachber. 67:				Gabriele Heusel-Voraus			Telefon:		2073
KOSTEN		bis einschl.							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung				1.200.000				1.200.000	
Zahlungsstand: 31.01.2014				683				683	
Kostenschätzung				vom Jan. 2014 (Planstatt Senner)				1.000.000	
Kostenberechnung				vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse				vom 26.10.2011 V.Nr. 395/11					
Abrechnung (geschätzt)							●		

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Legend: HH-Einstellung (yellow bar)

€ brutto Budgetkontrolle

Legend: HH-Einstellung (yellow bar), Zahlungsstand: 31.01.2014 (blue bar)

Erläuterungen

Die Haushaltseinstellungen Hartenecker Höhe in Höhe von 1.700.000 € beinhalten außer dem Bauabschnitt II der Cäsar-von-Hofacker-Anlage, Restarbeiten BA I, Fußwege, Gehwege und Spielplatz im Wohngebiet Hartenecker Höhe.

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Jan. 10	Dez. 10					●
Planung	Jul. 13	Jan. 14					●
Ausführung	Mai. 14	Dez. 14					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Febr. 14					
Vergabebeschluß		Apr. 14					●
Baubeginn		Mai 14					●
Fertigstellung		Dez. 14					●

Hinweise:	
-----------	--

Projekt		Stand: 31.01.2014		Investitionsauftrag		FinHH		16
Gemeinschaftsschule Innenstadt - Außenanlagen				721100201017				
Projektleiter Fachber. 67:		Michael Habermann				Telefon:		2162
KOSTEN		bis einschl.						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung				50.000	320.000			370.000
Zahlungsstand: 31.01.2014				0				0
Kostenschätzung vom								
Kostenberechnung vom 12.09.2013								370.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom								
Abrechnung (geschätzt)							●	

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

Jahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 31.01.2014
2012	0	0
2013	0	0
2014	50.000	0
2015	320.000	0
2016	0	0
2017	0	0

€ brutto Budgetkontrolle

Kategorie	Wert
HH-Einstellung	370.000
Zahlungsstand: 31.01.2014	370.000

- HH-Einstellung
- Zahlungsstand: 31.01.2014
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung
- Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
- Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

TERMINE

SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung						●
Planung	Juni 2013	Feb. 2015				●
Ausführung	März 2015	Aug. 2015				●
Meilenstein		bis				
Ausschreibung		Dez. 2014				
Vergabebeschuß		Jan. 2015				●
Baubeginn		März 2015				●
Fertigstellung		Aug. 2015				●

Hinweise:

Ausführung in Abhängigkeit von Hochbau

Projekt		Stand: 31.01.2014		Investitionsauftrag		FinHH		17
Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen				755100001027				
Projektleiter Fachber. 67:		Michael Habermann				Telefon:		2162
KOSTEN		bis einschl.						
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung			40.000	300.000			340.000	
Zahlungsstand: 31.01.2014			0				0	
Kostenschätzung			vom			siehe HH-Einstellung		340.000
Kostenberechnung			vom					
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom					
Abrechnung (geschätzt)						●		

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2014

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.01.2014
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Okt. 2013					●
Planung	Nov. 2013	Frühjahr 2015					●
Ausführung	Sommer/Herbst 2015						●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung	Frühjahr 2015						●
Vergabebeschluß	Frühjahr 2015						●
Baubeginn	Sommer 2015						●
Fertigstellung	Ende 2015						●

Hinweise:	Ausführung in Abhängigkeit von Hochbau
-----------	--

Projekt		Stand: 31.01.2014		Investitionsauftrag			FinHH		18
Erweiterung Kita Reichertshalde - Außenanlagen				736501108017					
Projektleiter Fachber. 67:				Michael Habermann				Telefon: 2162	
KOSTEN		bis einschl.							
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt	
HH-Einstellung			10.000	50.000	290.000			350.000	
Zahlungsstand: 31.01.2014			5.700	0				5.700	
Kostenschätzung			vom siehe HH-Einstellung				350.000		
Kostenberechnung			vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse			vom						
Abrechnung (geschätzt)							●		

€ brutto Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2014

€ brutto Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.01.2014
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

TERMINE		SOLL					STATUS
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Juli 2013	Sept. 2013					●
Planung	Okt. 2013	Nov. 2014					●
Ausführung	Dez. 2014	Mai 2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung		Okt. 2014					●
Vergabebeschluß		Nov. 2014					●
Baubeginn		Dez. 2014					●
Fertigstellung		Mai 2015					●

Hinweise:	Ausführung in Abhängigkeit von Hochbau
------------------	--

Projekt		Stand: 31.01.2014		Investitionsauftrag		FinHH		19
KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen				736501112017				
Projektleiter Fachber. 67:		Horst Grieshaber				Telefon:		2747
KOSTEN		bis einschl.						
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Gesamt
HH-Einstellung				340.000	250.000	50.000		640.000
Zahlungsstand: 31.01.2014				0				0
Kostenschätzung		vom siehe HH-Einstellung						640.000
Kostenberechnung		vom						
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom						
Abrechnung (geschätzt)								

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

■ HH-Einstellung ■ Zahlungsstand: 31.01.2014

€ brutto

Budgetkontrolle

■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 31.01.2014
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

Erläuterungen

Die Kostenschätzung wird im Zuge der Entwurfsplanung durchgeführt.
Die derzeitige Grobkostenschätzung ist der Haushaltsansatz.

TERMINE		SOLL				STATUS	
Phase	von	bis					
Grundlagenermittlung	Aug. 2013	Okt. 2013					●
Planung	Nov. 2013	Aug. 2014					●
Ausführung	Sept. 2014	März 2015					●
Meilenstein		bis					
Ausschreibung							●
Vergabebeschluß							●
Baubeginn							●
Fertigstellung							●
Hinweise:							
