
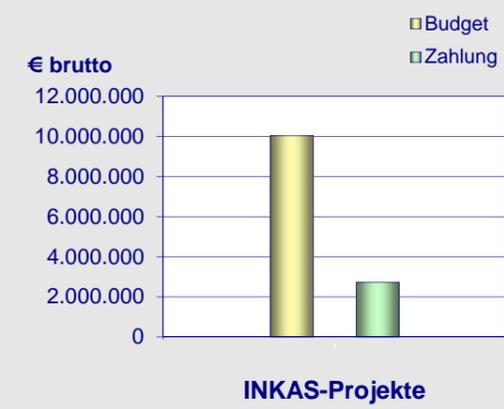


INKAS (Projekte > 300.000 €)		Stand: 5/2014		FB 65	Rahmenterminplan																																																
Blatt 1		STATUS		Jahr: 2014	2014												2015												2016												2017												
Projekt	Kosten	Termine	Auftrag		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	GS Gemeindsch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21)	●	●	721100201017	[Gantt bars]												[Gantt bars]																																				
9	NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	●	●	721100101017	[Gantt bars]												[Gantt bars]																																				
13	Sanierung Glasdach Mörike-Gymn. (Karl-18)	●	●	721100601227	[Gantt bars]												[Gantt bars]																																				
17	San. Sanitärbereiche Rundsporth. (Kurfürsten-23)	●	●	742410002017	[Gantt bars]												[Gantt bars]																																				
47	Anbau Schlößlesfeldschule (Cornelius-36)	●	●	721100104217	[Gantt bars]												[Gantt bars]																																				
49	Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	●	●	721100601417	[Gantt bars]												[Gantt bars]												[Gantt bars]												[Gantt bars]												
65	Integrierte Leitstelle Kreis LB (Marien- 22)	●	●	712600001017																																																	
68	KUZ- Umbau Museumsräume (Wilhelm-9/1)	●	●	756100501007	[Gantt bars]												[Gantt bars]																																				
71	Erweiterung KiGa (Reichertshalde 51)	●	●	736501108017	[Gantt bars]												[Gantt bars]																																				
77	NB KiFaZ Poppenweiler (Erdmannhäuser-7-9)	●	●	736501112017	[Gantt bars]												[Gantt bars]																																				
Kostenübersicht Haushaltsjahr 2014				Budget	Zahlung																																																
Ergebnishaushalt FB 65				6.748.000	2.014.211																																																
INKAS - Projekte				10.034.500	2.732.653																																																

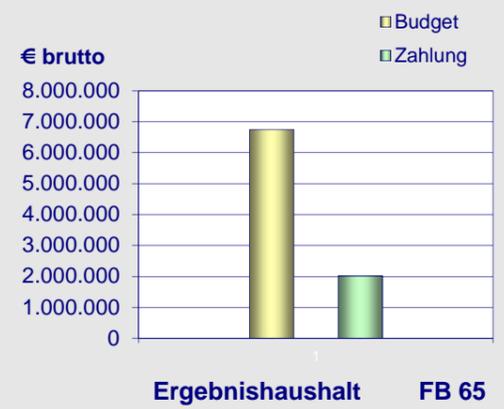

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

- Kosten**
- Günstiger oder nicht teurer
 - bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
 - > 10 %, über 100.000 €

Anmerkungen zu den Projekten

zu 8: gesch. Abrechn ca. 1.055.000 € über Beschluss

zu 9: Verzögerung wg. Problematik Baugrube

zu 77: + 30.000 € über Beschluss

- Termine**
- entsprechend Rahmenterminplan
 - Rahmenterminplan fraglich
 - Rahmenterminplan nicht möglich
