

Projekt		STATUS		Jahr: 2015	2013												2014												2015												2016																							
		Kosten	Termine		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12												
1	Umfeld Marstall-Center	●	●	754106701077 / 754106701127	Nord												Nord																																															
2	Alt-Württemberg-Allee	●	●	754106704017													Süd												Süd																																			
3	Kreisverkehr Aldinger / Danziger Straße	●	●	754106704047													Süd												Süd																																			
4	Synagogenplatz	●	●	754106701017	Süd												Süd																																															
5	Brücke Radweg Neckarterrasse	●	●	754106711017	Süd												Süd																																															
6	Straßenbau Comburgstraße	●	●	754106709017	Süd												Süd												Süd												Süd																							
7	Resterschließung Hartenecker Höhe	●	●	754106709037 Anlage:40000379, 40000381 40000382																									Süd																																			
8	Cäsar-von-Hofacker-Anlage 2. BA	●	●	754106709037 Anlage:40000380	Süd												Süd																																															
9	Gemeinschaftsschule Innenstadt - Außenanlagen	●	●	721100201017 Anlage: 40000130	Süd												Süd												Süd																																			
10	Schul-Vereinsbad - Grün- und Freiflächen	●	●	755100001027 Anlage:40000396	Süd												Süd												Süd												Süd																							
11	Erweiterung Kita Reichertshalde - Außenanlagen	●	●	736501108017 Anlage:40000068	Süd												Süd												Süd												Süd																							
12	KiFaZ Poppenweiler - Außenanlagen	●	●	736501112017 Anlage:40000156	Süd												Süd												Süd												Süd																							
13	Ausbau dynamische Fahrgastinformationsanlagen (DFI)	●	●	754700000007	Süd												Süd												Süd												Süd																							
14	Sanierung und Neugestaltung Asperger Straße	●	●	754106701167																									Süd												Süd																							


Kostenübersicht Haushaltsjahr 2015		Budget	Zahlung
Ergebnishaushalt FB 67		15.253.050	3.593.628
INKAS - Projekte - Finanzhaushalt FB 67		7.525.000	648.138

Projektphasen

- Grundlagenermittlung
- Planung
- Ausführung

Anmerkungen zum Rahmenterminplan

zu 12.) Durch Änderungen bei den Außenanlagen und beim Parkplatz verschiebt sich der ursprüngliche Ausführungstermin

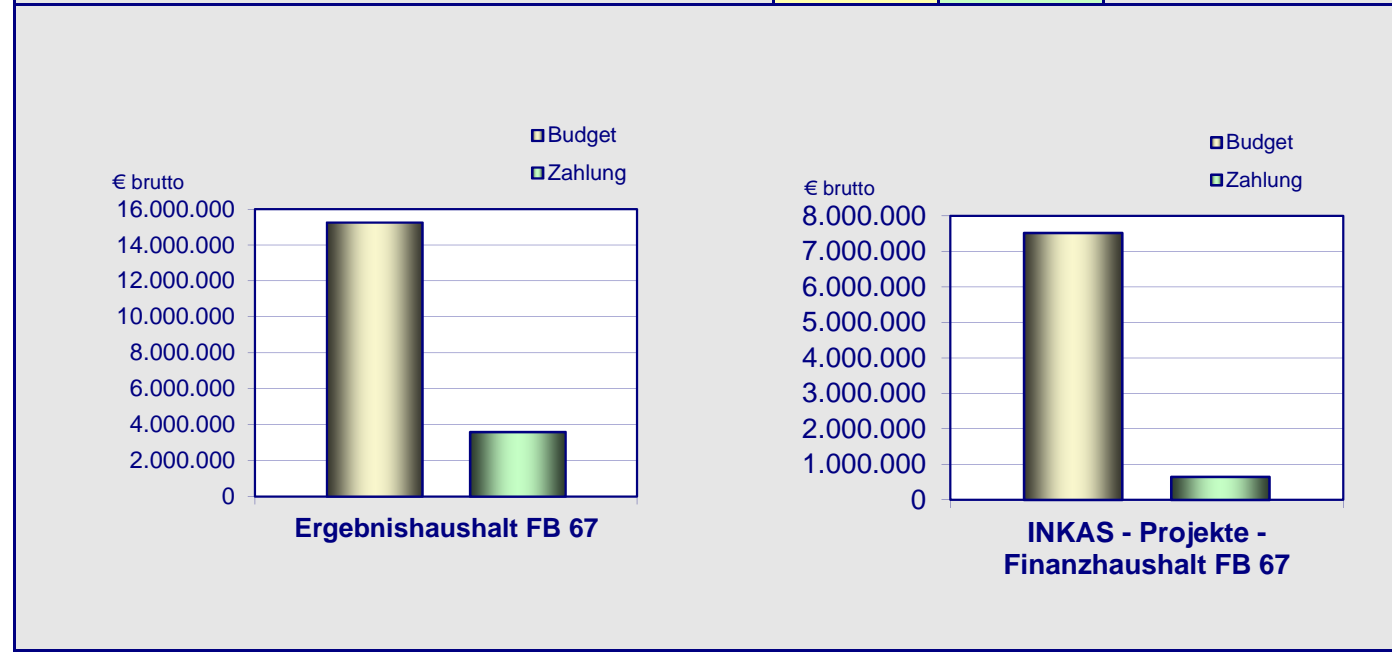

STATUS

Kosten

- Günstiger oder nicht teurer
- bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- > 10 %, über 100.000 €

Termine

- entsprechend Rahmenterminplan
- Rahmentermin fraglich
- Rahmentermin nicht möglich
