


Projektleiter Fachber. 65: <b>Schuhmacher</b>							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020		und ff.
KOSTEN	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	3.862.000	3.200.000	1.593.000				<b>8.655.000</b>
Zahlungsstand	4.082.975	1.551.880					<b>5.634.855</b>
Kostenschätzung vom 16. Aug 11							<b>6.500.000</b>
Kostenberechnung vom 31. Mai 12							<b>7.610.800</b>
Genehmigter Beschluss vom 21. Jul 10 27. Jun 12 25. Jul 12							<b>7.600.000</b>
Abrechnung geschätzt					119%	●	<b>9.050.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

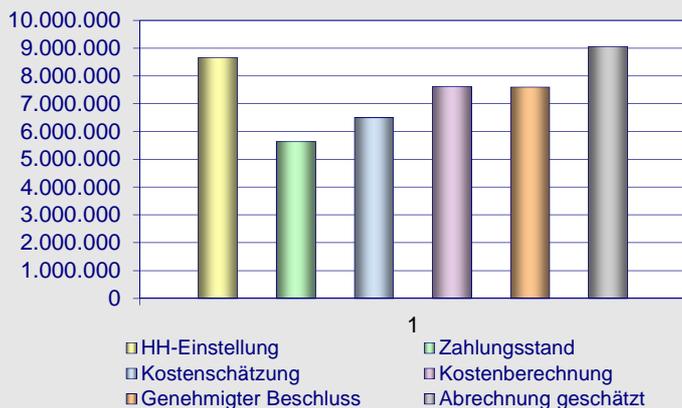

**Erläuterungen**

Das Gebäude ist am 14.09.2015 in Betrieb gegangen. Die zusätzlich benötigten Finanzmittel in Höhe von 395.000 € sind auf Nutzerwünsche zurückzuführen.

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	6 / 2011	7 / 2013			erledigt	●
Ausführung	8 / 2013	7 / 2015			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		2 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		9 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2015			erledigt	●

**Hinweise:**


Projekt	Stand	9/2015	Auftrag	9
NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)			721100101017	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Block</b>							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020 und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	1.479.000	1.381.000	1.000.000				3.860.000
Zahlungsstand	1.743.819	470.904					2.214.723
Kostenschätzung vom 11. Mrz 12							3.700.000
Kostenberechnung vom 30. Aug 12							3.860.000
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11 10. Okt 12 23. Jul 13							3.860.000
Abrechnung geschätzt 103% 120.000							3.980.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

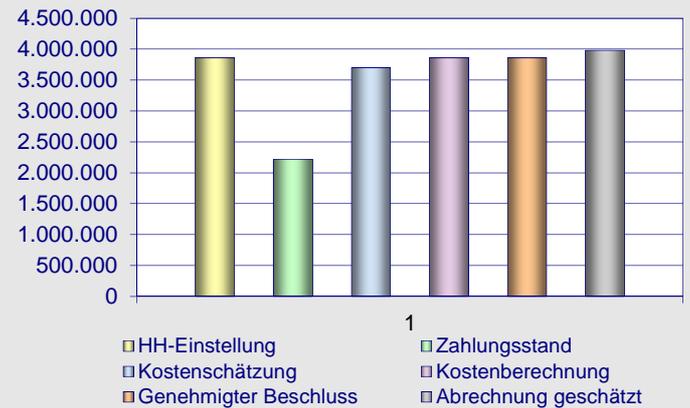

### Erläuterungen

Am 23.07.2013 erfolgte der Baubeschluss mit Kosten in Höhe von 3.860.000€ durch den Gemeinderat (Vorl. Nr. 239/13)

Bedingt durch den sehr schlechten Baugrund kam es bei den Bohrungen für die Gründungspfähle und die Verspannanker des Verbaus zu Setzungen an den Nachbargebäuden. Die Schadenersatzansprüche der Nachbar befinden sich im Klärungsprozess.

Der Neubau mit Mensa und Bewegungsraum ist zum Schuljahresbeginn am 14.09.2015 in Betrieb gegangen.

Die Außenanlagen einschließlich Sanierung des Schulhof wurden in den Sommerferien größtenteils fertig gestellt. Die Restarbeiten werden in den Herbstferien ausgeführt.

Die Einweihung ist für den 21. Oktober 2015 geplant.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	9 / 2013			erledigt	●
Ausführung	10 / 2013	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●


### Hinweise:

Die Maßnahmen für die Baugrubenproblematik (Sanierung Nachbargebäude, Rechtsstreit usw.) können kostenmäßig derzeit nicht beziffert werden. Diese werden nachgereicht.

Projekt	Stand	9/2015	Auftrag	10
GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)			721100112017	

Projektleiter Fachber. 65: **Pfletschinger**

<b>KOSTEN</b>	bis einsch.		1*: Gesamtkosten einsch. Jahr		2020		und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
HH-Einstellung	20.000	630.000	1.000.000	150.000			1.800.000	
Zahlungsstand	7.065	13.345					20.410	
Kostenschätzung			vom 6. Nov 14			1.800.000		
Kostenberechnung			vom 20. Nov 14			1.800.000		
Genehmigter Beschluss			vom 18. Jul 12		11. Dez 13	11. Dez 14	1.800.000	
Abrechnung geschätzt				100%		●		1.800.000

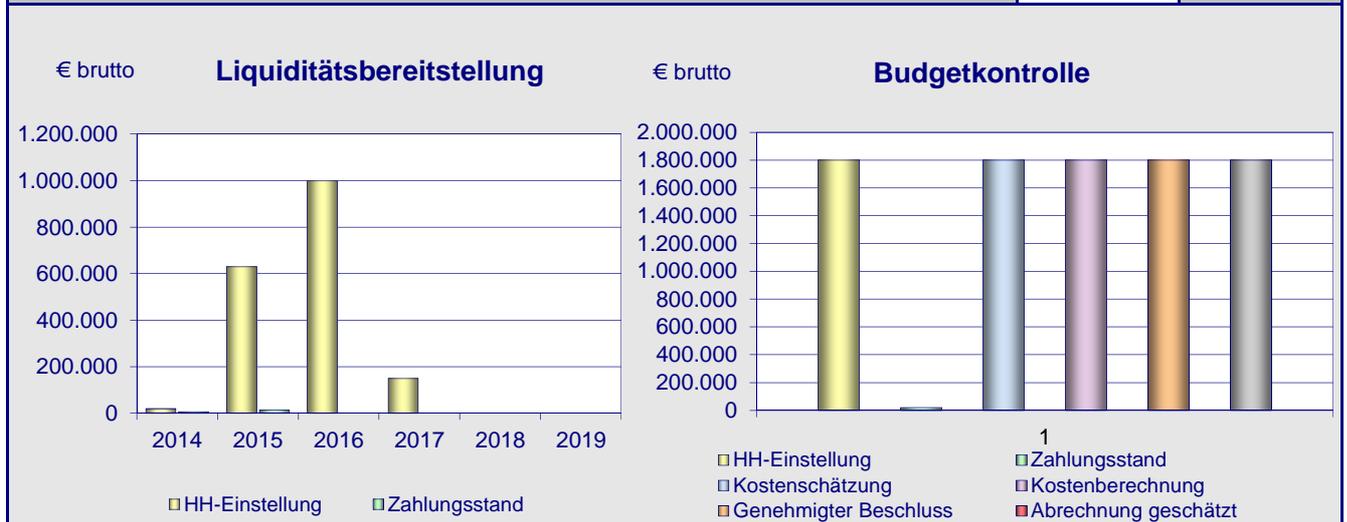

**Erläuterungen**

In der Sitzung des Gemeinderates am 11.12.2014 wurde die Sanierung und Umnutzung des alten Schulhauses beschlossen.  
 Es ist eine Nutzung durch die Lembergschule vorgesehen.  
 Im Erdgeschoss wird die Mensa der Schule untergebracht. In den Obergeschossen befinden sich Räume für die Ganztagesbetreuung und den Unterricht.  
 Nach dem Auszug von Kindergarten und DRK erfolgen derzeit Voruntersuchungen im Bestand für die weitere Planung.  
 Die Ausschreibungen und die Vergaben der Hauptgewerke erfolgen im 4. Quartal diesen Jahres.  
  
 Die Inbetriebnahme des Gebäudes ist Anfang 2017 vorgesehen.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	-			erledigt	●
Planung	9 / 2014	11 / 2015			im Plan	●
Ausführung	12 / 2015	3 / 2017			unkritisch	●
<b>Meilenstein</b>	<b>bis</b>					
Raumprogramm		-			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		12 / 2015			unkritisch	●
Fertigstellung		3 / 2017			unkritisch	●

**Hinweise:**


Projekt	Stand	9/2015	Auftrag	12
San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)			721100601217	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Schreiber</b>							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020 und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung		400.000					400.000
Zahlungsstand	39.308	35.408					74.716
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 15. Okt 13							
Genehmigter Beschluss vom 25. Sep 14							
Abrechnung geschätzt 105% 20.000 ●							
							420.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

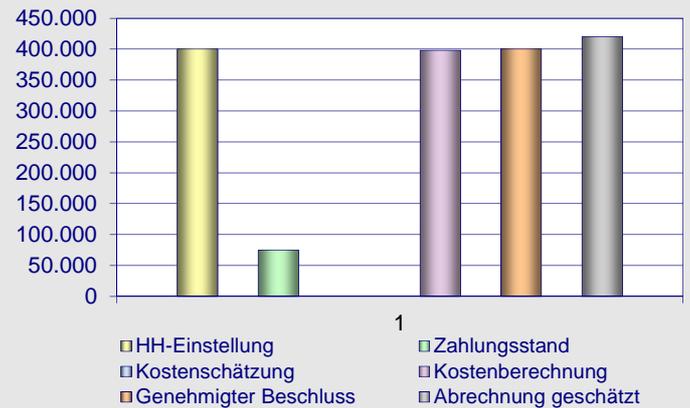

**Erläuterungen**

Rohbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Fachklassenausstattung ist beauftragt. Für die zusätzliche Ausstattung der Fachklassen waren statische Verstärkungen der Decke notwendig

Die Brandschutztechnische Ertüchtigung der Decken ist abgeschlossen. die Ausbuarbeiten für den 1. Fachklassenraum erfolgt im Betrieb bzw. In den Herbstferien 2015.

Der 2. Fachklassenraum wird in 2016 errichtet.

**TERMINE**



**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	6 / 2013	7 / 2013			erledigt	●
Planung	8 / 2013	6 / 2014			erledigt	●
Ausführung	7 / 2014	9 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		7 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2016			unkritisch	●

Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020	und ff.	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	565.000	110.000					<b>675.000</b>
Zahlungsstand	640.777	33.034					<b>673.812</b>
Kostenschätzung		vom 1. Feb 12					<b>630.000</b>
Kostenberechnung		vom 5. Mrz 14					<b>675.000</b>
Genehmigter Beschluss		vom 20. Mrz 14					<b>675.000</b>
Abrechnung geschätzt		100%			-1.000	●	<b>674.000</b>

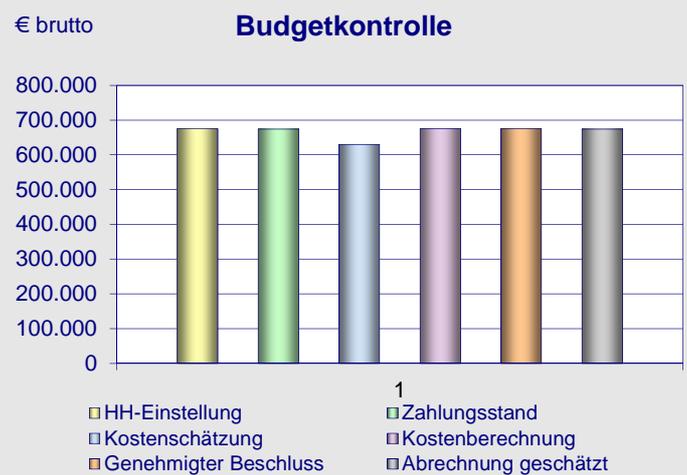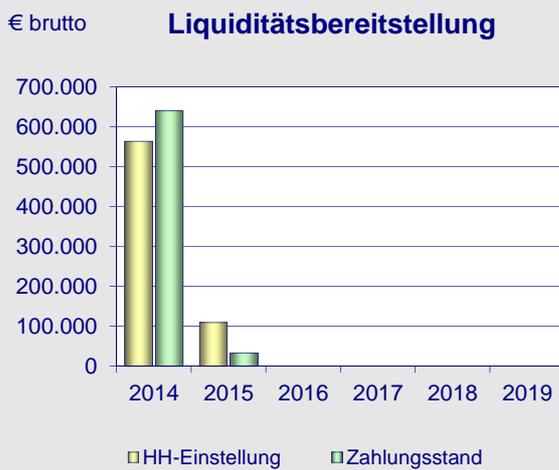

**Erläuterungen**

Baumaßnahme ist fertiggestellt.  
Mängelbeseitigung ist durchgeführt.


Inbetriebnahme der sanierten Umkleide- und Sanitärbereiche erfolgte zum Schuljahresbeginn 2014/2015.  
Das Projekt ist im Bereich Hochbau und Technik schlußgerechnet,

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2013	12 / 2013			erledigt	●
Planung	1 / 2014	5 / 2014			erledigt	●
Ausführung	6 / 2014	9 / 2014			erledigt	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		12 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2014			erledigt	●

**Hinweise:**

Projekt NB Obdachlosenunterkunft (Riedle 25)	Stand <b>9/2015</b>	Auftrag <b>731403202007</b>	20
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020 und ff.		
<b>KOSTEN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung		742.000					742.000
Zahlungsstand		435.959					435.959
Kostenschätzung		vom 19. Aug 14					742.000
Kostenberechnung		vom 19. Aug 14					742.000
Genehmigter Beschluss		vom 8. Okt 14		26. Mrz 15			742.000
Abrechnung geschätzt		100%				●	742.000

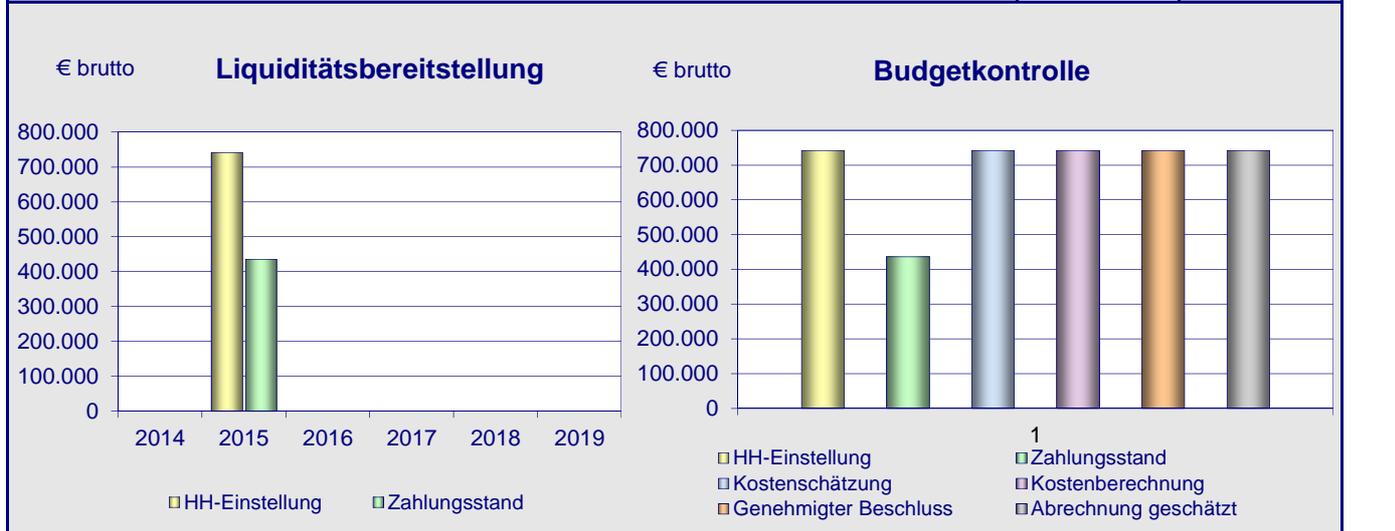


**Erläuterungen**

- Vergabebeschluss erfolgte am 26.03.2015, Vorlage 090/15.
- Bauantrag eingereicht am 20.04.2015.
- Baubeginn erfolgte am 25.06.2015
- Fertigstellung geplant 30.09.2015.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2014	12 / 2014			erledigt	●
Planung	12 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	7 / 2015	9 / 2015			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		12 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		4 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			im Plan	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt	Stand	9/2015	Auftrag	22
Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25)			721100601427	

Projektleiter Fachber. 65: <b>Joas</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020 und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung		800.000	375.000				1.175.000
Zahlungsstand	14.405	596.736					611.141
Kostenschätzung vom 7. Aug 14							1.175.000
Kostenberechnung vom 7. Aug 14							1.175.000
Genehmigter Beschluss vom 19. Nov 14							1.175.000
Abrechnung geschätzt 94% -75.000							1.100.000

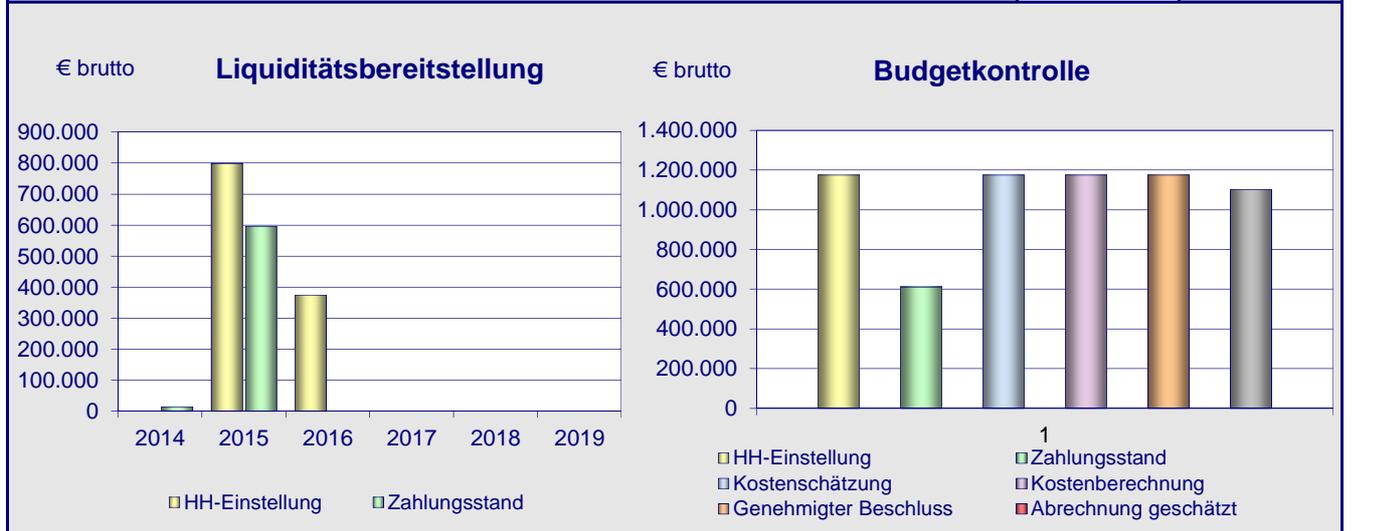

**Erläuterungen**



Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Schule dient als Ausweichquartier für Justinus-Kerner Schule ab Schuljahrbeginn 2015/2016. Die behördliche Abnahme erfolgte am 01.09.2015

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	1 / 2014			erledigt	●
Planung	2 / 2014	9 / 2014			erledigt	●
Ausführung	1 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		2 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		10 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		1 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projekt	Stand	<b>9/2015</b>	Auftrag		<b>23</b>
Brandschutz Hirschbergschule I (Tammer-32)			<b>konsumtiv + investiv</b>		

Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

<b>KOSTEN</b>	bis einsch.		1*: Gesamtkosten einsch. Jahr		2020	und ff.	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung							
Zahlungsstand	800	159.034					<b>159.834</b>
Kostenschätzung		vom 30. Nov 14					<b>700.000</b>
Kostenberechnung		vom 24. Feb 15					<b>700.000</b>
Genehmigter Beschluss		vom 4. Dez 14		18. Mrz 15			<b>700.000</b>
Abrechnung geschätzt				100%	0	●	<b>700.000</b>

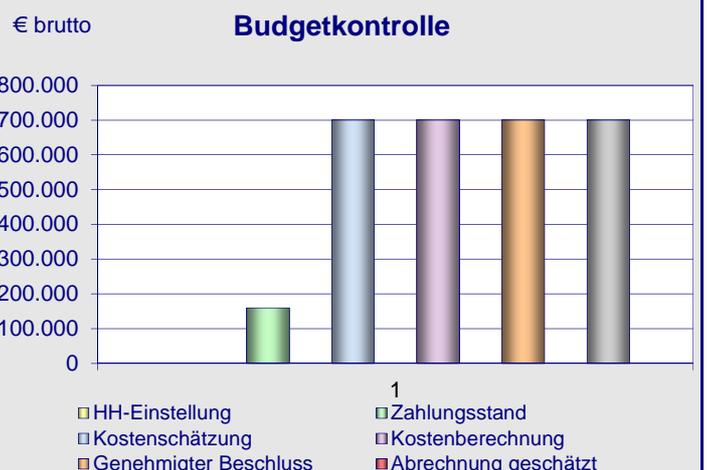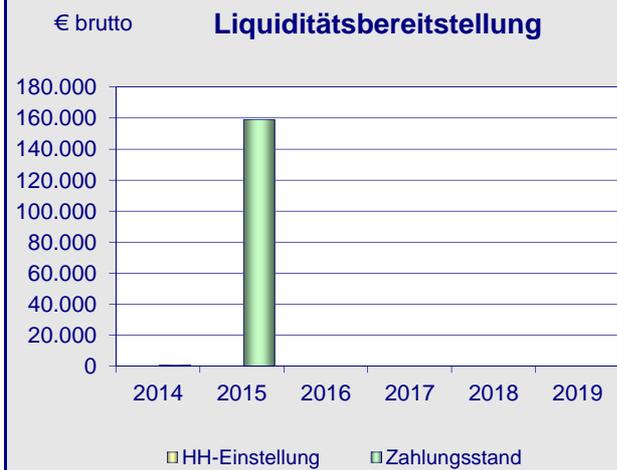

**Erläuterungen**

Am 18. März 2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss in Kombination mit der Vergabe der Brandschutzelemente dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt und durch diesen beschlossen.

Aufgrund der Dringlichkeit läuft das Projekt außerhalb des Projektfahrplans.

Der Bauantrag wurde eingereicht und ist genehmigt.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wurde eine Verlängerung für die Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Ende 2016 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

In den Sommerferien wurden die Brandschutzelemente eingebaut.

Die Fluchttreppe ist vergeben. Die Kosten liegen im Rahmen der Berechnung. Mit den Arbeiten für die Fundamente der Treppe wurde begonnen.

<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	6 / 2015	8 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2016			unkritisch	●

**Hinweise:**

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt. Eine Darstellung der Finanzierung für das kommende Jahr kann im konsumtiven Bereich nur fiktiv erfolgen.

Projekt	Stand	9/2015	Auftrag	28
Brandschutz Hirschbergschule II (Tammer-34)			<b>konsumtiv + investiv</b>	


Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020		und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt	
HH-Einstellung								
Zahlungsstand	890	163.425						164.315
Kostenschätzung		vom 30. Nov 14						800.000
Kostenberechnung		vom 24. Feb 15						800.000
Genehmigter Beschluss		vom 4. Dez 14		18. Mrz 15				800.000
Abrechnung geschätzt				100%	0	●		800.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

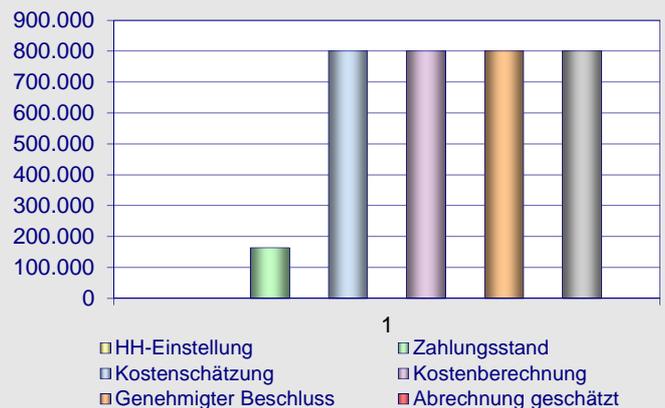

### Erläuterungen

Am 18. März 2015 wurde der Entwurfs- und Baubeschluss in Kombination mit der Vergabe der Brandschutzelemente dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt und durch diesen beschlossen.

Aufgrund der Dringlichkeit läuft das Projekt außerhalb des Projektfahrplans.

Der Bauantrag wurde eingereicht und ist seit dem 07. Juli genehmigt.

Da die Arbeiten nur in den Schulferien durchgeführt werden können, wurde eine Verlängerung für die Fertigstellung der Brandschutzsanierung bis Ende 2016 beim Bürgerbüro Bauen beantragt.

In den Sommerferien wurden die Brandschutzelemente eingebaut.

Die Fluchttreppe ist vergeben. Die Kosten liegen im Rahmen der Berechnung.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	6 / 2014			erledigt	●
Planung	7 / 2014	5 / 2015			erledigt	●
Ausführung	6 / 2015	8 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		3 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2016			unkritisch	●

### Hinweise:

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalt aufgeteilt. Eine Darstellung der Finanzierung für das kommende Jahr kann im konsumtiven Bereich nur fiktiv erfolgen.

Projekt	Stand	<b>9/2015</b>	Auftrag	29
Brandschutz Oststadtschule I (Berliner Platz 2)			<b>konsumtiv + investiv</b>	


Projektleiter Fachber. 65: **Drienko**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020		und ff.	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung								
Zahlungsstand	1.324	227.107						<b>228.432</b>
Kostenschätzung		vom 12. Feb 15						<b>835.000</b>
Kostenberechnung		vom 25. Feb 15						<b>835.000</b>
Genehmigter Beschluss		vom 2. Okt 14		18. Mrz 15				<b>835.000</b>
Abrechnung geschätzt				100%	0	●		<b>835.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

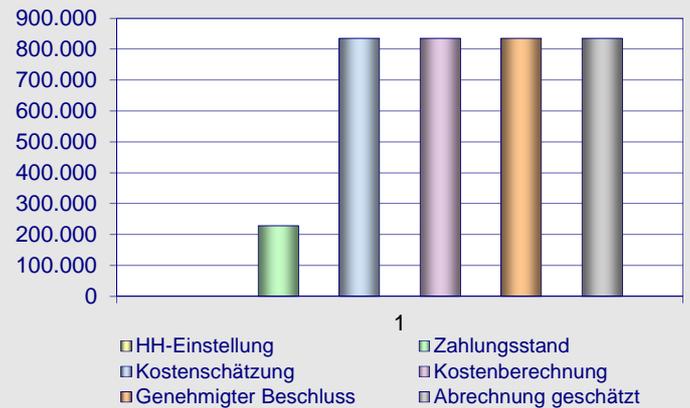

**Erläuterungen**

Am 02 Oktober 2014 wurde im Ausschuss Bauen, Technik, Umwelt der Grundsatzbeschluss zur Brandschutzsanierung gefasst und der stufenweisen Vergabe der Planungsleistungen zugestimmt.

Gemäß Projektfahrplan erfolgte im BTU-Ausschuss am 12.02.2015 der mündliche Bericht über die geplanten Maßnahmen, Termine und Kosten. Am 18.03.2015 wurde im Gemeinderat der Entwurf- und Baubeschluss gefasst.

Der Bauantrag wurde eingereicht und ist seit dem 04.09.2015 genehmigt.

In den Sommerferien wurden Brandschutzelemente eingebaut und die Treppenhausabschlüsse wie gefordert ertüchtigt. Die Fluchtteppen sind in der Planung.

Da die gesamten Baumaßnahmen nur in den Schulferien ausgeführt werden können, ist die Fertigstellung der Maßnahmen bis Ende 2016 geplant.

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2014	1 / 2015			erledigt	●
Planung	2 / 2015	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	8 / 2016			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		0 / 0				
Baugesuch		5 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2016			unkritisch	●

**Hinweise:**

Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und Finanzhaushalt aufgeteilt. Eine Darstellung der Finanzierung für das kommende Jahr kann im konsumtiven Bereich nur fiktiv erfolgen.

Projekt	Stand	9/2015	Auftrag	47
Anbau Schlößlesfeldschule (Cornelius-36)			721100104217	


Projektleiter Fachber. 65: **Schneider**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020	und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	2.350.000	530.000					2.880.000
Zahlungsstand	2.593.649	146.884					2.740.533
Kostenschätzung		vom 26. Mai 11					2.400.000
Kostenberechnung		vom 22. Mai 12					2.880.000
Genehmigter Beschluss		vom 13. Jul 11		27. Jun 12			2.880.000
Abrechnung geschätzt		100%		0		●	2.880.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

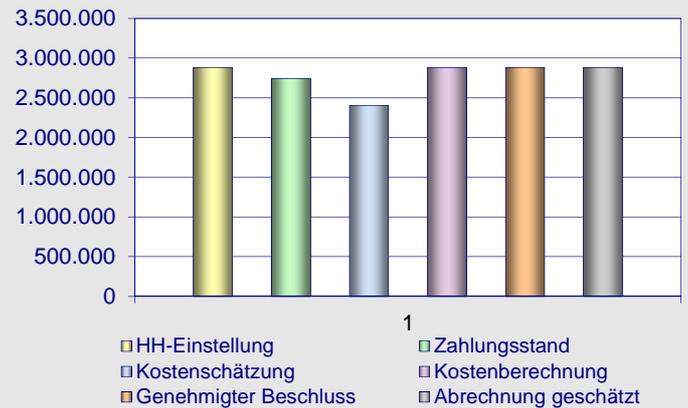

**Erläuterungen**

Am 30. Juli 2014 erfolgte die baurechtliche Abnahme.

Der reguläre Betrieb wurde zu Schuljahrsbeginn 2014/2015 aufgenommen.

Es fehlen nur noch wenige Rechnungen, um das Projekt Schluss rechnen zu können.

Am 4. Dezember 2014 fand die offizielle Einweihung statt.

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	10 / 2011	12 / 2011			erledigt	●
Planung	1 / 2012	2 / 2013			erledigt	●
Ausführung	3 / 2013	7 / 2014			erledigt	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		6 / 2012			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2014			erledigt	●

**Hinweise:**

Projekt Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	Stand <b>9/2015</b>	Auftrag <b>721100601417</b>	49
---	------------------------	--------------------------------	----


Projektleiter Fachber. 65: **Fischer**

<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020		und ff.	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Gesamt</b>	
HH-Einstellung	540.000	1.000.000	5.500.000	8.000.000	5.000.000	3.360.000	<b>23.400.000</b> 1*	
Zahlungsstand	728.150	556.426					<b>1.284.576</b>	
Kostenschätzung			vom 17. Jul 13				<b>23.440.000</b>	
Kostenberechnung			vom 20. Feb 14				<b>23.270.000</b>	
Genehmigter Beschluss			vom 2. Mrz 10		19. Mrz 14		<b>23.270.000</b>	
Abrechnung geschätzt				100%		0		<b>23.270.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

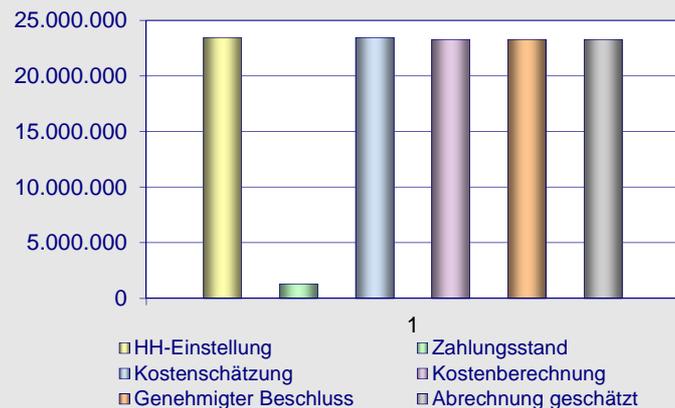

**Erläuterungen**

Derzeit wird an der Ausführungsplanung und weiteren Ausschreibungen gearbeitet. Zum ersten Ausschreibungspaketes wurde im Juni 2015 Vergaben beschlossen und die Firmen beauftragt.

Die Angebotspreise lagen innerhalb der Kostenberechnung. Damit wurden ca. 60% des baulichen Gesamtaufwandes vergeben.

Die Submission zum zweiten Ausschreibungspaket ist am 29.09.2015. Mit Beginn der Sommerferien 2015 wurde mit der Ausführung begonnen.

Der Umbau wird in 2 Bauabschnitten realisiert. Die Fertigstellung des Gebäudes in der Seestraße ist im 2. Quartal 2017 geplant, die Gesamtfertigstellung ist im Sommer 2018 vorgesehen.

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●
Planung	3 / 2013	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	8 / 2018			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		8 / 2018			unkritisch	●


**Hinweise:**

Projektleiter Fachber. 65: <b>Bezner</b>							
<b>KOSTEN</b>	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020	und ff.	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	343.000	126.000					<b>469.000</b>
Zahlungsstand	297.447						<b>297.447</b>
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom 4. Jun 12							
Genehmigter Beschluss vom 2. Jun 14							
Abrechnung geschätzt					100%	0	●
							<b>469.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

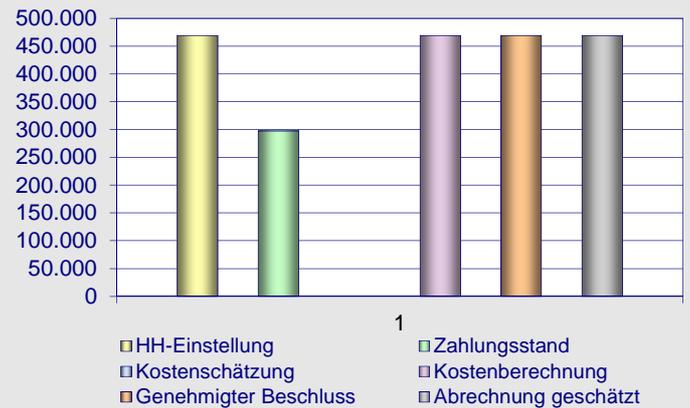

**Erläuterungen**

Die Maßnahme ist weitgehend abgeschlossen. Momentan Mängelbeseitigung und Rechnungsprüfung.

**TERMINE**

**SOLL**


**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2014	4 / 2014			erledigt	●
Planung	5 / 2014	7 / 2014			erledigt	●
Ausführung	8 / 2014	12 / 2015			im Plan	●
<b>Meilenstein bis</b>						
Raumprogramm		-				
Baugesuch		-				
Baubeginn		8 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2015			unkritisch	●

**Hinweise:**

Projekt KUZ- Umbau Museumsräume (Wilhelm-9/1)	Stand 9/2015	Auftrag 756100501007	68
--	-----------------	-------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: <b>Müllich</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020 und ff.	
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Gesamt
HH-Einstellung	801.000	800.000	544.000	100.000			2.245.000
Zahlungsstand	1.268.931	511.283					1.780.214
Kostenschätzung vom 25. Feb 13							2.000.000
Kostenberechnung vom 29. Mai 13							2.245.000
Genehmigter Beschluss vom 26. Jun 13							2.245.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●

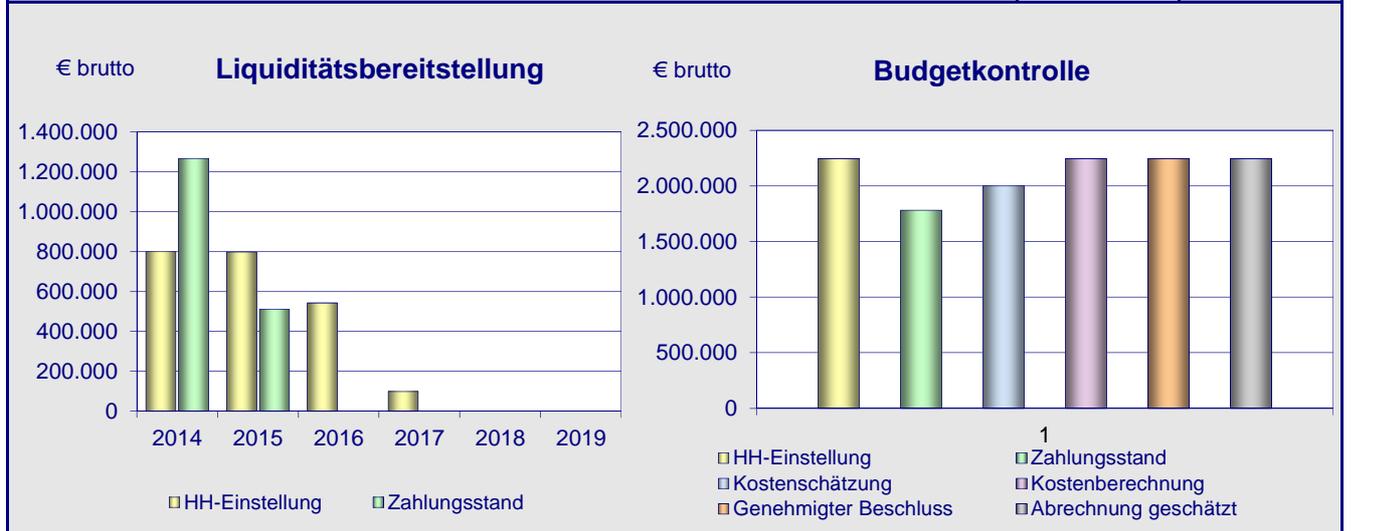

**Erläuterungen**

Die Einweihung und Wiedereröffnung der Gesamtbibliothek erfolgte am 22.09.2015. Aktuell erfolgen die Restarbeiten zur Beseitigung der Mängel aus den Abnahmen und die Schlussabrechnung der Gewerke.


<b>TERMINE</b>	<b>SOLL</b>		<b>STATUS</b>			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2013	1 / 2013			erledigt	●
Planung	1 / 2013	6 / 2014			erledigt	●
Ausführung	6 / 2013	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		2 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		6 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●
<b>Hinweise:</b>						

Projektleiter Fachber. 65: <b>Raiber</b>							
<b>KOSTEN</b>		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2020 und ff.	
	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	790.000	500.000	385.000	100.000			<b>1.775.000</b>
Zahlungsstand	489.179	468.672					<b>957.851</b>
Kostenschätzung vom 2. Mai 13							<b>1.700.000</b>
Kostenberechnung vom 23. Sep 13							<b>1.775.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 6. Nov 13							<b>1.775.000</b>
Abrechnung geschätzt					100%	●	<b>1.775.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

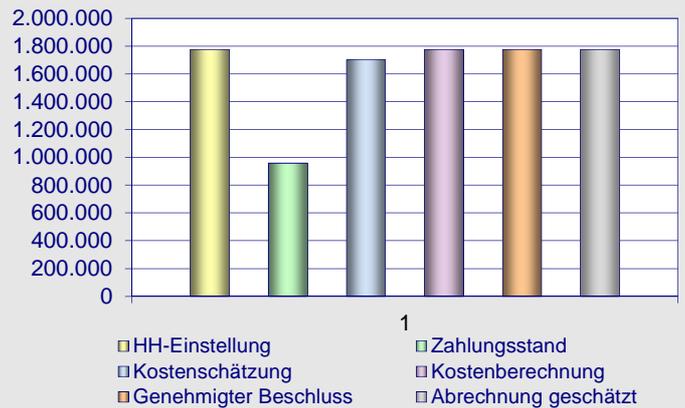

### Erläuterungen

Das Gebäude und die Außenanlagen sind fertiggestellt.  
 Die Einrichtung ist am 01.09.2015 termingerecht in Betrieb gegangen.  
 Aktuell finden noch kleinere Restarbeiten und die Arbeiten zur Mängelbeseitigung statt.

### TERMINE

### SOLL

### STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2012	10 / 2012			erledigt	●
Planung	11 / 2012	3 / 2014			erledigt	●
Ausführung	3 / 2014	9 / 2015			erledigt	●
<b>Meilenstein</b>		<b>bis</b>				
Raumprogramm		7 / 2012			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		3 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●


Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: <b>Hüttig</b>							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2020		und ff.
<b>KOSTEN</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>Gesamt</b>
HH-Einstellung	1.413.000	1.340.000	847.000	200.000			<b>3.800.000</b>
Zahlungsstand	2.158.895	1.266.853					<b>3.425.749</b>
Kostenschätzung vom 17. Apr 12							<b>3.870.000</b>
Kostenberechnung vom 26. Sep 12							<b>3.800.000</b>
Genehmigter Beschluss vom 15. Dez 11   13. Dez 12   23. Jul 13							<b>3.800.000</b>
Abrechnung geschätzt					105%	●	<b>3.994.000</b>

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

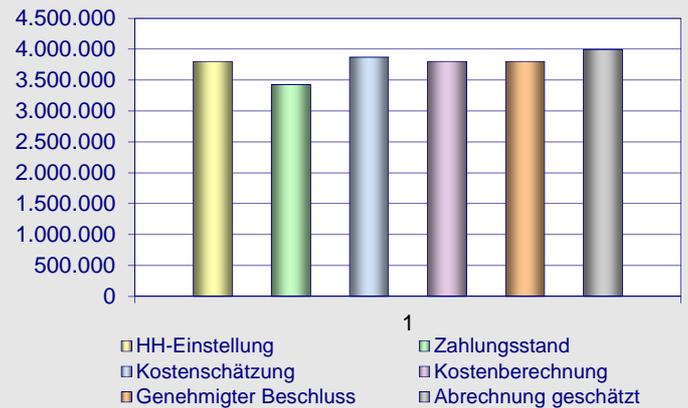

**Erläuterungen**

Die Inbetriebnahme der Einrichtung erfolgte Ende Mai 2015.  
Die Einweihungsveranstaltung fand am 17.06.2015 statt.

aktuelle Maßnahmen:  
Restarbeiten / Mängelbeseitigungen;  
Projektabschluss

**TERMINE**

**SOLL**

**STATUS**

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	-			erledigt	●
Planung	-	-			erledigt	●
Ausführung	-	-			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		12 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		2 / 2013			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2015			erledigt	●

Hinweise:
