
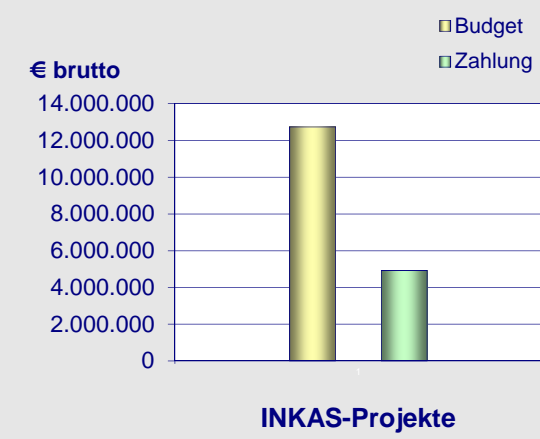


INKAS (Projekte > 300.000 €)		Stand: 5/2017		FB 65	Rahmenterminplan																																																			
Blatt 1		STATUS		Jahr: 2017	2017												2018												2019												2020															
Projekt	Kosten	Termine	Auftrag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
9 NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	●	●	721100101017																																																					
10 GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)	●	●	721100112017																																																					
12 San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)	●	●	konsumtiv + investiv																																																					
30 NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)	●	●	721100109007																																																					
31 Ersatzenbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)	●	●	konsumtiv + investiv																																																					
33 GS Dusch-/Umkleide Turnhalle NW (Schwarzwald-2)	●	●	konsumtiv																																																					
34 NB Schulsporthalle Hoheneck (Ostertag-7)	●	●	742410008017																																																					
38 Stadtbad Mensa + Besprechungsräume (Alleen-20)	●	●	7794801011007																																																					
49 Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	●	●	721100601417																																																					
75 KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)	●	●	736501111007																																																					
Kostenübersicht Haushaltsjahr 2017				Budget	Zahlung																																																			
Ergebnishaushalt FB 65				8.280.000	1.888.723																																																			
INKAS - Projekte				12.739.000	4.926.142																																																			

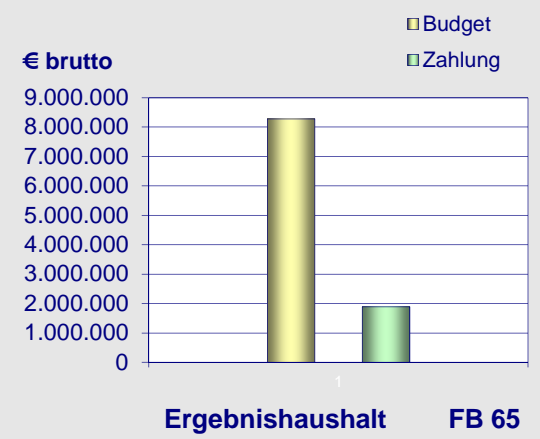

- ### Projektphasen
- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
 - Planung Leistungsphasen 2 - 7
 - Ausführung Leistungsphase 8

- ### Status
- Kosten**
- Günstiger oder nicht teurer
 - bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
 - > 10 %, über 100.000 €

Anmerkungen zu den Projekten

zu 9: gesch. Abrechn. ca. 130.000 € über Beschluss (Aufwendungen durch Schäden an Nachbargebäuden).

zu 12: gesch. Abrechn. ca. 20.000 € über Beschluss

- Termine**
- entsprechend Rahmenterminplan
 - Rahmenterminplan fraglich
 - Rahmenterminplan nicht möglich
