


Projekt	Stand	9/2017	Auftrag	9
NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)			721100101017	

Projektleiter Fachber. 65: Block								
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	3.860.000						3.860.000	
Zahlungsstand	3.359.449	24.916					3.384.364	
Kostenschätzung		vom 11. Mrz 12						3.700.000
Kostenberechnung		vom 30. Aug 12						3.860.000
Genehmigter Beschluss		vom 15. Dez 11		10. Okt 12	23. Jul 13		3.860.000	
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	3.860.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

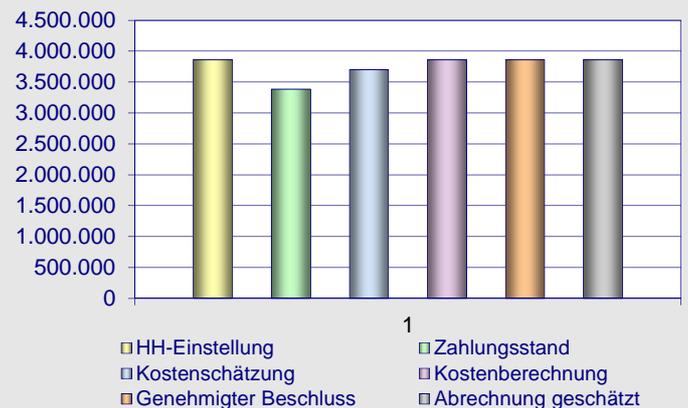

Erläuterungen

Von 2016 wurden nach 2017 Haushaltsreste übertragen in Höhe von 787.600 EUR.

Die Schadenersatzansprüche der Nachbarn befinden sich im Klärungsprozess.

Der Neubau mit Mensa und Bewegungsraum ist zum Schuljahresbeginn im September 2015 in Betrieb gegangen.

Die Schlussrechnungen liegen noch nicht vollständig vor.

Aufwendungen für Schäden an den Nachbargebäuden, wie z.B. Kosten für Gutachter - und Rechtsanwaltskosten sowie die bisher geleisteten Auszahlungen an die betroffenen Nachbarn, belaufen sich derzeit auf rd. 130.000 EUR.


TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	3 / 2011	2 / 2012			erledigt	●
Planung	3 / 2012	9 / 2013			erledigt	●
Ausführung	10 / 2013	9 / 2015			erledigt	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		11 / 2011			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2011			erledigt	●
Baubeginn		10 / 2013			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2015			erledigt	●

Hinweise:

Projekt	Stand 9/2017	Auftrag	10
GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)		721100112017	

Projektleiter Fachber. 65: **Pfletschinger**

KOSTEN	bis einsch.		1*: Gesamtkosten einsch. Jahr		2022		und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	1.650.000	150.000					1.800.000	
Zahlungsstand	878.122	598.776					1.476.899	
Kostenschätzung		vom 6. Nov 14					1.800.000	
Kostenberechnung		vom 20. Nov 14					1.800.000	
Genehmigter Beschluss		vom 18. Jul 12		11. Dez 13	11. Dez 14		1.800.000	
Abrechnung geschätzt				100%	0	●	1.800.000	

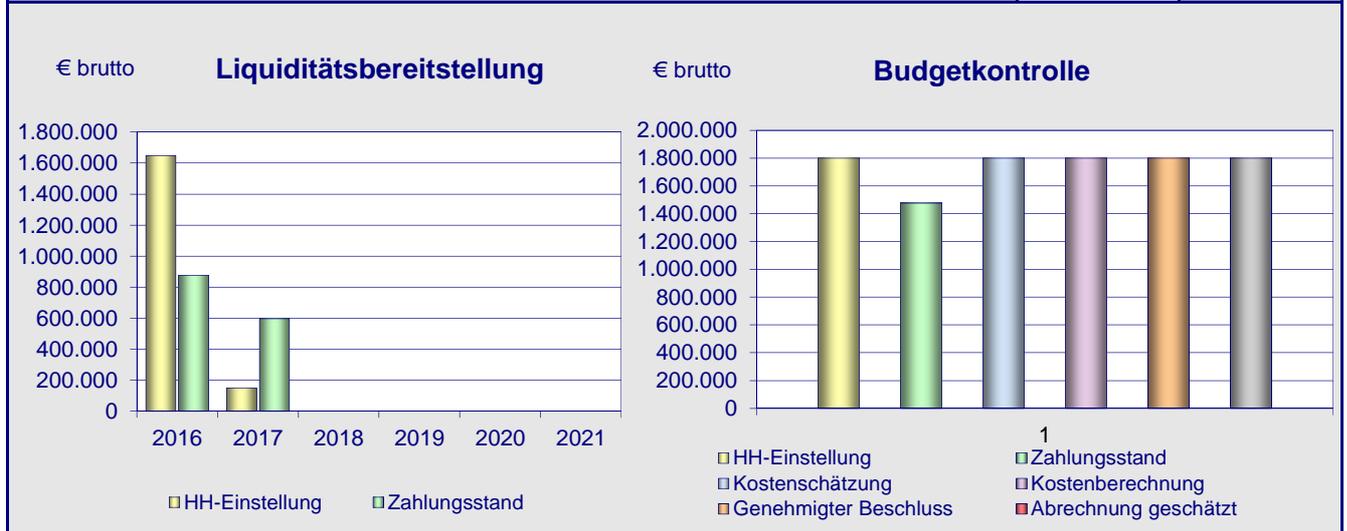

Erläuterungen

Das komplette Gebäude mit Mensa, Schulkindbetreuung und Klassenzimmern ist seit dem 01.06.2017 in Betrieb.

Der Gehweg entlang der Erdmannhäuser Straße ist fertiggestellt. Anfang Oktober beginnen die Arbeiten am ersten Bauabschnitt des Schulhofes, so dass bis Ende des Jahres die Außenanlagen fertig gestellt sein werden.

Die Einweihungsfeier findet am 10.10.2017 statt.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	11 / 2014			erledigt	●
Planung	9 / 2014	11 / 2015			erledigt	●
Ausführung	12 / 2015	6 / 2017			unkritisch	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		-			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		12 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		6 / 2017			erledigt	●

Hinweise:

Projekt	Stand	9/2017	Auftrag	12
San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)			konsumtiv + investiv	


Projektleiter Fachber. 65: **Joas**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022		und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	200.000	200.000					400.000	
Zahlungsstand	357.340	74.077					431.417	
Kostenschätzung		vom						
Kostenberechnung		vom 15. Okt 13						398.320
Genehmigter Beschluss		vom 25. Sep 14						400.000
Abrechnung geschätzt		109%		37.000		●		437.000

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

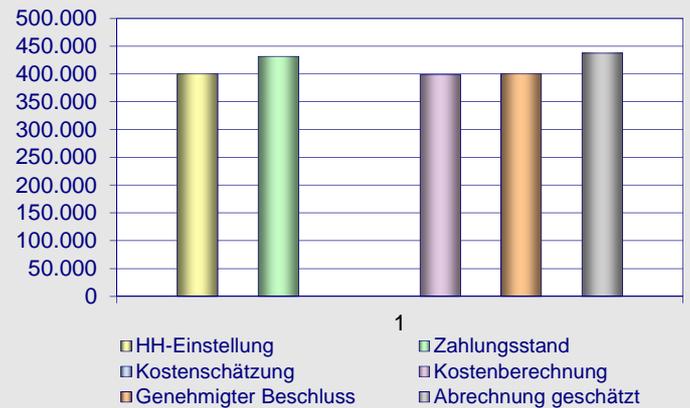

Erläuterungen

Die Arbeiten für den 1. Fachklassenraum M 303 + M 304 sind abgeschlossen. Die Inbetriebnahme erfolgte zum Beginn des neuen Schuljahres am 12.09.2016.

Der frühere naturkundliche Vorbereitungsraum M 311 wurde in den Sommerferien umgebaut zum Raum "Differenziertes Unterrichten". Die Inbetriebnahme erfolgte am 12.09.2016.

Die Abbruch- und Rohbauarbeiten sowie die brandschutztechnische Ertüchtigung der Decke für den 2. Fachklassenraum, Raum 305 + 306 sind abgeschlossen. Die Ausbuarbeiten und Fachklassenausstattung erfolgten bis zum Frühjahr 2017.

Die Übergabe der Räume an die Schule erfolgte termingerecht Anfang Mai 2017 (KW18)

Bei den Massnahmen für Brandschutz, Abfangkonstruktion mit zusätzlichen statischen Massnahmen, Beton-Instandsetzung der Bausubstanz sowie zusätzlichen Nutzerwünschen kam es bei der Durchführung zu erheblichen Mehraufwendungen und Kostenerhöhungen.

TERMINE

SOLL


STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	6 / 2013	7 / 2013			erledigt	●
Planung	8 / 2013	8 / 2016			erledigt	●
Ausführung	7 / 2014	5 / 2017			erledigt	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		7 / 2013			erledigt	●
Baugesuch		7 / 2014			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2014			erledigt	●
Fertigstellung		5 / 2017			erledigt	●

Hinweise:

Projekt NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)	Stand 9/2017	Auftrag 721100109007	30
--	---------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Schneider								
KOSTEN		bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	290.700	2.080.000	7.100.000	3.815.000	1.787.000	227.300	15.300.000	
Zahlungsstand	386.260	1.152.916					1.539.176	
Kostenschätzung		vom 28. Jan 16						13.900.000
Kostenberechnung		vom 18. Aug 16						15.300.000
Genehmigter Beschluss		vom 6. Apr 16		28. Sep 16			15.300.000	
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	15.300.000	

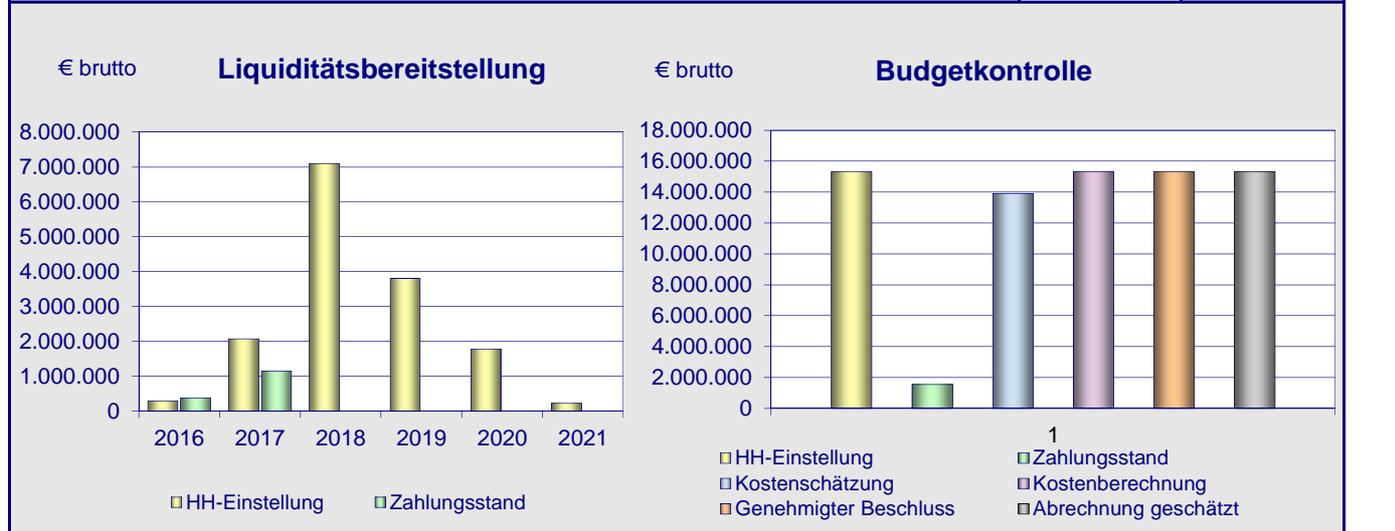

Erläuterungen

Am 24.06.2015 wurde das Raumprogramm für den Ausbau der August-Lämmle-Schule zur Ganztageschule mit Betreuungsräumen und Mensa (Vorl.-Nr. 220/15) sowie die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen beschlossen.

Der Entwurfs- und Baubeschluss erfolgte am 28.09.2016 (Vorl.-Nr. 290/16).

Der Bauantrag wurde Mitte Oktober 2016 eingereicht und Anfang April 2017 genehmigt.

Das 3. Ausschreibungspaket ist veröffentlicht. Die Submission fand am 28.09.2017 statt. Die Angebote liegen im Kostenrahmen.


Die Wände des Untergeschosses werden gerade betoniert. Gleichzeitig werden die Fundamente des nicht unterkellerten Bereiches hergestellt.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2015	6 / 2015			erledigt	●
Planung	7 / 2015	3 / 2017			erledigt	●
Ausführung	4 / 2017	9 / 2020			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		6 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2016			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		9 / 2020			unkritisch	●

Hinweise:	
------------------	--

Projekt	Stand	9/2017	Auftrag	31
Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)			konsumtiv + investiv	

Projektleiter Fachber. 65: Raiber							
KOSTEN		bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022 und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	325.000	809.000	1.366.000				2.500.000
Zahlungsstand	264.911	324.569					589.480
Kostenschätzung			vom 24. Sep 15				2.750.000
Kostenberechnung			vom 9. Dez 15				2.500.000
Genehmigter Beschluss			vom 9. Dez 15				2.500.000
Abrechnung geschätzt				100%	0	●	2.500.000

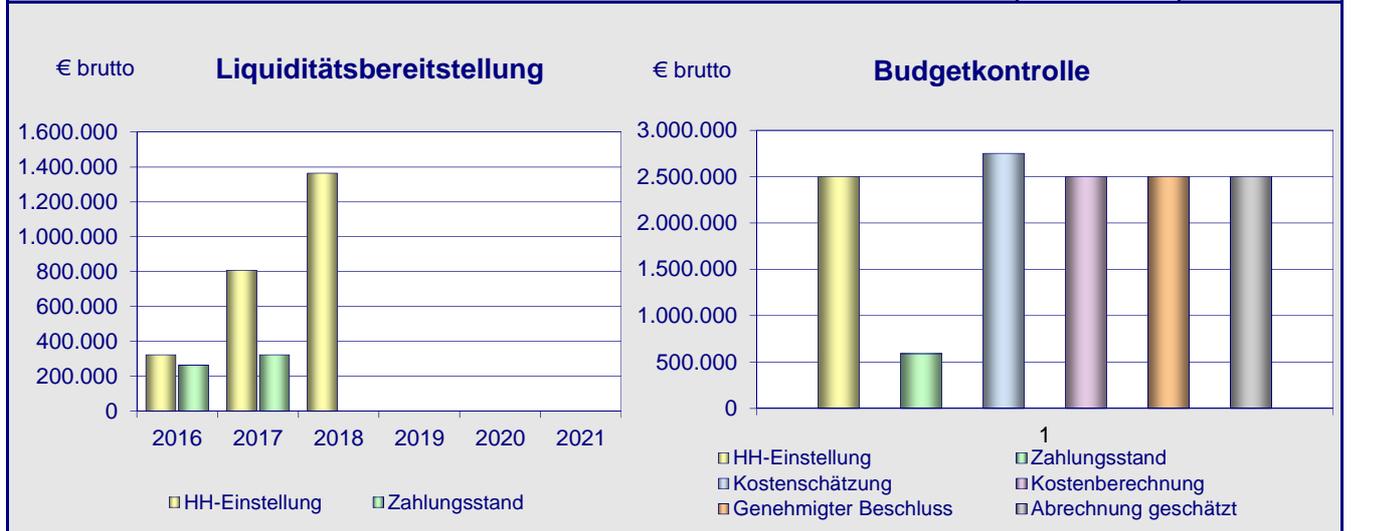

Erläuterungen

Am 09.12.2015 erfolgte im GR der Entwurfs- und Baubeschluss mit einer Gesamtprojektsomme (Investiv+Konsumtiv) in Höhe von 2.500.000,-€.

Der Bauantrag wurde am 28.09.2016 genehmigt.

Die Wohnungen im Dachgeschoss Bestand wurden zurückgebaut.

Die Rohbauarbeiten Neubau, Gerätehaus und Technikräume UG Bestand sind abgeschlossen.

Aktuell erfolgen im Bestand die Installationsarbeiten in den Technikräumen im UG.

Im Neubau laufen aktuell die Installationsarbeiten und die Dachabdichtungsarbeiten.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2015	1 / 2015			erledigt	●
Planung	1 / 2015	9 / 2016			erledigt	●
Ausführung	12 / 2016	12 / 2018			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		1 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		3 / 2016			erledigt	●
Baubeginn		12 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2018			unkritisch	●

Hinweise: Aufgrund des neuen Haushaltsrechts werden die Kosten für den Brandschutz künftig auf den Ergebnis- und den Finanzhaushalts aufgeteilt.

Projekt	Stand	9/2017	Auftrag	34
NB Schulsporthalle Hoheneck (Ostertag-7)			742410008017	

Projektleiter Fachber. 65: **Joas**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr				2022	und ff.
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung	500.000	1.500.000	300.000				2.300.000	
Zahlungsstand	205.648	1.287.333					1.492.981	
Kostenschätzung vom 19. Feb 16								
Kostenberechnung vom								
2.300.000								
Genehmigter Beschluss vom 29. Jul 15								
2.300.000								
Abrechnung geschätzt 100% ●								
2.300.000								



Erläuterungen

Der Generalübernehmervertrag wurde Anfang Juli 2016 erteilt. Der Rahmenterminplan des Generalübernehmers sieht eine Bauzeit und Fertigstellung bis Dezember 2017 vor.

Der Baubeginn erfolgte Ende Januar 7 Anfang Februar 2017. Die Erstellung des Rohbaus mit Betonfertigteilen wurde am 22.05.2017 begonnen.

Vom Juli 2017 bis September 2017 erfolgten die Grobausbauarbeiten sowie der Einbau der technischen Installationen.

Im Oktober und November 2017 erfolgt der restliche Innenausbau sowie im Dezember die Fertiginstallationen. Parallel dazu werden die Belagsarbeiten in den Aussenanlagen rund um die neue Halle ausgeführt.

Die Fertigstellung der neuen Halle ist zum 31.12.2017 geplant. Der Rückbau der alten Halle sowie die Herstellung der restlichen Aussenanlagen erfolgt im Frühjahr 2018.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	7 / 2015	9 / 2015			erledigt	●
Planung	9 / 2015	12 / 2016			erledigt	●
Ausführung	1 / 2017	7 / 2018			im Plan	●
Meilenstein	bis					
Raumprogramm		7 / 2015			erledigt	●
Baugesuch		0 / 0			erledigt	●
Baubeginn		1 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2018			unkritisch	●

Hinweise:	
------------------	--

Projekt	Stand	9/2017	Auftrag	35
Brandschutz Eberhard-Ludwig-Schule (Tammer-28)			konsumtiv + investiv	

Projektleiter Fachber. 65: **Block**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022		und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung			400.000	320.000			720.000	
Zahlungsstand	937	123.938					124.875	
Kostenschätzung			vom 16. Feb 17				710.000	
Kostenberechnung			vom 1. Mrz 17				720.000	
Genehmigter Beschluss			vom 23. Mrz 17				720.000	
Abrechnung geschätzt					100%		● 720.000	

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**



Erläuterungen

Der Grundsatzbeschluss zur Brandschutzsanierung, VORL.NR. 351/16, erfolgte im BTU am 24.11.2016. Der Entwurfs- und Baubeschluss, VORL.NR. 034/17, wurde am 23.03.2017 im BTU mit Kosten in Höhe von 720.000 EUR inkl. 19% MwSt. genehmigt.

Zur Sicherung des zweiten Fluchtweges muss eine außenliegende Fluchttreppe erstellt werden. Hierzu sind weitere Flure und ein abgeschlossenes Treppenhaus im OG sowie eine automatische Brandmeldeanlage notwendig..

Die Bauarbeiten können ausschließlich in den Ferien ausgeführt werden. Die Arbeiten wurden in den Osterferien 2017 im EG begonnen. In den Sommerferien wurde die Fluchttüren im EG und OG eingebaut. Im OG wurde die RWA Öffnung über Dach hergestellt.

Die Gesamtkosten von 720.000 EUR teilen sich in investive Maßnahmen in Höhe von 440.000 EUR und konsumtive Maßnahmen in Höhe von 280.000 EUR auf.

TERMINE



SOLL

STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	6 / 2016	10 / 2016			erledigt	●
Planung	11 / 2016	3 / 2017			im Plan	●
Ausführung	4 / 2017	3 / 2019			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		0 / 0				
Baugesuch		6 / 2017			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		3 / 2019			unkritisch	●

Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: Joas							
KOSTEN	bis einschl.	1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung		1.660.000					1.660.000
Zahlungsstand	4.683	1.130.655					1.135.338
Kostenschätzung		vom 29. Mrz 17					1.660.000
Kostenberechnung		vom 29. Mrz 17					1.660.000
Genehmigter Beschluss		vom 26. Okt 16		29. Mrz 17			1.660.000
Abrechnung geschätzt		100%			0	●	1.660.000

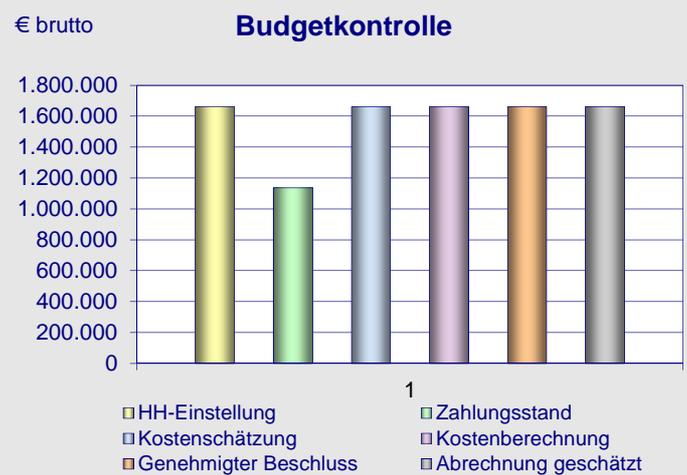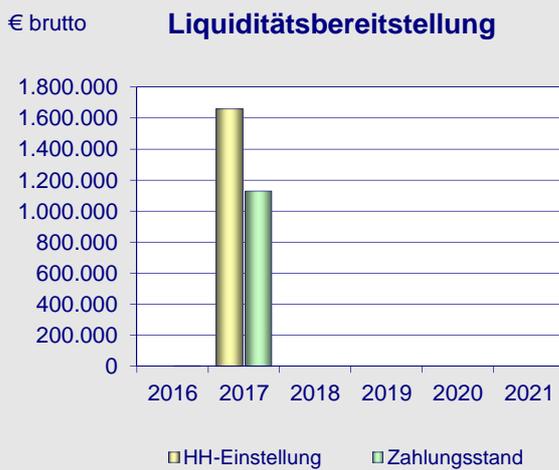

Erläuterungen

Baubeginn fristgerecht in April 2017 erfolgt.

Fertigstellung geplant bis Herbstferien 2017 (KW 44, Ende Oktober, Anfang November)

Inbetriebnahme ab 06.11.2017.

TERMINE



SOLL

STATUS

Phase	von	bis	STATUS			
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	im Plan	im Plan			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		10 / 2016			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2016			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		10 / 2017			unkritisch	●

Hinweise:

Projektleiter Fachber. 65: Joas								
KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022	und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung		1.220.000					1.220.000	
Zahlungsstand		830.376					830.376	
Kostenschätzung		vom 29. Mrz 17						1.220.000
Kostenberechnung		vom 29. Mrz 17						1.220.000
Genehmigter Beschluss		vom 26. Okt 16		29. Mrz 17			1.220.000	
Abrechnung geschätzt					100%		●	1.220.000

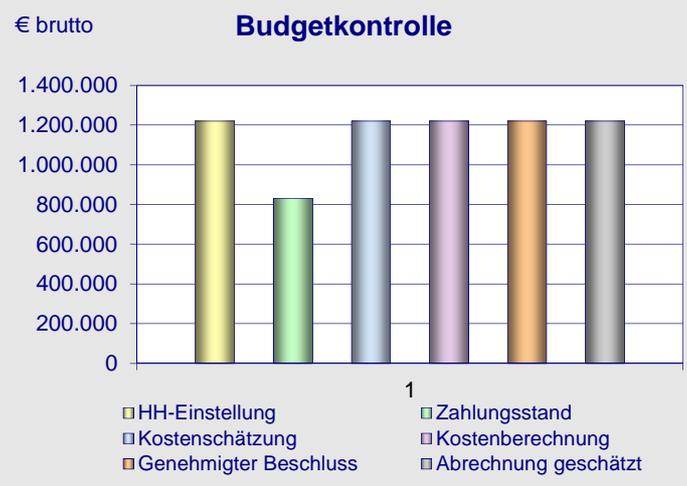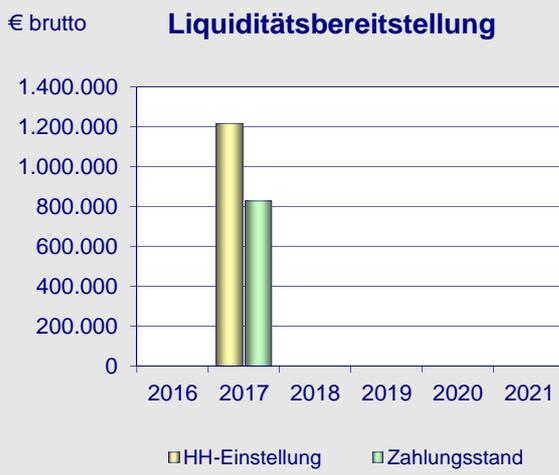

Erläuterungen

Baubeginn termingerecht erfolgt im April 2017

Fertigstellung geplant bis 06.10.2017 (KW 40, Anfang Oktober 2017)

Inbetriebnahme ab 09.10.2017

TERMINE

SOLL

STATUS


Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Planung	erledigt	erledigt			erledigt	●
Ausführung	im Plan	im Plan			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		10 / 2016			erledigt	●
Baugesuch		11 / 2016			erledigt	●
Baubeginn		4 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		10 / 2017			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt	Stand	9/2017	Auftrag		38
Stadtbad Mensa + Besprechungsräume (Alleen-20)			7794801011007		

Projektleiter Fachber. 65: **Pfletschinger**

KOSTEN	bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr		2022		und ff.	
	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt	
HH-Einstellung		370.000	1.611.000	158.000			2.139.000	
Zahlungsstand		47.602					47.602	
Kostenschätzung			vom 19. Jan 17			2.129.000		
Kostenberechnung			vom 28. Jun 17			2.142.000		
Genehmigter Beschluss			vom 30. Sep 16		19. Jan 17	30. Mai 17	28. Jun 17	2.139.000
Abrechnung geschätzt			100%		0	●	2.139.000	

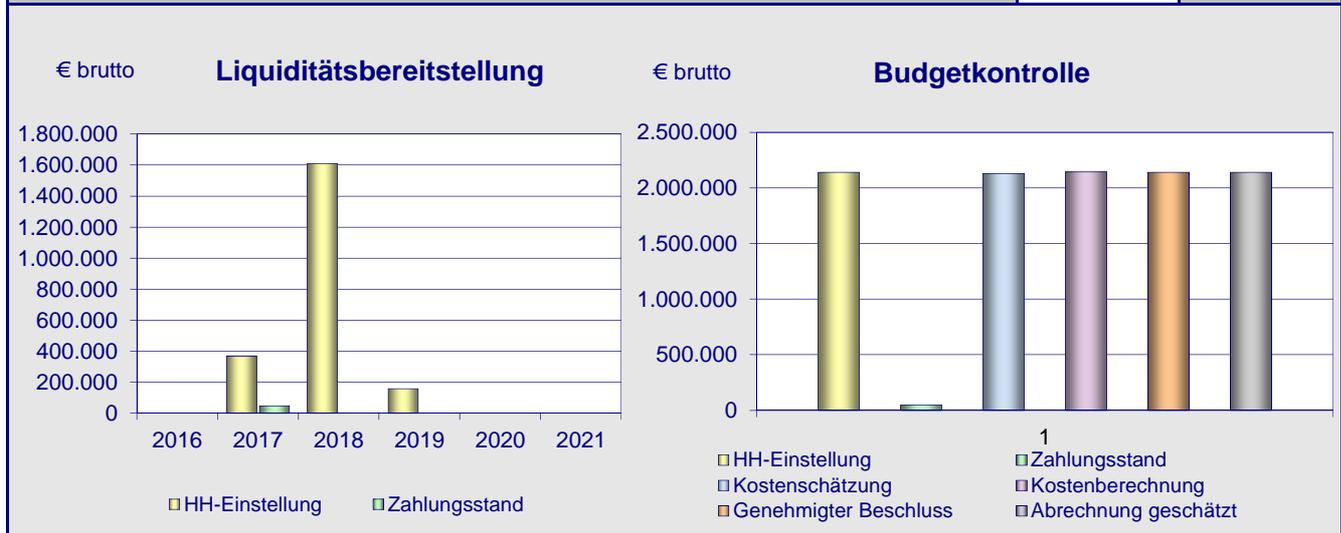

Erläuterungen

Am 28.06.2017 wurde im GR der Projektbeschluss mit einer Gesamtsumme von 2.139.000 € (konsumtiv: 250.000 € + investiv: 1.889.000 €) gefasst.

Die Baugenehmigung wurde erteilt, zur Zeit erfolgt die Ausführungsplanung.

Das erste Ausschreibungspaket mit den Technikgewerken, Rohbau- und Zimmerarbeiten wird Mitte Oktober 2017 veröffentlicht. Die Submission ist für November 2017 und die Vergabe der Arbeiten im BTU Anfang Dezember 2017 geplant.


Die Umbaumaßnahmen können dann im Januar 2018 beginnen.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	-	6 / 2017			erledigt	●
Planung	7 / 2017	12 / 2017			im Plan	●
Ausführung	1 / 2018	9 / 2018			unkritisch	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		0 / 0			erledigt	●
Baugesuch		5 / 2017			im Plan	●
Baubeginn		1 / 2018			unkritisch	●
Fertigstellung		9 / 2018			unkritisch	●

Hinweise:

Projekt	Stand	9/2017	Auftrag	42
Brandsch. Schlösslesfeldsch. Altbau (Cornelius-36)			konsumtiv + investiv	

Projektleiter Fachber. 65: Bunk							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2022 und ff.							
KOSTEN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung		290.000	314.000	140.000			744.000
Zahlungsstand	4.712	26.219					30.931
Kostenschätzung vom 9. Sep 16							700.000
Kostenberechnung vom 24. Feb 17							744.000
Genehmigter Beschluss vom 23. Mrz 17							744.000
Abrechnung geschätzt 100%							744.000

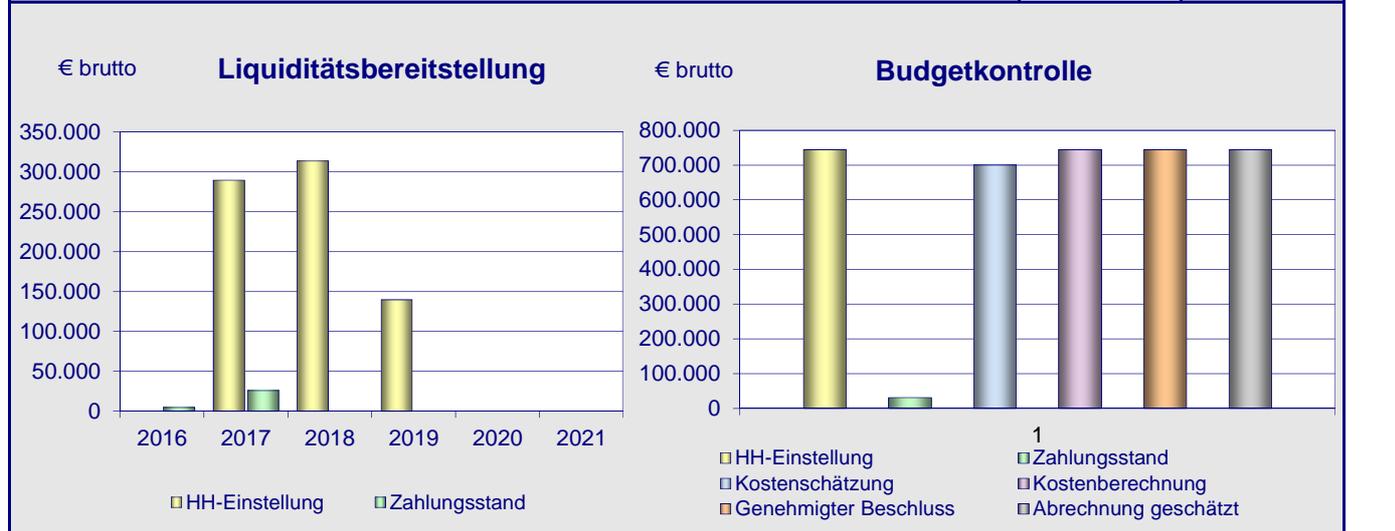

Erläuterungen

Der Grundsatzbeschluss für die Brandschutzsanierung, Vorl.Nr. 318/16, erfolgte am 24.11.2016 durch den BTU und der Entwurfs- und Baubeschluss, Vorl.Nr. 063/17, wurde am 23.03.2017 im BTU mit Kosten in Höhe von 744.000 EUR incl. MwSt genehmigt

Zur Sicherstellung eines längerfristigen Schulbetriebes sind im wesentlichen folgende Maßnahmen erforderlich: brandschutztechnische Ertüchtigung der Rippendecke im Untergeschoss, Abschottung der drei Treppenträume mit T30/RS Brandschutzelementen, Ersatz der raumhohen Türelement zum Treppenhaus und der Einbau einer Sicherheitsbeleuchtung.

Die Baumaßnahme erfolgt im laufenden Betrieb. Maßnahmen, die den Schulbetrieb beeinträchtigen würden, werden in den Ferienzeiten ausgeführt.

Planung und Ausführung erfolgt ab Leistungsphase 5 durch das Büro marcusbärarchitekten. Die Gesamtkosten von 744.000 EUR teilen sich in investive und konsumtive Kosten auf.

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	9 / 2016	12 / 2016			erledigt	●
Planung	1 / 2017	6 / 2017			erledigt	●
Ausführung	7 / 2017	12 / 2018			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		0 / 0			-	●
Baugesuch		4 / 2017			erledigt	●
Baubeginn		7 / 2017			erledigt	●
Fertigstellung		12 / 2018			unkritisch	●
Hinweise:	Ein neues Raumprogramm war nicht notwendig, da sich durch die Brandschutzanforderungen nichts an der Raumzuordnung geändert hat.					


Projekt Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	Stand 9/2017	Auftrag 721100601417	49
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Fischer							
bis einschl. 1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2022 und ff.							
KOSTEN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	6.310.000	5.500.000	5.500.000	4.460.000	1.500.000		23.270.000
Zahlungsstand	6.621.667	5.570.332					12.191.999
Kostenschätzung vom 17. Jul 13							23.440.000
Kostenberechnung vom 20. Feb 14							23.270.000
Genehmigter Beschluss vom 2. Mrz 10 19. Mrz 14							23.270.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●

€ brutto **Liquiditätsbereitstellung**



€ brutto **Budgetkontrolle**

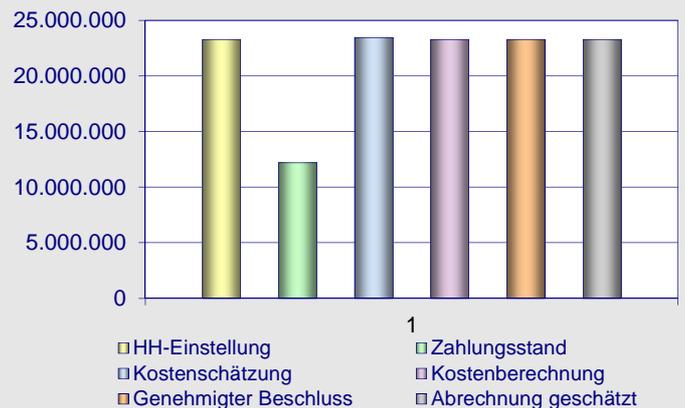

Erläuterungen

Die Realisierung der Baumaßnahme erfolgt in 2 Bauabschnitten. Der 1. Bauabschnitt (Seestraße) ging im Wesentlichen zum Schuljahresbeginn 2017/2018 in Betrieb.

Wegen unvorhergesehener Maßnahmen, Ausfall der Innenputzfirmen, Terminverzug des Fachklasseneinrichters werden Dachgeschoss und Fachklassenräume voraussichtlich erst nach den Herbstferien 2017 zur Verfügung stehen.

Maßnahmen, die zu zusätzlichen Kosten und verlängerter Bauzeit geführt haben, sind: Betonsanierung und statische Ertüchtigung von Decken, Ersatz von Estrichflächen, Entfernen schadstoffbelasteter Wandfarben, Ersatz Innenputzarbeiten.

Die o.g. Maßnahmen sowie zusätzliche Nutzerwünsche können derzeit im beschlossenen Budget von 23,27 Mio. EUR gedeckt werden.

Durch die genannte Verzögerung wird der Alleinbaukörper (2. BA) möglicherweise bis Ende 2017 in Betrieb bleiben müssen. Anschließend kann mit dem 2. BA begonnen werden. Dadurch wird sich die im Frühjahr 2019 geplante Gesamtfertigstellung verschieben.

TERMINE

SOLL


STATUS

Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	11 / 2012	3 / 2013			erledigt	●
Planung	3 / 2013	7 / 2015			erledigt	●
Ausführung	8 / 2015	2 / 2019			im Plan	●
Meilenstein bis						
Raumprogramm		erledigt			erledigt	●
Baugesuch		erledigt			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2015			erledigt	●
Fertigstellung		2 / 2019			kritisch	●

Hinweise:

Projekt KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)	Stand 9/2017	Auftrag 736501111007	75
---	------------------------	--------------------------------	----

Projektleiter Fachber. 65: Hüttig							
bis einschl.		1*: Gesamtkosten einschl. Jahr			2022 und ff.		
KOSTEN	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Gesamt
HH-Einstellung	1.803.000	2.130.000	2.975.000	1.442.000			8.350.000
Zahlungsstand	654.103	2.191.729					2.845.832
Kostenschätzung vom 31. Aug 15							8.335.000
Kostenberechnung vom 11. Nov 15							8.350.000
Genehmigter Beschluss vom 9. Dez 15							8.350.000
Abrechnung geschätzt					100%	0	●

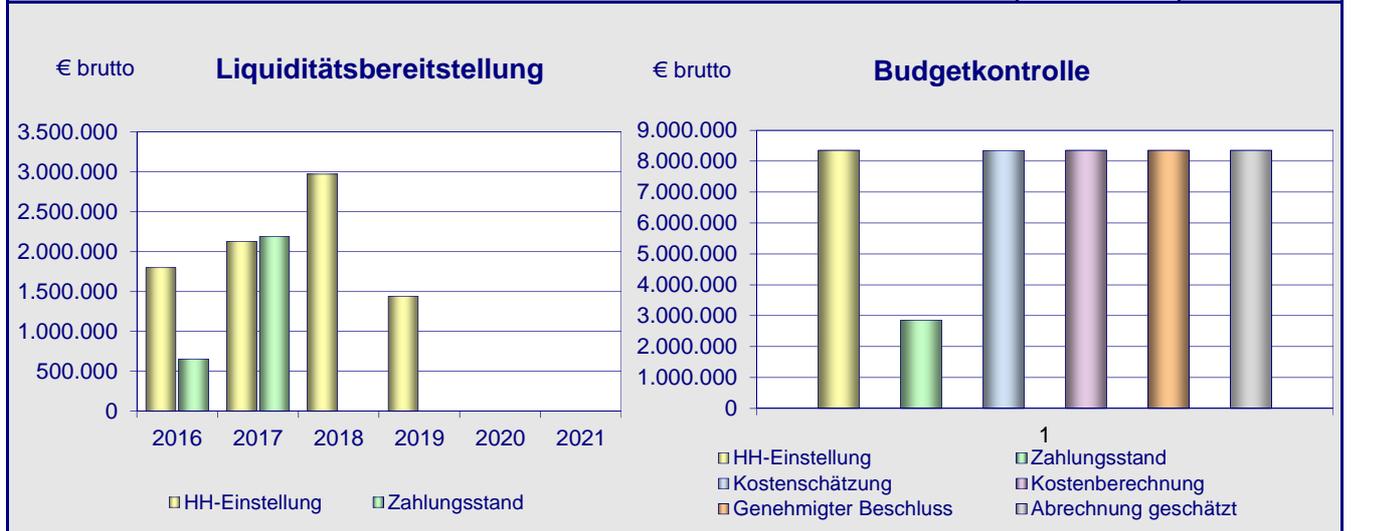

Erläuterungen

- aktuelle Arbeiten: Rohbau- (aktuell Ziegel-Vormauerung), Holzbau-, Trockenbauarbeiten, Fenster; Technik-Gewerke, Putz-/Stuckarbeiten; Estricharbeiten
- anstehende Vergaben: Schlosser-, Schreiner-, Malerarbeiten

TERMINE	SOLL		STATUS			
Phase	von	bis				
Grundlagenermittlung	1 / 2014	4 / 2014			erledigt	●
Planung	5 / 2015	7 / 2016			erledigt	●
Ausführung	8 / 2016	7 / 2018			im Plan	●
Meilenstein		bis				
Raumprogramm		1 / 2014			erledigt	●
Baugesuch		12 / 2015			erledigt	●
Baubeginn		8 / 2016			erledigt	●
Fertigstellung		7 / 2018			unkritisch	●
Hinweise:						
