


INKAS (Projekte > 300.000 €)		Stand: 9/2017		FB 65	Rahmenterminplan																																																	
Blatt 1		STATUS		Jahr: 2017	2017												2018												2019												2020													
Projekt	Kosten	Termine	Auftrag	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9 NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	●	●	721100101017																																																			
10 GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)	●	●	721100112017																																																			
12 San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)	●	●	konsumtiv + investiv																																																			
30 NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)	●	●	721100109007																																																			
31 Ersatzenbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)	●	●	konsumtiv + investiv																																																			
34 NB Schulsporthalle Hoheneck (Ostertag-7)	●	●	742410008017																																																			
35 Brandschutz Eberhard-Ludwig-Schule (Tammer-28)	●	●	konsumtiv + investiv																																																			
36 Erweiterung Schlösslesfeldschule (Brahmweg-30)	●	●	721100104247																																																			
37 Erweiterung Friedensschule (Frieden-10)	●	●	721100102307																																																			
38 Stadtbad Mensa + Besprechungsräume (Alleen-20)	●	●	7794801011007																																																			
42 Brandsch. Schlösslesfeldsch. Altbau (Cornelius-36)	●	●	konsumtiv + investiv																																																			
49 Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	●	●	721100601417																																																			
75 KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)	●	●	736501111007																																																			

Kostenübersicht Haushaltsjahr	2017	Budget	Zahlung
Ergebnishaushalt FB 65		8.280.000	3.976.000
INKAS - Projekte		15.909.000	13.383.438

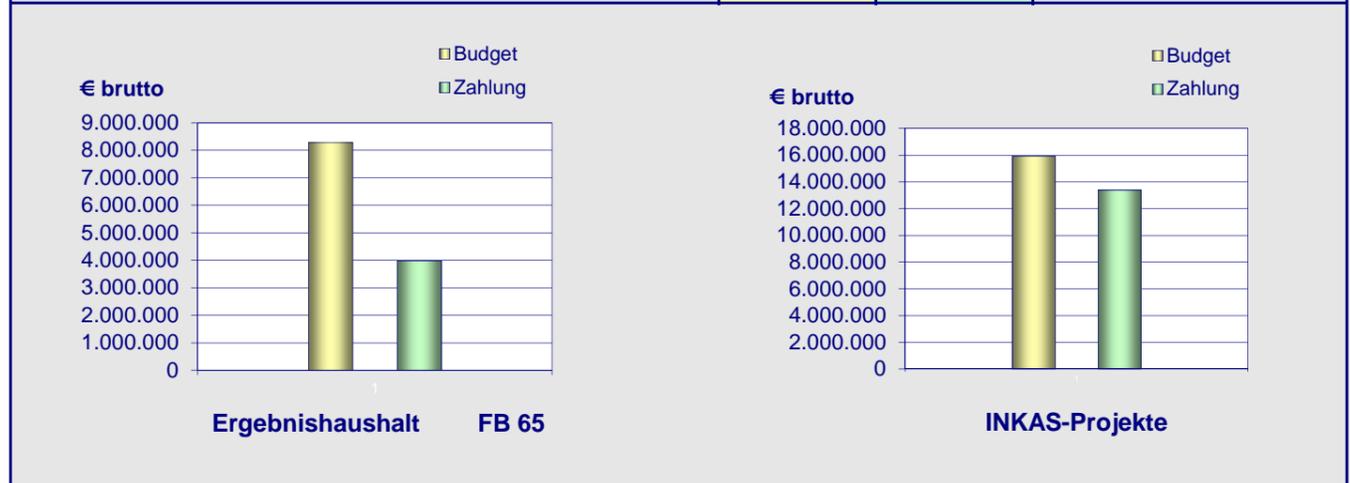

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten

- Günstiger oder nicht teurer
- bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- > 10 %, über 100.000 €

Termine

- entsprechend Rahmenterminplan
- Rahmenterminplan fraglich
- Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 12: gesch. Abrechn. ca. 37.000 € über Beschluss

zu 49: Terminverzögerungen, Details sh. Einzelblatt
