


Projekt							Stand	9/2019	
Danziger 30 - Erweiterung Oststadtschule -							Nr.	0103	
Projektleiter Fachber. 65: Livia Galambos									
bis einschl.								1*: Gesamtkosten einschl. Jahr 2024 und ff.	
Kosten	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Gesamt		
HH-Einstellung	165.000	500.000	3.000.000	3.000.000	3.135.000		9.800.000	1* 2*	
Zahlungsstand	55.059	340.535					395.594		
Kostenschätzung							9.250.000		
Kostenberechnung / genehmigter Beschluss							9.800.000		
Abrechnung geschätzt				100%		●	9.800.000		

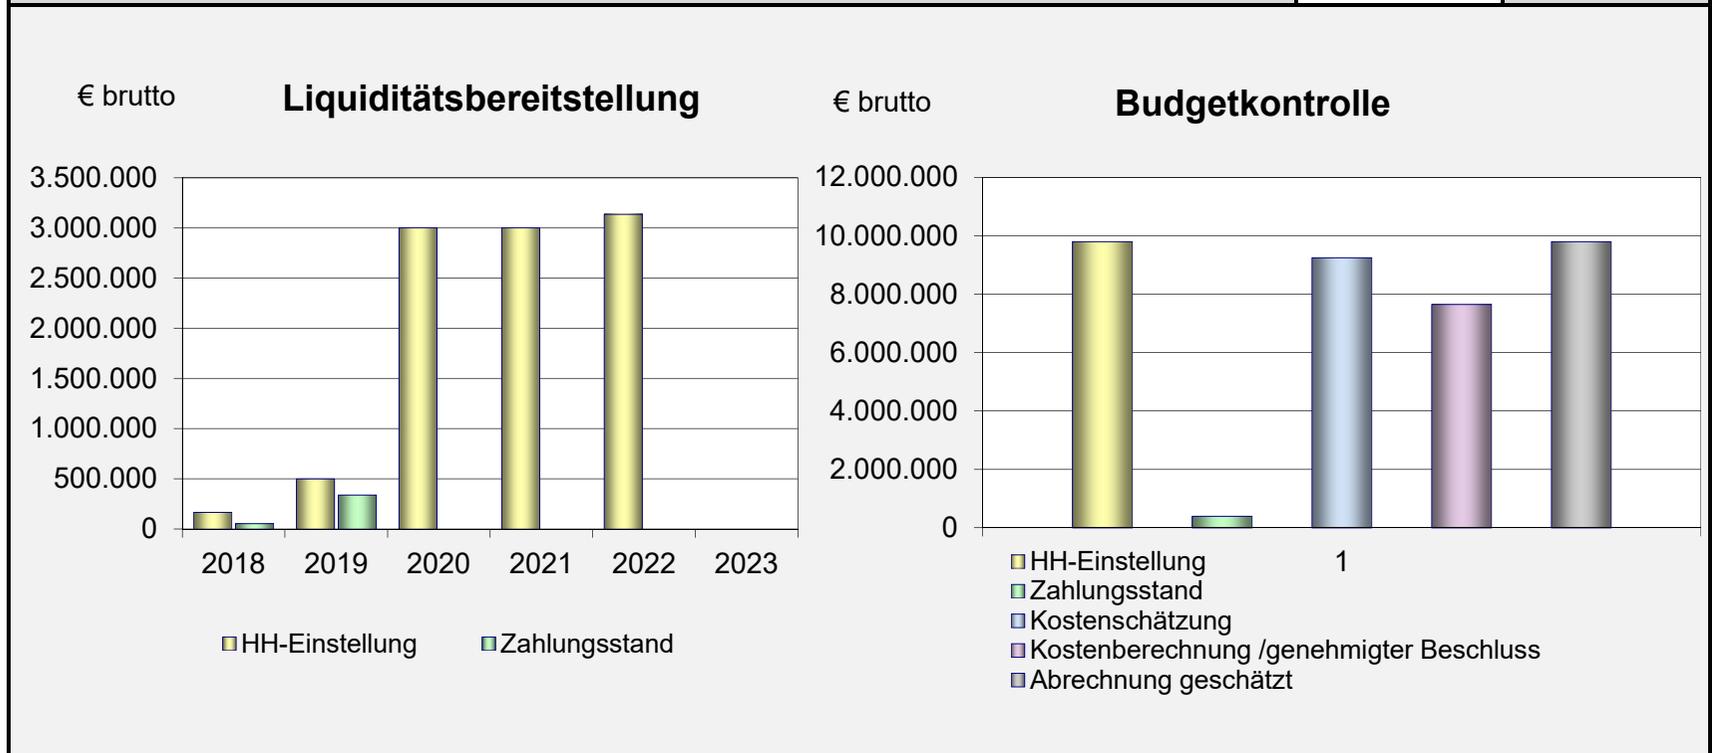

2*: eventuelle Differenzen zum HH- und Finanzplan beruhen auf fachbereichsinternen Budgetumbuchungen
