

Baumaßnahmen 2022 Straßenverkehrsbehörde Stadt Ludwigsburg

FACHBEREICH
SICHERHEIT UND ORDNUNG
Heinz Mayer
Fachbereichsleiter
Ludwigsburg
27.01.2022




Baumaßnahmen 2022





Baumaßnahmen 2022

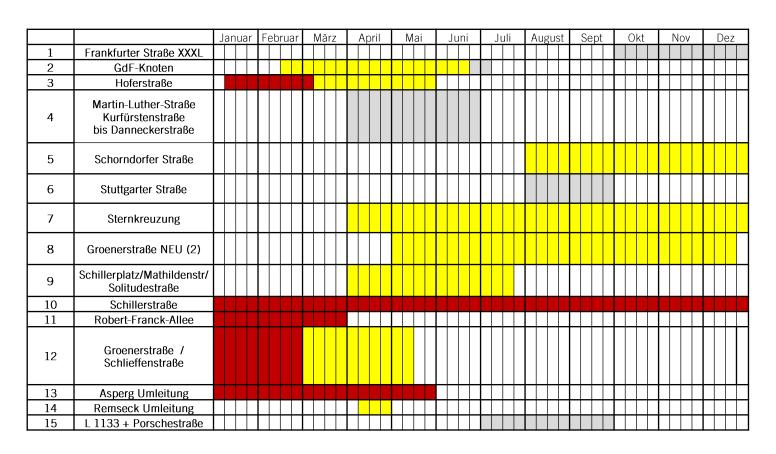




Abgestimmtes Bauprogramm

lfd.Nr	Straße	Wer	Was	Anfang	bis	Dauer	AZ SVB
1	Frankfurter Straße XXXL	XXXL	Umbau	nicht terminiert		4. Quartal?	21/0026
2	GdF-Knoten	K.westhei m	Umbau	14.02.2022	26.06.2022	4 Monate	21/1747
3	Hoferstraße	SWLB	FW - hSp	10.01.2022	Ende Mai 2022	5 Monate	21/0017
4	Martin-Luther-Straße Kurfürstenstraße bis Danneckerstraße	63/68	Markierung Radverkehrs- anlage	nicht terminiert		vor. 2. Quartal 2-3 Wochen	21/1749
5	Schorndorfer Straße	SWLB	W/G - Ampel / hSP	01.08.2022	Dezember	20 Wochen	21/1750
6	Stuttgarter Straße	67	Belag/Spw RPS	vorauss. August (nach Ende Nr 2) abh.von Maßnahme des RPS	Sept	2-3 Wochen	21/1751
7	Sternkreuzung	67	Bauwerk_ abdichtung	Apr 22	Dez	10 Monate	21/1752
8	Groenerstraße NEU (2)	67	Radwegebau Kabelarbeiten	Mai	Dez	7 Monate	21/1746
9	Schillerplatz/Mathildenstr/ Solitudestraße	SWLB	Fernwärme VS	17.01.	22.07.2022	15 Wochen	21/1754
10	Schillersrtaße	KSK LB	hSp	01.01.	31.12.2022	12 Monate	19/0021
11	Robert-Franck-Allee	67	hSp	Okt/Nov	Mrz 22	6 Monate	21/0030
12	Groenerstraße NEU / Schlieffenstraße	SWLB/67	nur FW, Bauabschnitte teilw. unter VS, teilw. hSp	25.10.2021	Anfang Mai 2022	7 Monate	21/0021
13	Asperg Umleitung	LRA LB	VS	29.11.2021	31.05.2022	6 Monate	extern
14	Remseck Umleitung	RPS	VS	14.04.2022	23.04.2022	1 Woche	extern
15	L 1133 + Porschestraße	RPS	VS	Bauanlaufbespr. OT: 23.11.2021	nicht terminiert	3. Quartal	



1 Frankfurter Str. XXL hSp Okt-Dez 2022

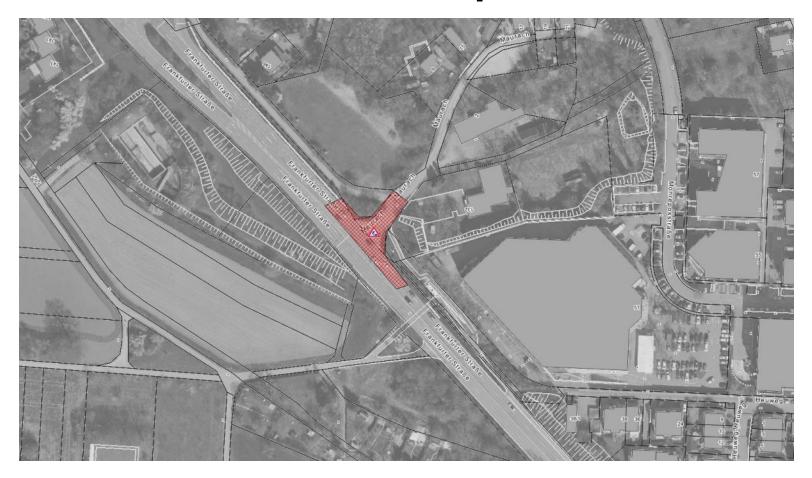



2 GdF-Knoten. **hSp** 14.02.-26.06.2022





3 Hoferstraße **hSp** 28.02.-31.07.2022





4 Martin-Luther/Kurfürstenstraße Rad






5 Schorndorfer Str. **hSp** Aug. - Dez. 2022






6 Stuttgarter Str. hSp Aug – Sept 2022

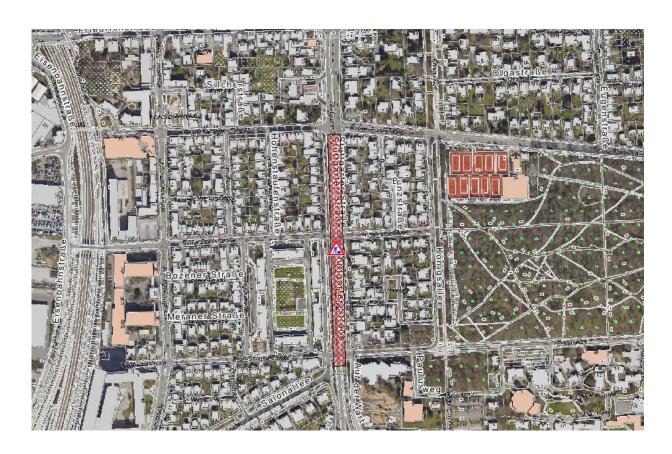




7 Sternkreuzung 19.April – Dez 2022

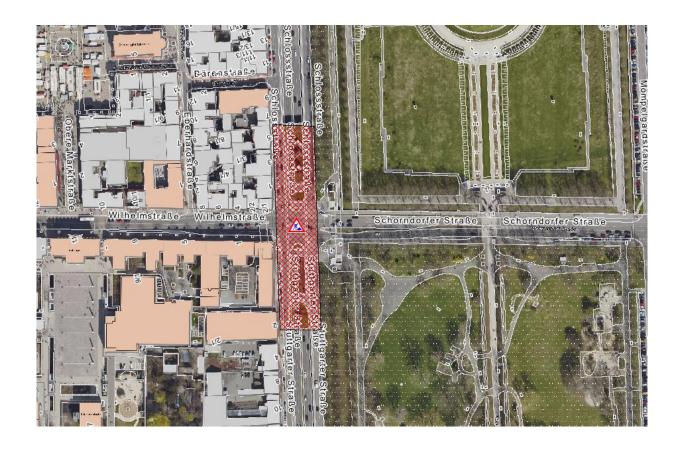



8 Gronerstraße Rad Mai - Dez 2022

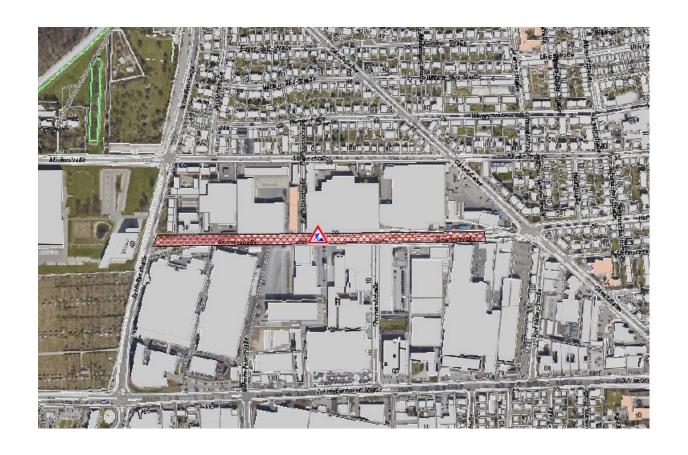




9 Schillerpl./Mathildenstr. VS April – Juli 22





10 Schillerstr. **hSp** 01.01.21-31.12.2022

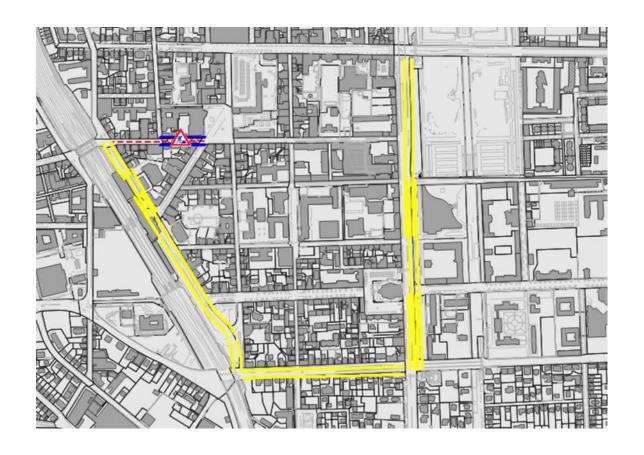



11 R.-Franck-A./Aldinger Str. hsSp Jan-Mrz 22



Baumaßnahmen auf Hauptverkehrsstraßen und Straßen mit hoher Verkehrsbedeutung



12 Groenerstraße NEU **hSp** 01.01-01.05.2022





Baumaßnahmen 2022 Straßenverkehrsbehörde Stadt Ludwigsburg

ENDE



Veränderungen zeitlicher Ablauf Stand Mrz.22



Veränderungen zeitlicher Ablauf Stand Mrz.22
