
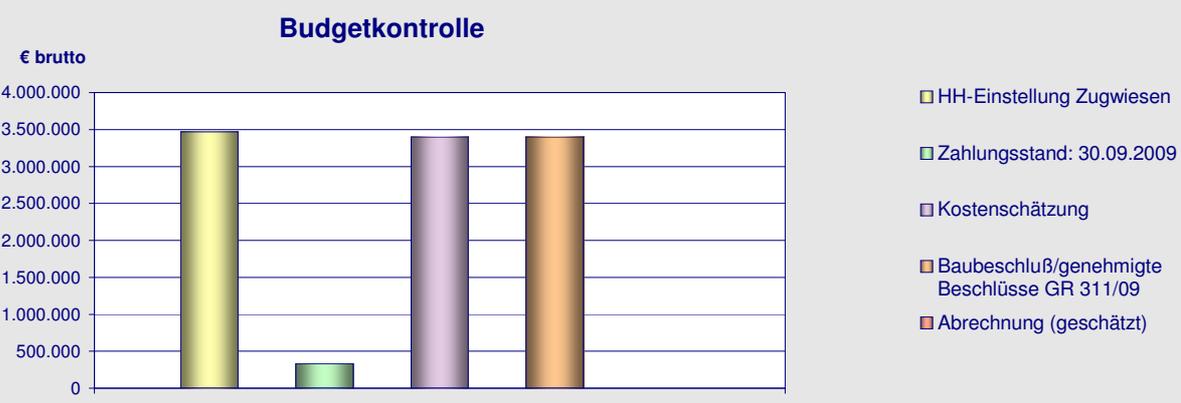


Projekt	Stand: 30.09.2009	Finanzposition	HHST	1a																				
Uferwiesen Hoheneck		2.6110.9550.000-0002 PSP - I00530408400903F	VH																					
Projektleiter Fachber. 67:	Bernd Wenger		Telefon:	2759																				
KOSTEN																								
	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt																		
HH-Einstellung Uferwiesen	70.000	500.000	80.000			650.000																		
Zahlungsstand: 30.09.2009	69.509	260.379				329.888																		
Kostenberechnung ohne WSA-Anteil			vom 28.03.2008			580.000																		
Bau- und Vergabebeschuß BTU 578/08			vom 17.12.2008			625.000																		
Abrechnung (geschätzt)																								
<p>€ brutto</p> <p>Liquiditätsbereitstellung</p> <table border="1"> <caption>Liquiditätsbereitstellung (€ brutto)</caption> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>HH-Einstellung Uferwiesen</th> <th>Zahlungsstand: 30.09.2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>70.000</td> <td>69.509</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>500.000</td> <td>260.379</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>80.000</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Haushaltsjahr	HH-Einstellung Uferwiesen	Zahlungsstand: 30.09.2009	2008	70.000	69.509	2009	500.000	260.379	2010	80.000		2011			2012		
Haushaltsjahr	HH-Einstellung Uferwiesen	Zahlungsstand: 30.09.2009																						
2008	70.000	69.509																						
2009	500.000	260.379																						
2010	80.000																							
2011																								
2012																								
<p>€ brutto</p> <p>Budgetkontrolle</p> <table border="1"> <caption>Budgetkontrolle (€ brutto)</caption> <thead> <tr> <th>Kategorie</th> <th>Wert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HH-Einstellung Uferwiesen</td> <td>650.000</td> </tr> <tr> <td>Zahlungsstand: 30.09.2009</td> <td>329.888</td> </tr> <tr> <td>Kostenberechnung ohne WSA-Anteil</td> <td>580.000</td> </tr> <tr> <td>Bau- und Vergabebeschuß BTU 578/08</td> <td>625.000</td> </tr> <tr> <td>Abrechnung (geschätzt)</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Kategorie	Wert	HH-Einstellung Uferwiesen	650.000	Zahlungsstand: 30.09.2009	329.888	Kostenberechnung ohne WSA-Anteil	580.000	Bau- und Vergabebeschuß BTU 578/08	625.000	Abrechnung (geschätzt)							
Kategorie	Wert																							
HH-Einstellung Uferwiesen	650.000																							
Zahlungsstand: 30.09.2009	329.888																							
Kostenberechnung ohne WSA-Anteil	580.000																							
Bau- und Vergabebeschuß BTU 578/08	625.000																							
Abrechnung (geschätzt)																								
TERMINE																								
Phase	SOLL	IST	STATUS																					
	von	bis	von	bis																				
Grundlagenermittlung			2004	2006	●																			
Planung	2006	2008	2006	2008	●																			
Ausführung	2008	2010			●																			
Meilenstein	bis		bis																					
Ausschreibung (inzwischen aufgehoben)	Juni 2008	Juli 2008			●																			
Ausschreibung (neu)	Sept. 2008	Nov. 2008	Sept. 2008		●																			
Vergabebeschuß		Dez. 2008			●																			
Baubeginn	Feb. 2009	März 2009	März 2009		●																			
Fertigstellung		Nov. 2009		März 2010	●																			
Hinweise:	<ul style="list-style-type: none"> - Beauftragung Verlegung Lichtwellenleiterkabel im Wegebereich durch WSA noch offen - Führung Wegetrassen und Ausbaustandard für Rad- und Fußweg noch nicht festgelegt 																							

Zugewiesen	2.6110.9550.000-0002 PSP - IB0123409650903F	VH
-------------------	--	-----------

Projektleiter Fachber. 67:	Günter Schlecht	Telefon: 2749
----------------------------	------------------------	----------------------


KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
HH-Einstellung Zugewiesen	240.000	30.000	300.000	1.200.000	1.200.000	500.000	3.470.000	
Zahlungsstand: 30.09.2009	239.416	29.562	61.550				330.528	
Kostenschätzung	vom Juni 2009						3.400.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 311/09	vom 22.07.2009						3.400.000	
Abrechnung (geschätzt)								

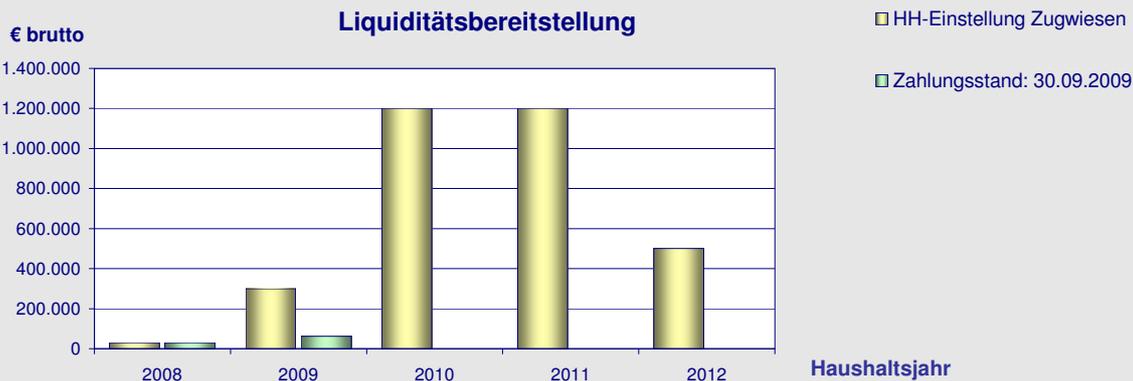

TERMINE	SOLL		IST		STATUS
	von	bis	von	bis	
Grundlagenermittlung			1998	1999	●
Planung			2000	2009	●
Ausführung	2010	2012			●
Meilenstein	bis		bis		
Ausschreibung	Jan. 2010	Feb. 2010			●
Vergabebeschluß		März 2010			●
Baubeginn		Apr. 2010			●
Fertigstellung		März 2012			●

Hinweise:	- ohne Grunderwerb
------------------	--------------------

Projekt	Stand: 30.09.2009	Finanzposition	HHST	2			
Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten		2.6153.9610.000-1103	VH				
Projektleiter Fachber. 67:		Herbert Wieland	Telefon:	2593			
KOSTEN bis einsch.							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
HH-Einstellung		0	100.000	0	300.000	260.000	660.000
Zahlungsstand: 30.09.2009			0				0
Kostenschätzung FB 67 vom 23. Sep 05							660.000
Kostenberechnung vom							
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse vom							
Abrechnung (geschätzt)							

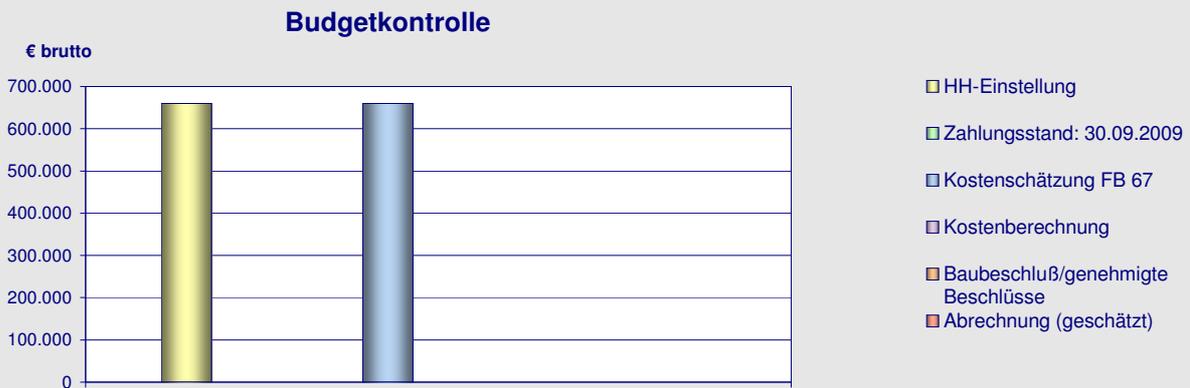

TERMINE		SOLL		IST		STATUS
Phase	von	bis	von	bis		
Grundlagenermittlung						
Planung						
Ausführung						
Meilenstein		bis		bis		
Ausschreibung						
Vergabebeschuß						
Baubeginn						
Fertigstellung						
Hinweise:	- Ansatz 2009 ist Haushaltsrest aus 2008					

Projekt		Stand: 30.09.2009		Finanzposition			HHST	3
Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Haupt.-/Lechtstraße				2.6153.9610.000-1104			VH	
Projektleiter Fachber. 67:		Herbert Wieland			Telefon:			2593
KOSTEN		bis einsch.						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
HH-Einstellung					50.000	300.000	300.000	650.000
Zahlungsstand: 30.09.2009				0				0
Kostenschätzung Wüstenrot								900.000
Kostenberechnung								
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse								
Abrechnung (geschätzt)								

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Haushaltsjahr

Budgetkontrolle

€ brutto


Phase	TERMINE		SOLL		IST		STATUS
	von	bis	von	bis	von	bis	
Grundlagenermittlung							
Planung							
Ausführung							
Meilenstein		bis		bis			
Ausschreibung							
Vergabebeschuß							
Baubeginn							
Fertigstellung							

Hinweise:	Die Aufstockung um 250.000 € erfolgt im HH-Jahr 2013 Rathausplatz und Fährstraße wurden herausgenommen (jetzt gesonderte FiPo's)
------------------	---

Projekt Akademiehof Oberflächengestaltung (städt. Anteil)	Stand: 30.09.2009	Finanzposition 2.6157.9640.000-0112	HHST VH	4			
Projektleiter Fachber. 67: Achim Leban			Telefon: 2596				
		Anteil PAG: 650.000 €					
		Anteil Stadt: 1.550.000 €					
		Gesamt Oberfläche: 2.200.000 €					
KOSTEN	bis einschl.						
	2007	2008	2009	2010			
				2011			
				2012			
				Gesamt			
HH-Einstellung (nur Stadtanteil)		132.000	1.168.000	250.000			1.550.000
Zahlungsstand: 30.09.2009		131.933	284.901				416.834
Kostenschätzung	vom 02.10.2007 mit PAG-Anteil						2.200.000
Kostenberechnung	vom 16.04.2008 mit PAG-Anteil						2.211.020
Entwurfsbeschluß BTU 199/08	vom 28.05.2008 mit PAG-Anteil						2.200.000
Abrechnung (geschätzt)							

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

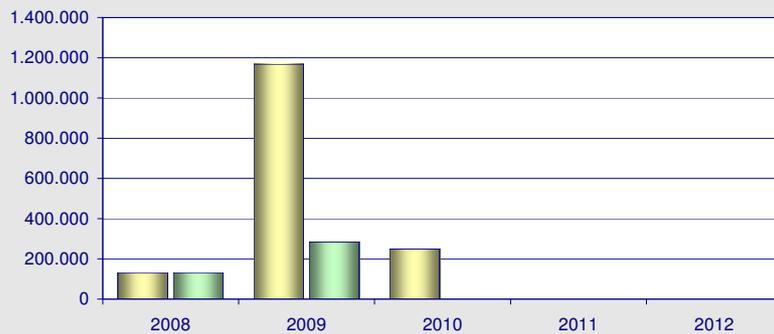


■ HH-Einstellung (nur Stadtanteil)
■ Zahlungsstand: 30.09.2009

Haushaltsjahr

€ brutto

Budgetkontrolle

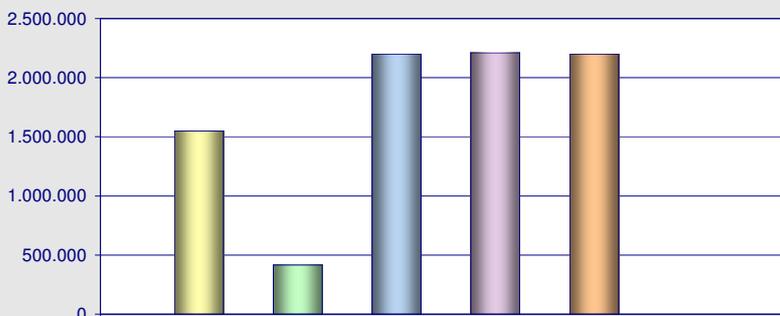

■ HH-Einstellung (nur Stadtanteil)
■ Zahlungsstand: 30.09.2009
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Entwurfsbeschluß BTU 199/08
■ Abrechnung (geschätzt)


TERMINE

Phase	SOLL		IST		STATUS
	von	bis	von	bis	
Grundlagenermittlung			Juli 2007	Dez. 2007	●
Planung		Nov. 2008	Jan. 2008	Nov. 2008	●
Ausführung	Mai 2009	Nov. 2009			●
Meilenstein	bis		bis		
Ausschreibung	Nov/Dez 2008	Jan. 2009	Dez. 2008	Jan. 2009	●
Vergabebeschluß	Feb. 2009	März 2009		12.03.2009	●
Baubeginn	Mai 2009	Juni 2009	April 2009		●
Fertigstellung		Nov. 2009			●

Hinweise:

- Im Untergrund wurden verschiedene unbekannte Keller und Verfüllungen angetroffen. Für die Bespielung des Akademiehofs durch die ADK sind zusätzlich Aufwendungen erforderlich (ca. 120.000 €).
Im Ansatz 2009 sind 168.000 € HH-Reste aus 2008 enthalten, die im Nachtrag neu beantragt wurden.

Projekt Kaffeeberg Planung und Umgestaltung	Stand: 30.09.2009	Finanzposition 2.6157.9640.000-0131	HHST VH	5			
Projektleiter Fachber. 67: Martin Renz			Telefon: 2694				
KOSTEN bis einsch.							
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
HH-Einstellung		690.000	200.000				890.000
Zahlungsstand: 30.09.2009		685.617	62.446				748.063
Kostenschätzung vom							
Kostenberechnung vom Nov. 2007							850.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 133/08 vom 09.04.2008							890.000
Abrechnung (geschätzt) vom 09.04.2008 Gesamtkosten							760.000

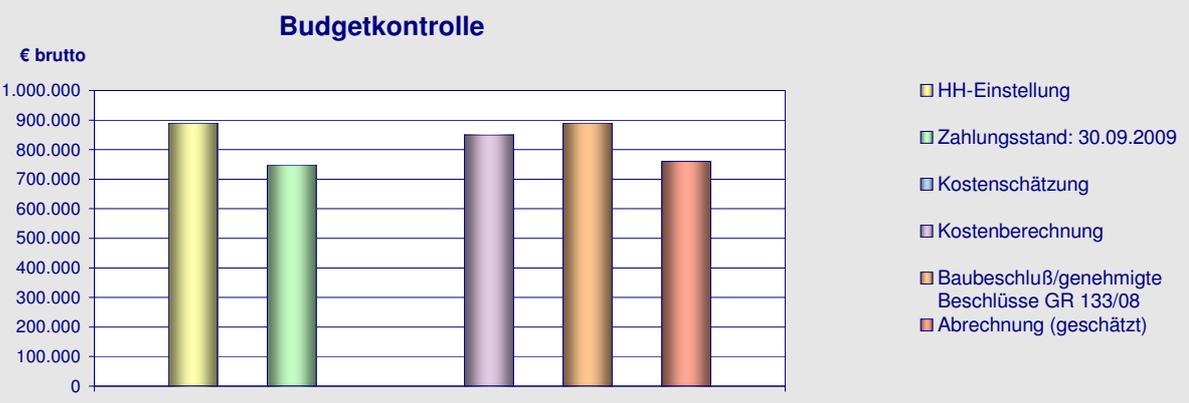

Phase	TERMINE		SOLL		IST		STATUS
	von	bis	von	bis	von	bis	
Grundlagenermittlung							
Planung						Feb. 2008	●
Ausführung	April 2008	Nov. 2008			April 2008		●
Meilenstein	bis				bis		
Ausschreibung						29.02.2008	●
Vergabebeschuß						09.04.2008	●
Baubeginn	April 2008					16.04.2008	●
Fertigstellung		Nov. 2008				Okt. 2008	●

Hinweise: - Ansatz 2009 ist Haushaltsrest aus 2008


Königsallee Sanierung	2.6300.9640.000-0501 Straßenbau 2.6300.9540.000-0002 Alleen	VH
------------------------------	--	----

Projektleiter Fachber. 67:	Oskar Frühwirth/Bernd Wenger	Telefon: 2495
----------------------------	-------------------------------------	----------------------

KOSTEN	bis einschl.							Gesamt
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
HH-Einstellung		254.000	75.000				329.000	
HH-Einstellung Straßenbau		226.000	75.000					
HH-Einstellung Alleen		28.000	0					
Zahlungsstand: 30.09.2009		253.248	48.089				301.337	
Straßenbau Stand: 30.09.2009		225.807	47.789					
Alleen Stand: 30.09.2009		27.441	300					
Kostenschätzung			vom Aug. 2007				460.000	
Kostenberechnung BTU 376/07			vom 15. Nov 2008				455.000	
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse BTU 079/08			vom 13. Mrz 2008				415.000	
Abrechnung (geschätzt)							415.000	

€ brutto


Liquiditätsbereitstellung

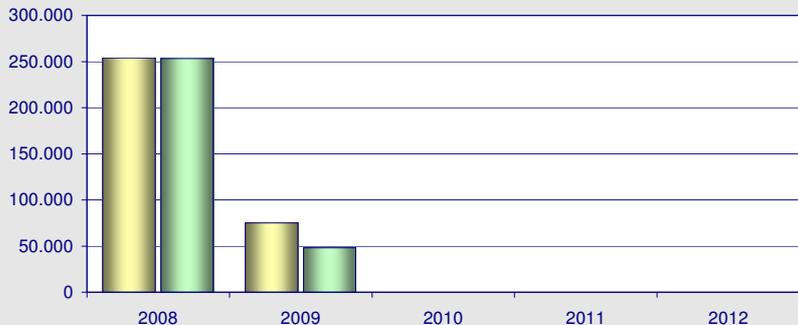

Legend:
■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 30.09.2009

€ brutto

Budgetkontrolle

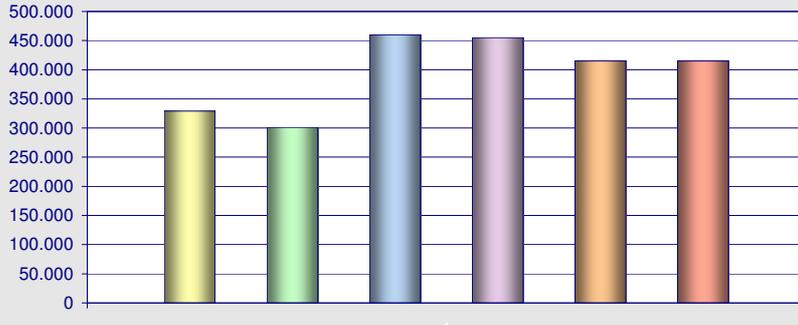

Legend:
■ HH-Einstellung
■ Zahlungsstand: 30.09.2009
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung BTU 376/07
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse BTU 079/08
■ Abrechnung (geschätzt)

TERMINE	SOLL		IST		STATUS
Phase	von	bis	von	bis	
Grundlagenermittlung					
Planung			Mai 2007	Aug. 2007	●
Ausführung	März 2008	Nov. 2008	März 2008	Nov. 2008	●
Meilenstein	bis		bis		
Ausschreibung					
Vergabebeschuß				13.03.2008	●
Baubeginn				März 2008	●
Fertigstellung Straßenbau		Aug. 2008		Aug. 2008	●
Fertigstellung Alleen		Nov. 2008		Nov. 2008	●


Hinweise: - Ansatz 2009 ist Haushaltsrest aus 2008

Projektleiter Fachber. 67:	Hansjoachim Heck	Telefon: 2632
----------------------------	-------------------------	----------------------

KOSTEN	bis einsch.							Gesamt
	2007	2008	2009	2010	2011	2012		
HH-Einstellung	109.000	784.000	587.000					1.480.000
Zahlungsstand: 30.09.2009	109.032	783.128	410.524					1.302.684
Kostenberechnung vom Juni 2007								1.480.000
Entwurfs/Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 197/07 vom 27.06.2007								1.480.000
Vergabebeschlüsse gesamt								1.478.000
Vergabebeschluß Straßenbau BTU 401/07 Sept.2007								1.220.000
sonstige Vergaben (Grünfläche, Straßenbeleuchtung)								130.000
Planungskosten BTU 055/03 43.000 € / BTU 182/07 85.000€								128.000

€ brutto

Liquiditätsbereitstellung

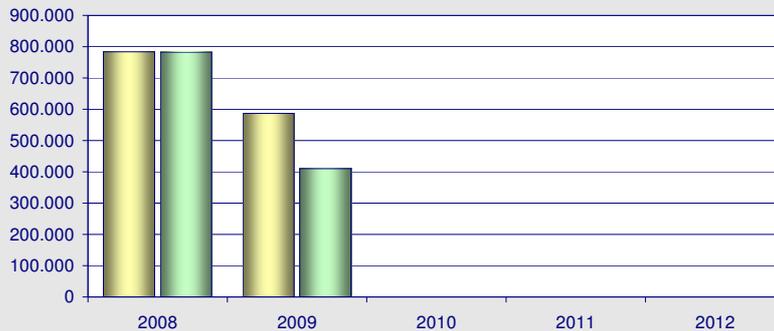


HH-Einstellung
 Zahlungsstand: 30.09.2009

Haushaltsjahr

Budgetkontrolle

€ brutto

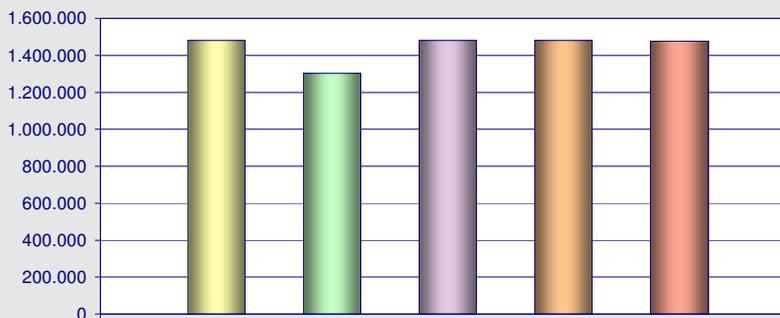

HH-Einstellung
 Zahlungsstand: 30.09.2009
 Kostenberechnung
 Entwurfs/Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse GR 197/07
 Vergabebeschlüsse gesamt

TERMINE

SOLL

IST

STATUS

Phase	von	bis	von	bis	STATUS
Grundlagenermittlung					
Planung					
Ausführung	Okt. 2007	Nov. 2008	Okt. 2007	Dez. 2008	●
Meilenstein	bis		bis		
Ausschreibung				09.08.2007	
Vergabebeschluß BTU 401/07				13.09.2007	
Baubeginn	Okt. 2007			15.10.2007	●
Fertigstellung		Dez. 2008		19.12.2008	●

Hinweise:

- Summe Vergabebeschluß wird voraussichtlich nicht erreicht; Schlußabrechnung liegt ungeprüft mit 1.045.000 € vor
- Ansatz 2009 enthält Haushaltsrest aus 2008 in Höhe von 407.000 €

Projekt		Stand: 30.09.2009		Finanzposition			HHST	8a
Bauausgaben Bahnsteigunterführung ab HH 2009		ab HH 2009		2.7920.9610.000-0101			VH	
Projektleiter Fachber. 67:		Hansjoachim Heck				Telefon:		2632
KOSTEN		bis einschl.						
		2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
HH-Einstellung			487.500	812.500				1.300.000
Zahlungsstand: 30.09.2009			468.500	0				468.500
Kostenschätzung		vom Feb. 2005 ohne MwSt-Erhöhung						1.185.000
Kostenberechnung		vom Okt. 2005 DB						1.237.000
Entwurfsbeschluß		vom Feb. 2005 Vorlage Nr. 051/05						1.195.000
Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit DB GR 635/07		vom 20.12.2007						1.300.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Haushaltsjahr

- HH-Einstellung
- Zahlungsstand: 30.09.2009

Budgetkontrolle

€ brutto

- HH-Einstellung
- Zahlungsstand: 30.09.2009
- Kostenschätzung
- Kostenberechnung
- Entwurfsbeschluß
- Bau- und Finanzierungsvereinbarung mit DB GR 635/07 vom 20.12.2007

Phase	TERMINE		SOLL		IST		STATUS
	von	bis	von	bis	von	bis	
Meilenstein							
Ausschreibung Tunnel	Jan 2008	März 2008			Jan 2008	März 2008	●
Rohbau Tunnel	Mai 2008	Juli 2008			Mai 2008	Juli 2008	●
Ausbau Tunnel	Nov 2008	Sept 2009			Mai 2008	Sept 2009	●

Hinweise	Maßnahme ist bis auf DB-Wegweisung und Fahrradparkhaus fertiggestellt. Schlußabrechnungen liegen noch nicht vor.
-----------------	---

Projekt Bauausgaben Pflugfelder Straße	Stand: 30.09.2009 ab HH 2009	Finanzposition 2.7920.9640.000-0101	HHST VH	8b																																													
Projektleiter Fachber. 67: Hansjoachim Heck		Telefon: 2632																																															
KOSTEN bis einsch.																																																	
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt																																										
HH-Einstellung		337.800	812.200				1.150.000																																										
Zahlungsstand: 30.09.2009	181.534	14.753	752.557				948.844																																										
Kostenschätzung Büro Baldauf vom Feb. 2005							1.215.000																																										
Kostenberechnung Büro ISTW vom 25.03.2008							960.000																																										
Entwurfsbeschuß vom Feb. 2005 Vorlage Nr. 051/05							1.215.000																																										
Baubeschuß vom 26.11.2008 Vorlage Nr. 529/08							990.000																																										
Liquiditätsbereitstellung																																																	
<table border="1"> <caption>Liquiditätsbereitstellung (€ brutto)</caption> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>HH-Einstellung</th> <th>Zahlungsstand: 30.09.2009</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>337.800</td> <td>181.534</td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>812.200</td> <td>752.557</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Haushaltsjahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2009	2008	337.800	181.534	2009	812.200	752.557	2010			2011			2012																										
Haushaltsjahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2009																																															
2008	337.800	181.534																																															
2009	812.200	752.557																																															
2010																																																	
2011																																																	
2012																																																	
Budgetkontrolle																																																	
<table border="1"> <caption>Budgetkontrolle (€ brutto)</caption> <thead> <tr> <th>Haushaltsjahr</th> <th>HH-Einstellung</th> <th>Zahlungsstand: 30.09.2009</th> <th>Kostenschätzung Büro Baldauf</th> <th>Kostenberechnung Büro ISTW</th> <th>Entwurfsbeschuß</th> <th>Baubeschluß</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2008</td> <td>337.800</td> <td>181.534</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2009</td> <td>812.200</td> <td>752.557</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>								Haushaltsjahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2009	Kostenschätzung Büro Baldauf	Kostenberechnung Büro ISTW	Entwurfsbeschuß	Baubeschluß	2008	337.800	181.534					2009	812.200	752.557					2010							2011							2012						
Haushaltsjahr	HH-Einstellung	Zahlungsstand: 30.09.2009	Kostenschätzung Büro Baldauf	Kostenberechnung Büro ISTW	Entwurfsbeschuß	Baubeschluß																																											
2008	337.800	181.534																																															
2009	812.200	752.557																																															
2010																																																	
2011																																																	
2012																																																	
TERMINE																																																	
Phase	SOLL		IST		STATUS																																												
	von	bis	von	bis																																													
Grundlagenermittlung																																																	
Planung Pflugfelderstr.	Jan 2008	Juli 2008			●																																												
Ausführung Pflugfelderstr.	Okt 2008	Sept 2009	Nov 2008	Sept 2009	●																																												
Meilenstein	bis			bis																																													
Ausschreibung Pflugfelderstr	Juli 2008	Sept 2008	Juli 2008	18.09.2008	●																																												
Baubeginn Pflugfelderstr		Okt 2008	Feb 2009		●																																												
Fertigstellung Pflugfelderstr		Sept 2009	Feb 2009	Sept 2009	●																																												
Bau- und Vergabebeschuß voraussichtlich	BTU 06.11.08	GR 26.11.08			●																																												
Hinweise:	- Ansatz 2009 enthält Haushaltsrest aus 2008 in Höhe von 312.200 € Maßnahme ist abgeschlossen, Schlußabrechnungen liegen noch nicht vor.																																																

Projekt	Stand: 30.09.2009	Finanzposition	HHST	8c			
Anteil Hoch-/Tiefbau an Westportal ab HH 2009		2.7920.9620.000-0101	VH				
Projektleiter Fachber. 23:	Olaf Dienelt	Telefon:	2701				
KOSTEN	bis einsch.						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
HH-Einstellung			2.080.000				2.080.000
Zahlungsstand: 30.09.2009		119.000	1.072.319				1.191.319
Kostenschätzung	vom Okt 2007						1.900.000
Kostenberechnung	vom Okt 2007						1.900.000
Entwurfsbeschluß	Vorl. Nr. 462/07 vom 18.10.2007 , Vorl. Nr. 074/09 Aufstockung 180.000 €						2.080.000
<h3 style="text-align: center;">Liquiditätsbereitstellung</h3> <p>€ brutto</p> <p style="text-align: right;">Haushaltsjahr</p>							
<h3 style="text-align: center;">Budgetkontrolle</h3> <p>€ brutto</p>							
TERMINE		SOLL		STATUS			
Phase	von	bis					
Planung	Juli 2007	Dez. 2007					●
Ausführung	Jan. 2008	Okt. 2009					●
Meilenstein	bis						
Option Westausgang		Juli 2007					●
Baugesuch		Jan. 2008					●
Baubeginn		März 2008					●
Fertigstellung		Okt. 2009					●
Hinweise:	- Aufstockung in Höhe von 180.000 € ist erfolgt über den Nachtragshaushalt 2009						

Projekt Mathildenstraße	Stand: 30.09.2009	Finanzposition 2.6157.9640.000-0114	HHST VH	9			
Projektleiter Fachber. 67: Martin Renz		Telefon: 2694					
KOSTEN	bis einsch.						
	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Gesamt
HH-Einstellung (Gesamtkosten für 2009 angemeldet)		9.000	941.000	70.000			1.020.000
Zahlungsstand: 30.09.2009		8.755	948.236				956.991
Kostenschätzung		vom					
Kostenberechnung		vom 23.04.2008					1.080.000
Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse		vom 11. Mrz 09					1.080.000
Abrechnung (geschätzt)							1.080.000

Liquiditätsbereitstellung

€ brutto

Legend:
■ HH-Einstellung (Gesamtkosten für 2009 angemeldet)
■ Zahlungsstand: 30.09.2009

Haushaltsjahr

Budgetkontrolle

€ brutto

Legend:
■ HH-Einstellung (Gesamtkosten für 2009 angemeldet)
■ Zahlungsstand: 30.09.2009
■ Kostenschätzung
■ Kostenberechnung
■ Baubeschluß/genehmigte Beschlüsse
■ Abrechnung (geschätzt)

TERMINE	SOLL	IST	STATUS		
Phase	von	bis	von	bis	STATUS
Grundlagenermittlung					
Planung	Mai 2008	Dez. 2008			●
Ausführung	April 2009	Sep. 2009			●
Meilenstein	bis		bis		
Ausschreibung		Feb. 2009	Jan. 2009		●
Vergabebeschuß		März 2009	März 2009		●
Baubeginn		April 2009	März 2009		●
Fertigstellung		Okt. 2009		August 2009	●

Hinweise:	Im Ansatz 2009 sind 41.000 € HH-Reste aus 2008 enthalten, die im Nachtrag neu beantragt wurden.
------------------	---
