



LUDWIGSBURG


Kindertageseinrichtung Schlösslesfeld / InterimsKiTa St. Paulus

SHL am 23.07.2019 / GR am 24.07.2019 / **GR 25.09.2019**







Beschluss Raumprogramm 3-gruppige KiTa am 08.05.2019 im BSS

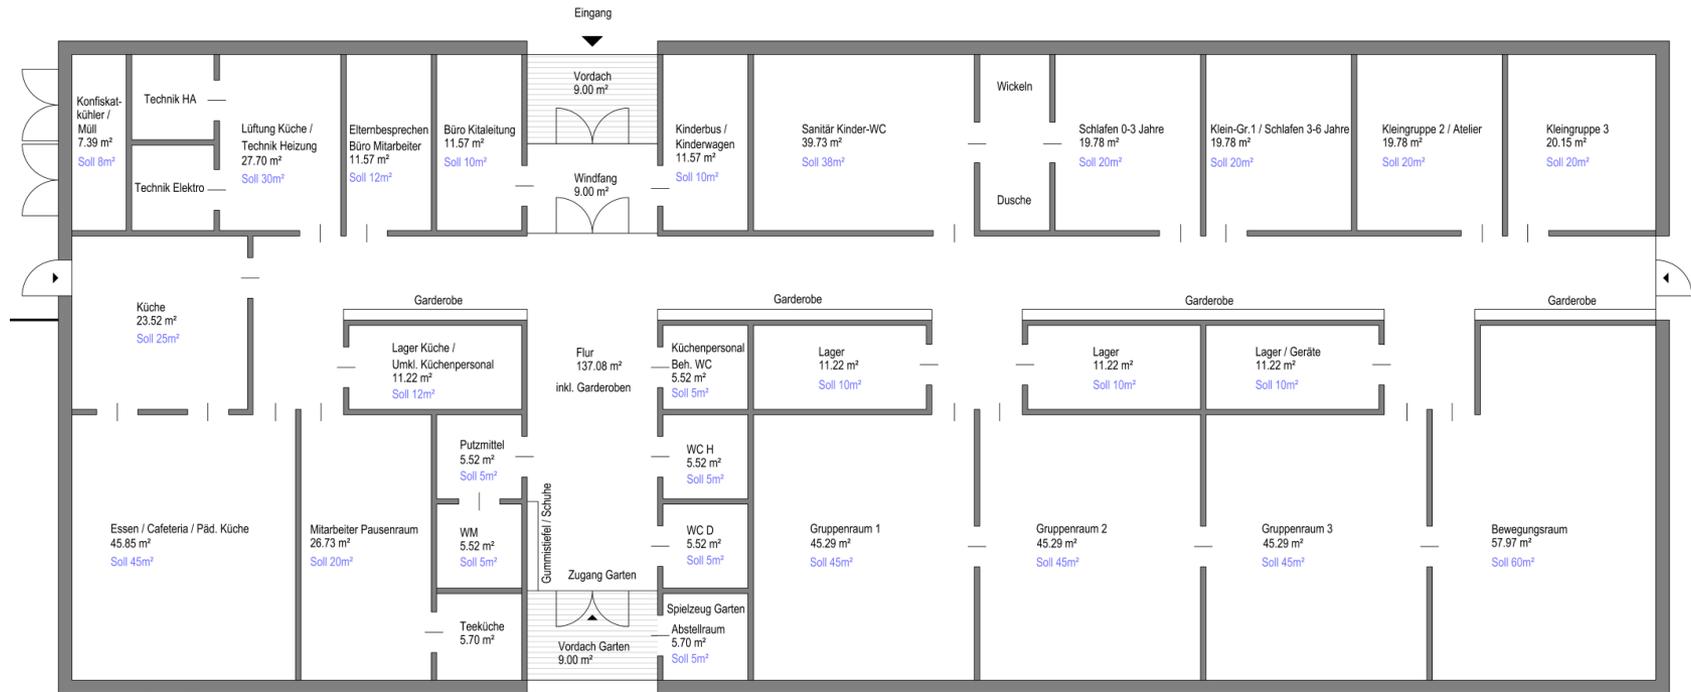

Nettogrundfläche 710 m² / rd. 900 m² BGF



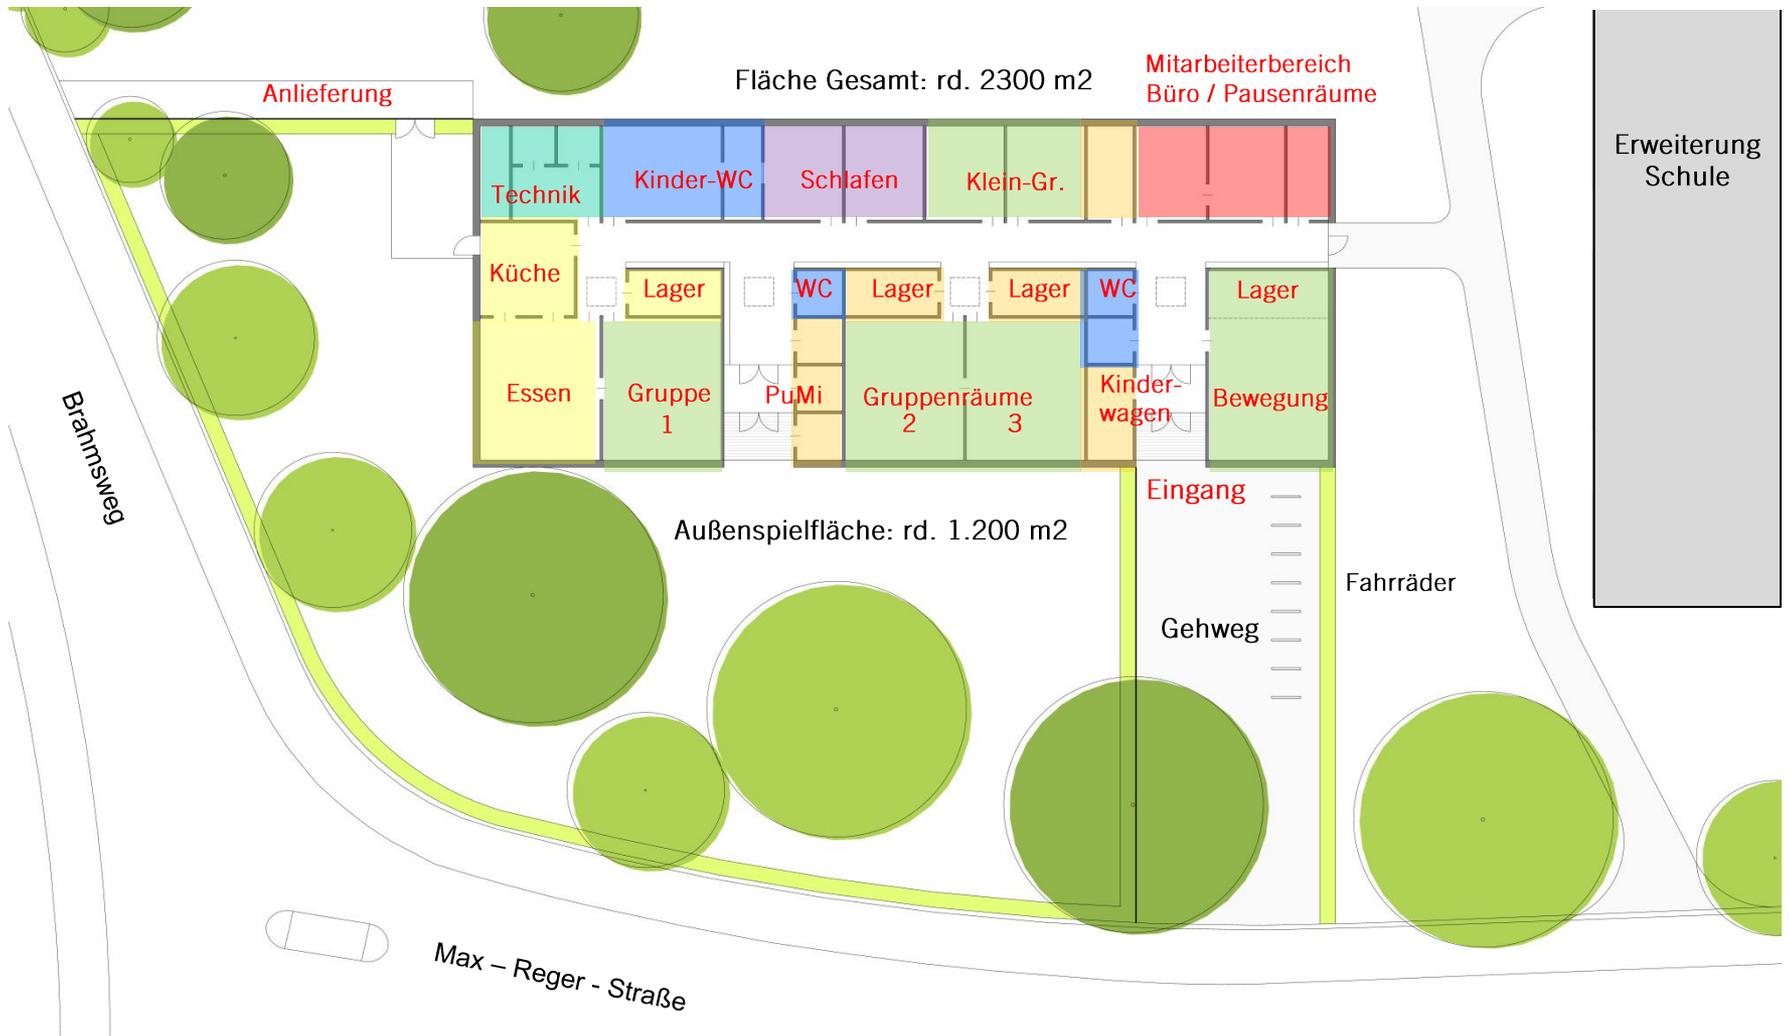

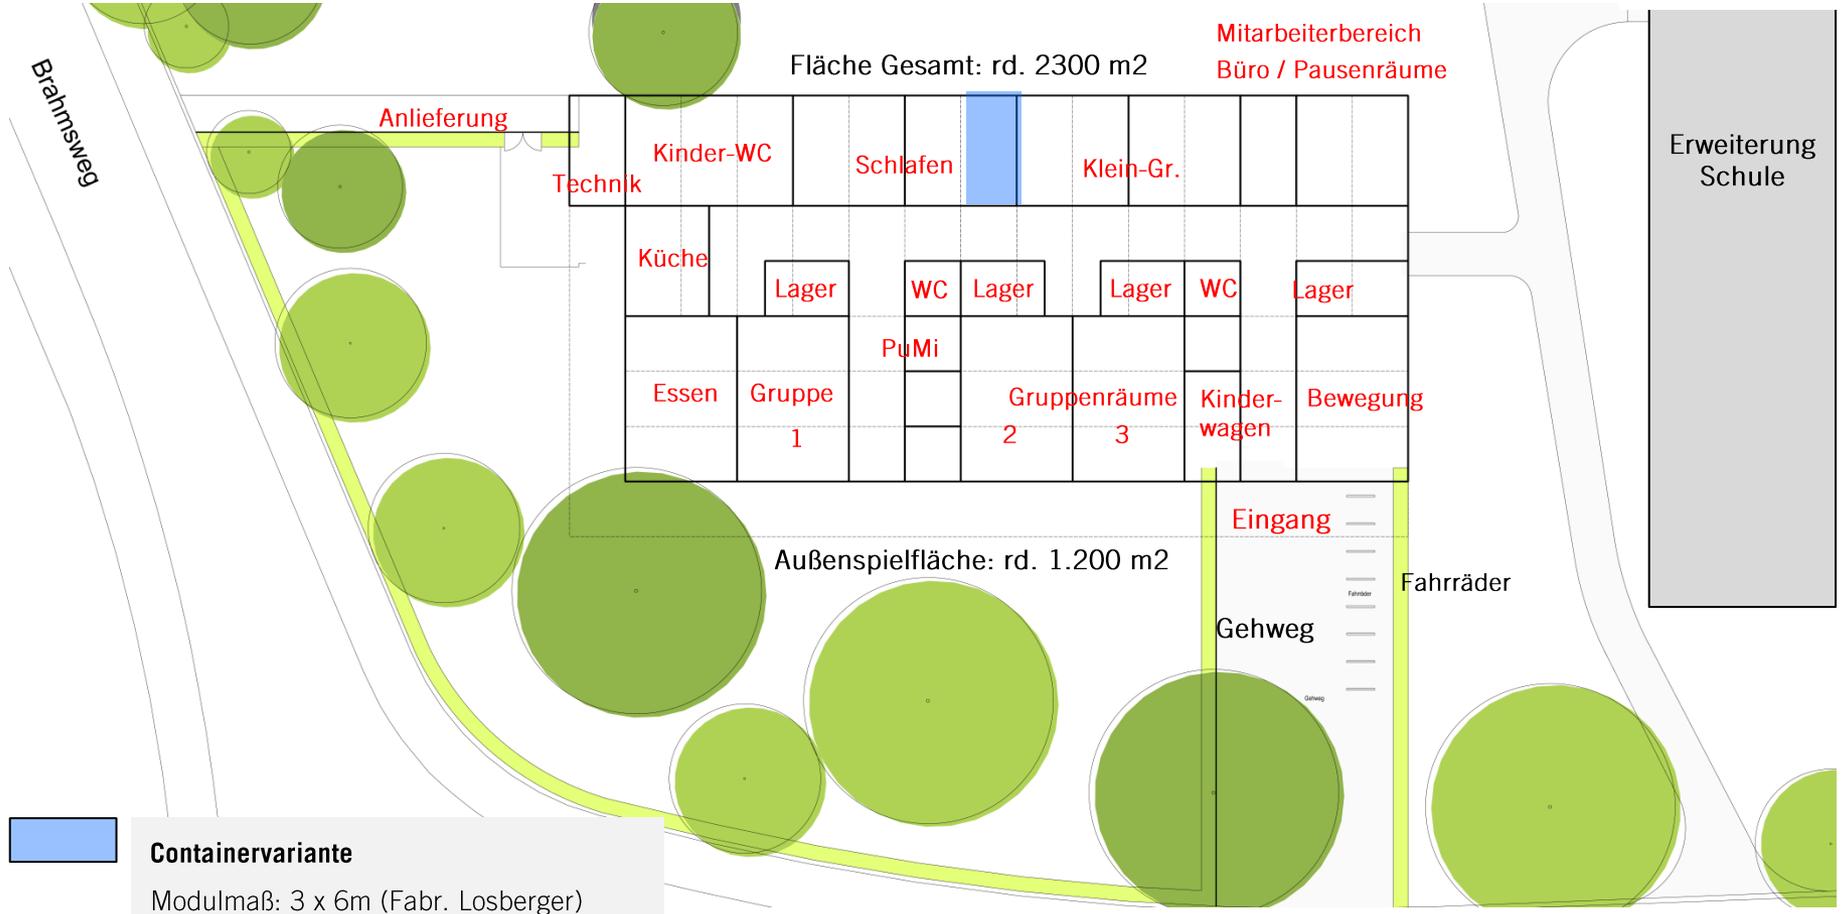

Containervariante

Modulmaß: 3 x 6m (Fabr. Losberger)
 Anzahl Module: 50 / BGF: rd. 900 m²
 rd. 1,4 Mio. EUR (ohne Außenanlagen)



Beschluss Raumprogramm durch BSS

05/2019 ✓



Terminentwicklung

SHL 14.05 GR 24.07. GR 25.09.

 Planungsauftrag an Stadtverwaltung durch SHL und GR

05/2019 07/2019 09/2019

Grundriss- und Gebäudeplanung/Testentwurf/ Bauvoranfrage bis

07/2019 09/2019 11/2019

Funktionale Ausschreibung bis

09/2019 11/2019 01/2020

Angebotsphase mit Auswertung bis

11/2019 01/2020 03/2020

Vergabebeschluss

12/2019 02/2020 04/2020

Werk/Montageplanung ab

01/2020 03/2020 05/2020

Bauphase ab

03/2020 05/2020 07/2020

mögliche Inbetriebnahme

09/2020 11/2020 01/2021

Fertigstellung KiTa frühestens Anfang 2021 möglich



LUDWIGSBURG

