INKAS (Projekte > 300.000 €) | **Stand: 1/2010** | **FB 65** | **Rahmenterminplan**

Blatt 1 | **STATUS** | Jahr: 2010

	Projekt	Kosten	Termine	Finanzposition
1	Kaiserstr. 30/32 - KO-Kaserne - Klassenräume	🔴	🟡	Finanzierung WBL
2	Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	🔴	🟢	Sonderkonto
3	Wilhelmstr. 35 - Lern- und Spielclub	🟡	🟢	2.2110.9440.000-0102
4	Mathildenstr. 21 - NB Archiv- und Verwaltungsbau	🟢	🟢	Finanzierung WBL
6	Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	🟢	🟢	2.2210.9440.000-0103
7	Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner	🔴	🟡	2.2130.9410.000-0112
15	Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	🔴	🟢	2.4641.9440.000-0501
16	Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	🟡	🟢	2.6158.9410.000-1003
17	Kurfürstenstr.2/1 - KiGa Energetische Sanierung	🟢	🟢	2.4641.9440.000-0201
18	Wilhelmstr. 44 - Erweiterung Charlottenkrippe	🟢	🟢	2.4641.9410.000-0101
24	Akademiehof 1 - ADK	🟡	🟢	Sonderkonto
25	Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum	🟡	🟢	Finanzierung WBL
28	Hindenburgstr. 29 - Karlsk. San. Mannschaftsgeb.	🟢	🟢	2.3400.9450.000.0403
29	Hindenburgstr. 29 - Karlsk. San. Geschützhaus	🟢	🟢	2.3400.9440.000.0404
32	Schwieberdingerstr. 46 - Sanierung TDL-Geb.	🟡	🟢	2.7730.9420.000-0201
33	Stuttgarter Str. 33 - Sanierung Forum	🟢	🟢	2.8400.9440.000.0103
35	Mathildenstr. 29/31 - Verwaltungsgebäude	🟢	🟢	2.6157.9440.000-0113

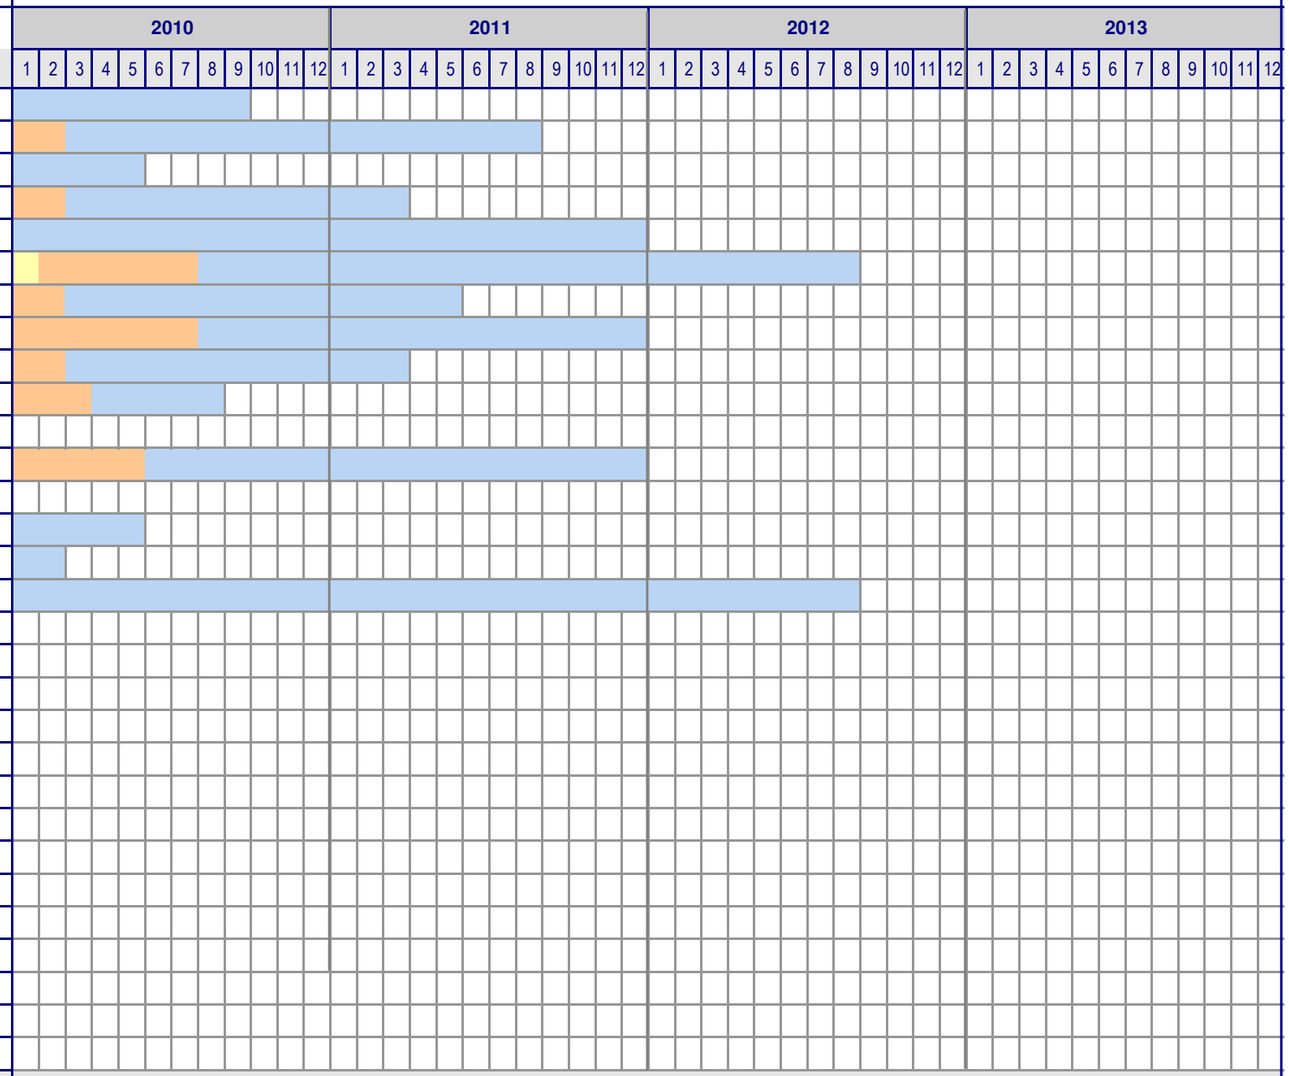

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2010	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 65	4.350.000	64.000
INKAS - Projekte	16.314.000	371.629

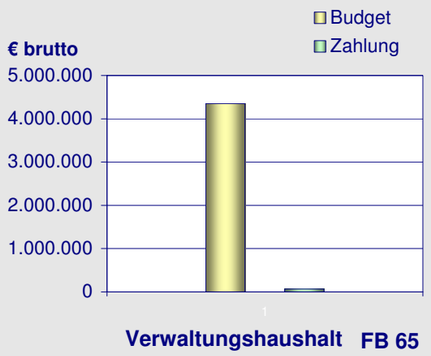

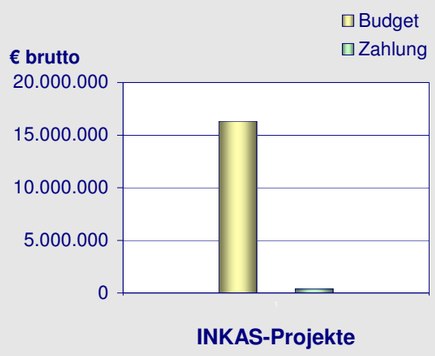

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten
- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine
- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmenterminplan fraglich
- 🔴 Rahmenterminplan nicht möglich
