INKAS (Projekte > 300.000 €) | **Stand: 30.09.2010** | **FB 67**

Rahmenterminplan

STATUS Jahr: 2010

	Projekt	Kosten	Termine	Finanzposition
1	Uferwiesen Hoheneck	🟢	🟢	2.6110.9554.000-0002
2	Zugwiesen	🟢	🟡	2.6110.9552.000-0002
3	Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten	🟢	🟢	2.6153.9610.000-1103
4	Planung/Bau Platz um Rathaus und Feuerwehr	🟢	🟢	2.6153.9640.000-1104
5	Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Haupt.-/Lechtstr.	🟢	🟢	2.6153.9610.000-1104
6	Planung + Bau Neckarterrasse / neuer Nordanschluß	🔴	🟢	2.6300.9610.000-1102
7	Radweg Bottwartalstraße/Marbacherstraße	🟢	🟢	2.6300.9640.000-0004
8a	Bauausgaben Bahnsteigunterführung	🟢	🟢	2.7920.9610.000.0101
8b	Anteil Hoch-/Tiefbau an Westportal	🟢	🟢	2.7920.9620.000-0101
9	Erschließung Waldäcker	🟢	🟢	2.6300.9610.000-0201
10	Erschließung Sonnenberg Teil I **WBL Sonderkonto**	🟢	🟢	**WBL Sonderkonto**
11	Straßenbau Comburgstraße **Sonderkonto**	🟢	🟢	**Sonderkonto**
12	Straßenbau Walter-Flex-Straße **Sonderkonto**	🟢	🟢	**Sonderkonto**
13	Straßenbau Neckarweihingerstraße **Sonderkonto**	🟢	🟢	**Sonderkonto**
14	MLF- Altlastensanierung **Fipo FB 23**	🟢	🟢	2.6150.9610.000.0401

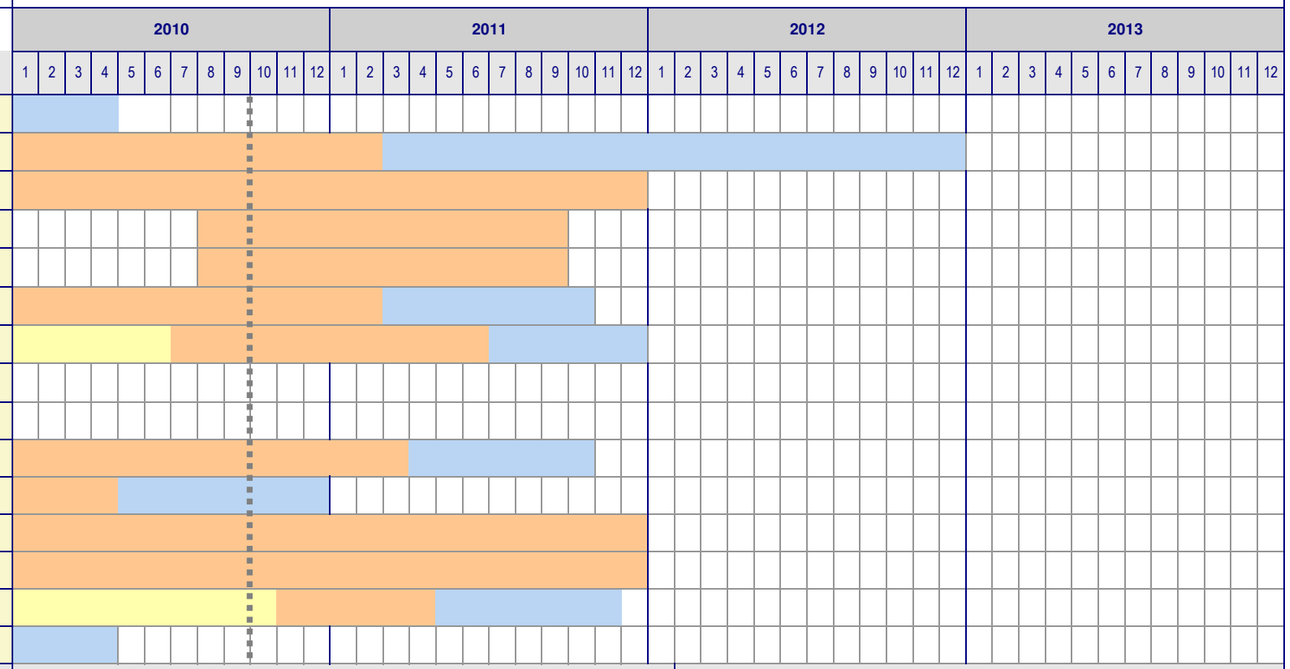

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2010	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 67	9.458.500	5.935.479
INKAS - Projekte - Vermögenshaushalt FB 67	2.680.600	1.110.061

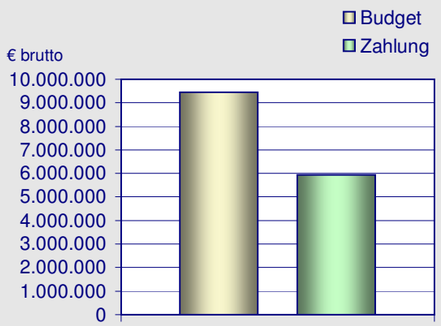

Verwaltungshaushalt FB 67

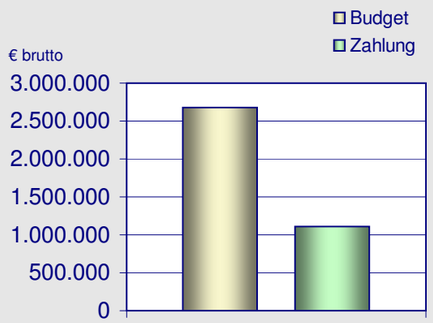

INKAS - Projekte - Vermögenshaushalt FB 67

Projektphasen

- Grundlagenermittlung
- Planung
- Ausführung

Anmerkungen zum Rahmenterminplan

zu 2: - Termin der Ausschreibung ist noch abhängig vom Planfeststellungsbeschluss für die geänderte Planung

zu 6: - Aufgrund der Planungsänderungen und der erweiterten Lärmschutzmaßnahmen für den Bereich Spitzäcker haben sich die Gesamtkosten auf 630.000 € erhöht.

STATUS

Kosten
- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine
- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmentermin fraglich
- 🔴 Rahmentermin nicht möglich
