INKAS (Projekte > 300.000 €) | **Stand: 1/2012** | **FB 65** | **Rahmenterminplan**

Blatt 1 | **STATUS** | Jahr: 2012

	Projekt	Kosten	Termine	Finanzposition
1	Kaiserstr. 30/32 - KO-Kaserne - Klassenräume	🟡	🟢	Finanzierung WBL
2	Anna-Neff-Straße - KiFaZ Hartenecker Höhe	🟡	🟢	Sonderkonto
4	Mathildenstr. 21 - NB Archiv- und Verwaltungsbau	🟡	🟢	Finanzierung WBL
6	Karlstr.33 - Sanierung Elly-Heuss-Knapp	🟢	🟢	2.2210.9440.000-0103
7	Schulg. 6/8 - Sanierung Uhland/Anton-Bruckner	🟢	🔴	2.2130.9410.000-0112
8	Alleenstr. 17/21 - San. Justinus-Kerner-Schule	🔴	🟢	2.2130.9410.000-0101
9	Gartenstr. 14 - NB Ganztagesbetreuung	🟢	🟢	2.2110.9410.000-0103
12	Alleenstr. 16 - Sanierung Schiller/Mörike-Gymn.	🟢	🟢	2.2300.9440.000-0112
15	Egerländerstr. 12 - Sanierung KiGa, Ausbau U3	🟢	🟢	2.4641.9440.000-0421
16	Weichselstraße - MGH Grünbühl-Sonnenberg	🟡	🔴	2.6158.9410.000-1003
17	Kurfürstenstr.2/1 - KiGa Energetische Sanierung	🟢	🟡	2.4641.9440.000-0201
18	Aspergerstr. 39/1 - Erweiterung Charlottenkrippe	🟢	🟢	2.4641.9410.000-0101
25	Eberhardstr. 1 - Stadtmuseum	🟡	🟢	Finanzierung WBL
26	Hauptstraße - Feuerwehrhaus Neckarweihingen	🟢	🟢	2.6153.9410.000-1104
47	Corneliusstraße 36 - Schlößlesfeldschule Anbau	🟢	🟡	2.2110.9410.000-0413
48	Lange Str.71 - Erweiterung KiGa Bäderwiesen	🟢	🟢	2.4641.9410.000-0901
49	Seestraße. 37 - Generalsan. Goethe-Gymnasium	🟢	🟢	2.2300.9440.000-0132

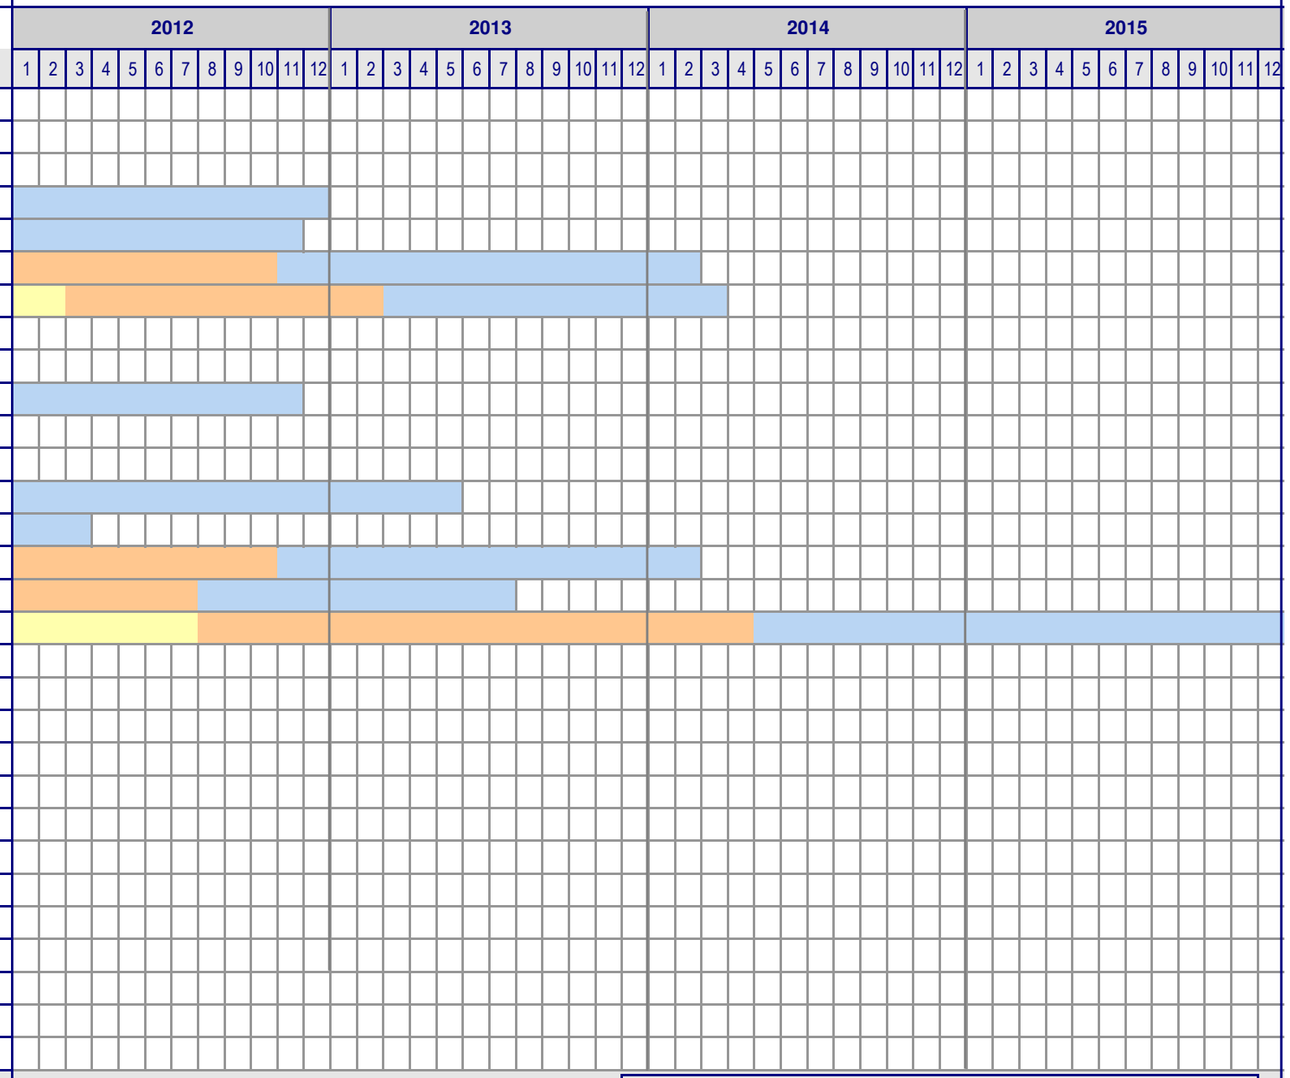

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2012	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 65	3.104.700	360.000
INKAS - Projekte	13.385.000	1.333.403

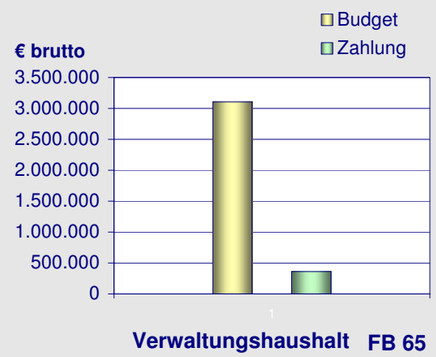

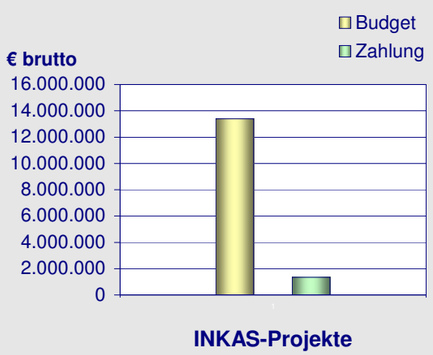

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten

- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine

- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmenterminplan fraglich
- 🔴 Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 1:	+ 35.000 € über Beschluss
zu 2:	+ 50.000 € über Beschluss
zu 3:	+ 60.000 € über Beschluss
	- 40.000 € bei Ausstattung
zu 7:	Terminverzug wegen Witterung
zu 8:	wie berichtet. Beschluss ist formal nachzuholen
zu 16:	+ 24.000 € über Beschluss
zu 25:	+ 60.000 € über Beschluss
