INKAS (Projekte > 300.000 €)	Stand: 30.09.2012	FB 67	Rahmenterminplan

STATUS Jahr: 2012

	Projekt	Kosten	Termine	
1	Friedenstraße 1. und 2. BA	●	●	2.6300.9640.000-0208
2	Zugwiesen	●	●	2.6110.9552.000-0002
3	Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten	●	●	2.6153.9610.000-1103
4	Planung + Bau Verkehrsentwicklung Neckarweihingen Haupt.-/Lechtstr. und Rathausplatz	●	●	2.6153.9610.000-1104 2.6153.9640.000-1104
5	Verkehrliche Verbesserung Bottwartalstraße	●	●	verschiedene HH-Stellen
6	Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße	●	●	2.6158.9630.000-1003
7	Erschließung Waldäcker	●	●	2.6300.9610.000-0201
8	Eberhardstraße 1. BA	●	●	2.6151.9640.000-0108
9	Grünbühl / Sonnenberg - Quartiersplatz - Außenanlagen MGH / KIFAZ	●	●	2.6158.9410.670-1003
10	Parkraumkonzeption Oststadt	●	●	2.6800.9610.000-0401
11	Straßenbau Comburgstraße **Sonderkonto**	●	●	**Sonderkonto**
12	Straßenbau Walter-Flex-Straße **Sonderkonto**	●	●	**Sonderkonto**
13	Straßenbau Neckarweihingerstraße **Sonderkonto**	●	●	**Sonderkonto**
14	Cäsar-von-Hofacker-Anlage 1. BA **Sonderkonto**	●	●	**Sonderkonto**
15	Hartenecker Höhe - Außenanlagen KIFAZ **Sonderkonto** - Kinderspielplatz	●	●	**Sonderkonto**

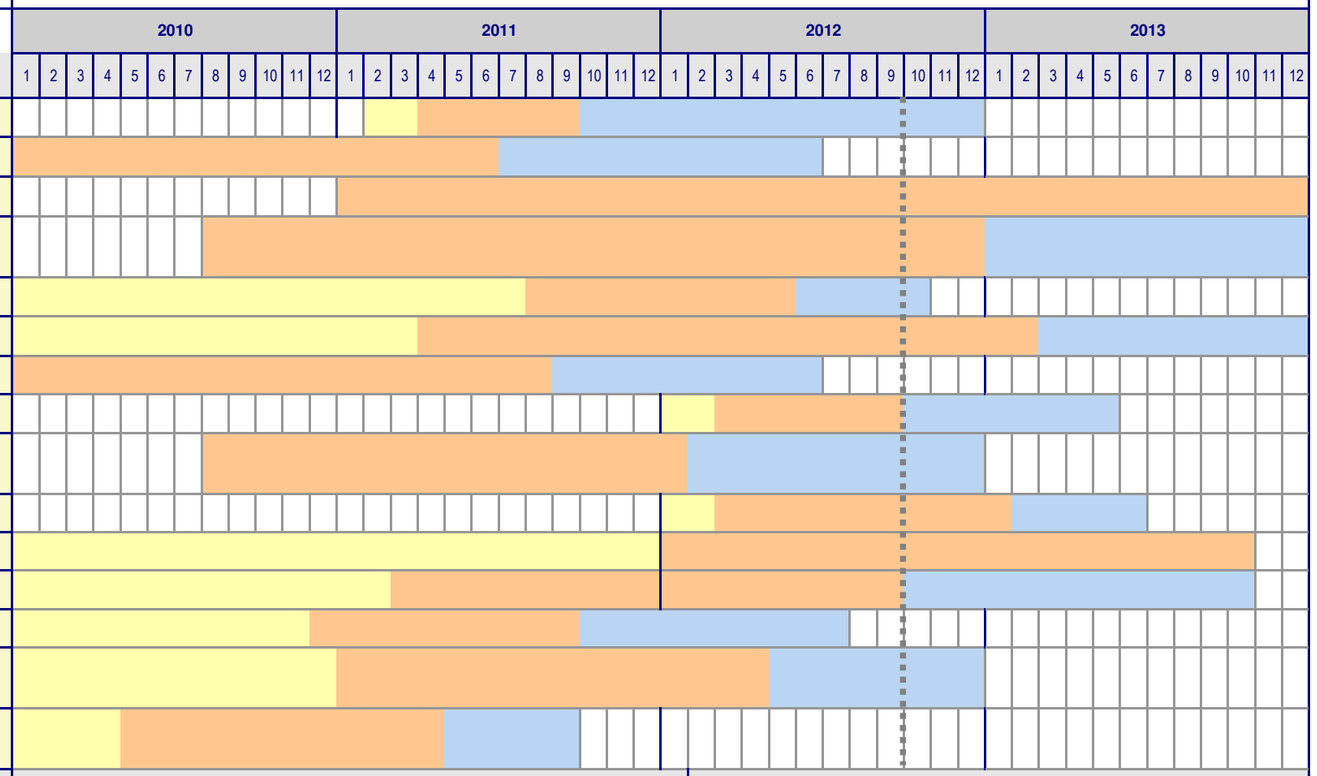

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2012	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 67	10.443.200	6.996.067
INKAS - Projekte - Vermögenshaushalt FB 67	3.934.300	1.865.928

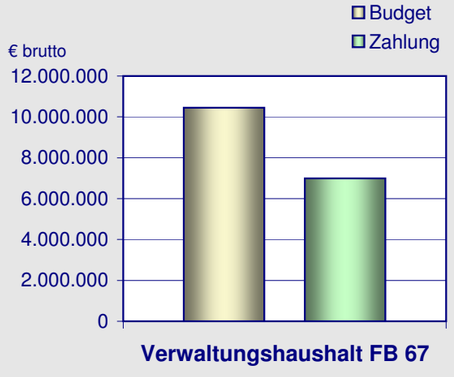

Verwaltungshaushalt FB 67

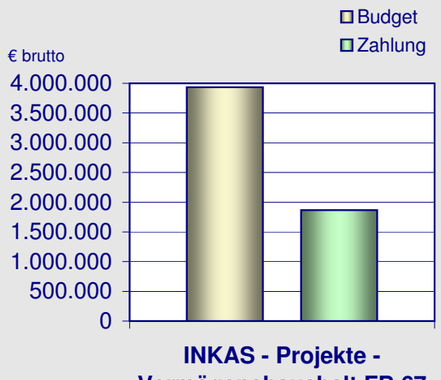

INKAS - Projekte - Vermögenshaushalt FB 67

Projektphasen

- Grundlagenermittlung
- Planung
- Ausführung

Anmerkungen zum Rahmenterminplan

zu 1: Leichte Verzögerungen bei den Leitungssanierungen und durch hohe Auslastung der Baufirma

zu 4: Mehrkosten entstehen durch zusätzliche Maßnahmen und durch die Kostenentwicklung im Straßenbau

zu 9: Bauverzögerungen beim Hochbau durch Konkurs der Rohbaufirma

STATUS

Kosten	Termine
● Günstiger oder nicht teurer	● entsprechend Rahmenterminplan
● bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €	● Rahmentermin fraglich
● > 10 %, über 100.000 €	● Rahmentermin nicht möglich
