INKAS (Projekte > 300.000 €)

Stand: 1/2014 | **FB 65**

Rahmenterminplan

Blatt 1 | **STATUS** | Jahr: 2014

	Projekt	Kosten	Termine	Auftrag
6	GS Elly-Heuss-Knapp-Realschule (Karl-29)	🟢	🟢	721100401007
7	GS Grundschulcampus (Schulgasse 6-8)	🟢	🟢	721100101027
8	GS Gemeindsch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21)	🔴	🟢	721100201017
9	NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	🔴	🔴	721100101017
16	NB MGH Grünbühl-Sonnenberg (Weichsel-10)	🟡	🟢	736501110017
25	Stadtmuseum und Kunstverein-MIK (Eberhard-1)	🟡	🟢	Finanzierung WBL
26	NB Feuerwehrhaus Neckarweihingen (Haupt-45)	🟢	🟢	712600011017
47	Anbau Schlößlesfeldschule (Cornelius-36)	🟢	🟡	721100104217
48	Erweiterung KiGa Bäderwiesen (Lange-71)	🟢	🟢	736501109537
65	Intergierte Leitstelle Kreis LB (Marien- 22)	🟢	🟢	712600001017
68	KUZ- Umbau Museumsräume (Wilhelm-9/1)	🟢	🟢	756100501007
71	Erweiterung KiGa (Reichertshalde 51)	🟢	🟢	736501108017
77	NB KiFaZ Poppenweiler (Erdmannhäuser-7-9)	🟡	🟢	736501112017

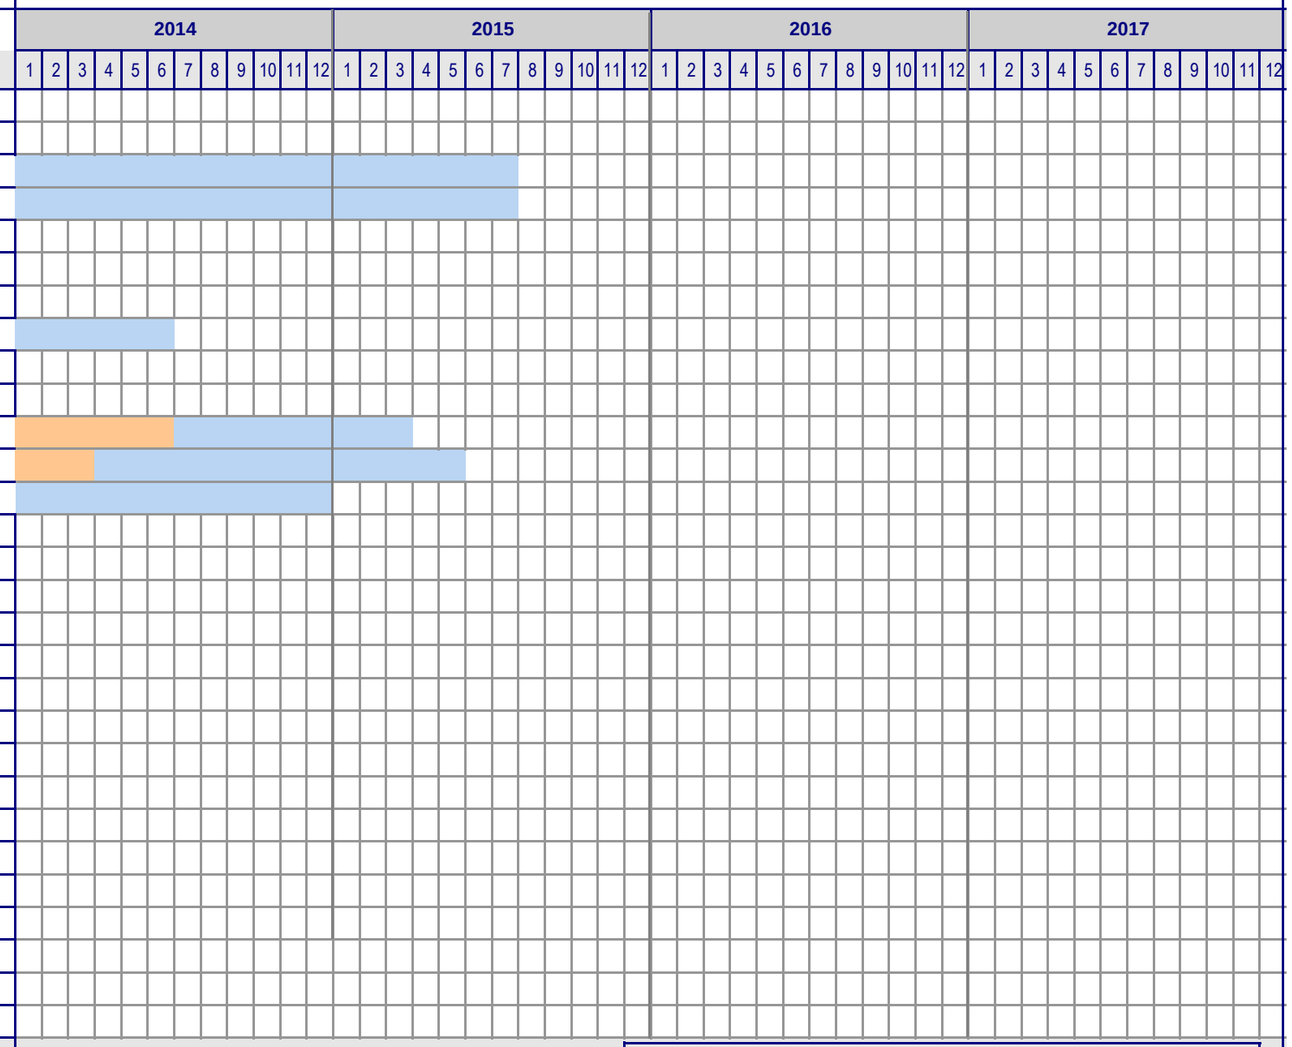

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2014	Budget	Zahlung
Ergebnishaushalt FB 65	6.748.000	356.000
INKAS - Projekte	12.707.000	554.348

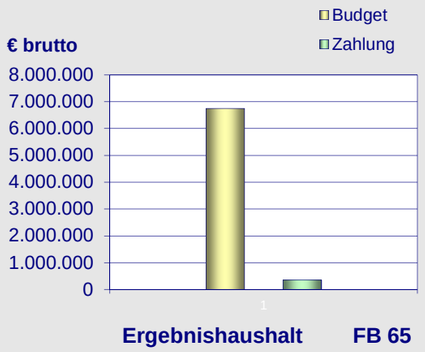

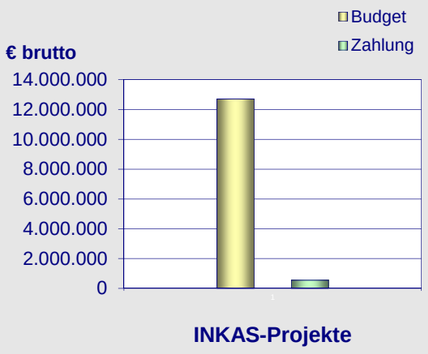

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten

- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine

- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmenterminplan fraglich
- 🔴 Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 7:	gesch. Abrechn ca. - 196.000 € unter Beschluss
zu 8:	gesch. Abrechn ca. 1.055.000 € über Beschluss
zu 9:	Verzögerung wg. Problematik Baugrube
zu 16:	+ 100.000 € über Beschluss
zu 25:	+ 95.000 € über Beschluss
zu 47:	enger Terminplan
zu 77:	+ 30.000 € über Beschluss
