INKAS (Projekte > 300.000 €) — Stand: 5/2015 — FB 65

Rahmenterminplan

Blatt 1 — **STATUS** — Jahr: 2015

	Projekt	Kosten	Termine	Auftrag
8	GS Gemeinsch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21)	🔴	🟢	721100201017
9	NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	🔴	🟢	721100101017
10	GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)	🟢	🟢	721100112017
12	San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)	🟢	🟢	721100601217
13	Sanierung Glasdach Mörike-Gymn. (Karl-18)	🟢	🟢	721100601227
17	San. Sanitärbereiche Rundsporth. (Kurfürsten-23)	🟢	🟢	konsumtiv
22	Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25)	🟢	🟡	721100601427
23	Brandschutz Hirschbergschule I (Tammer-32)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
28	Brandschutz Hirschbergschule II (Tammer-34)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
29	Brandschutz Oststadtschule I (Berliner Platz 2)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
47	Anbau Schlößlesfeldschule (Cornelius-36)	🟢	🟢	721100104217
49	Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	🟢	🟢	721100601417
52	Techn. Infrastruktur Karlskas. (Hindenburg-29)	🟢	🟢	727300004017
68	KUZ- Umbau Museumsräume (Wilhelm-9/1)	🟢	🟢	756100501007
71	Erweiterung KiTa (Reichertshalde 51)	🟢	🟢	736501108017
77	NB KiFaZ Poppenweiler (Erdmannhäuser-7-9)	🟡	🟡	736501112017

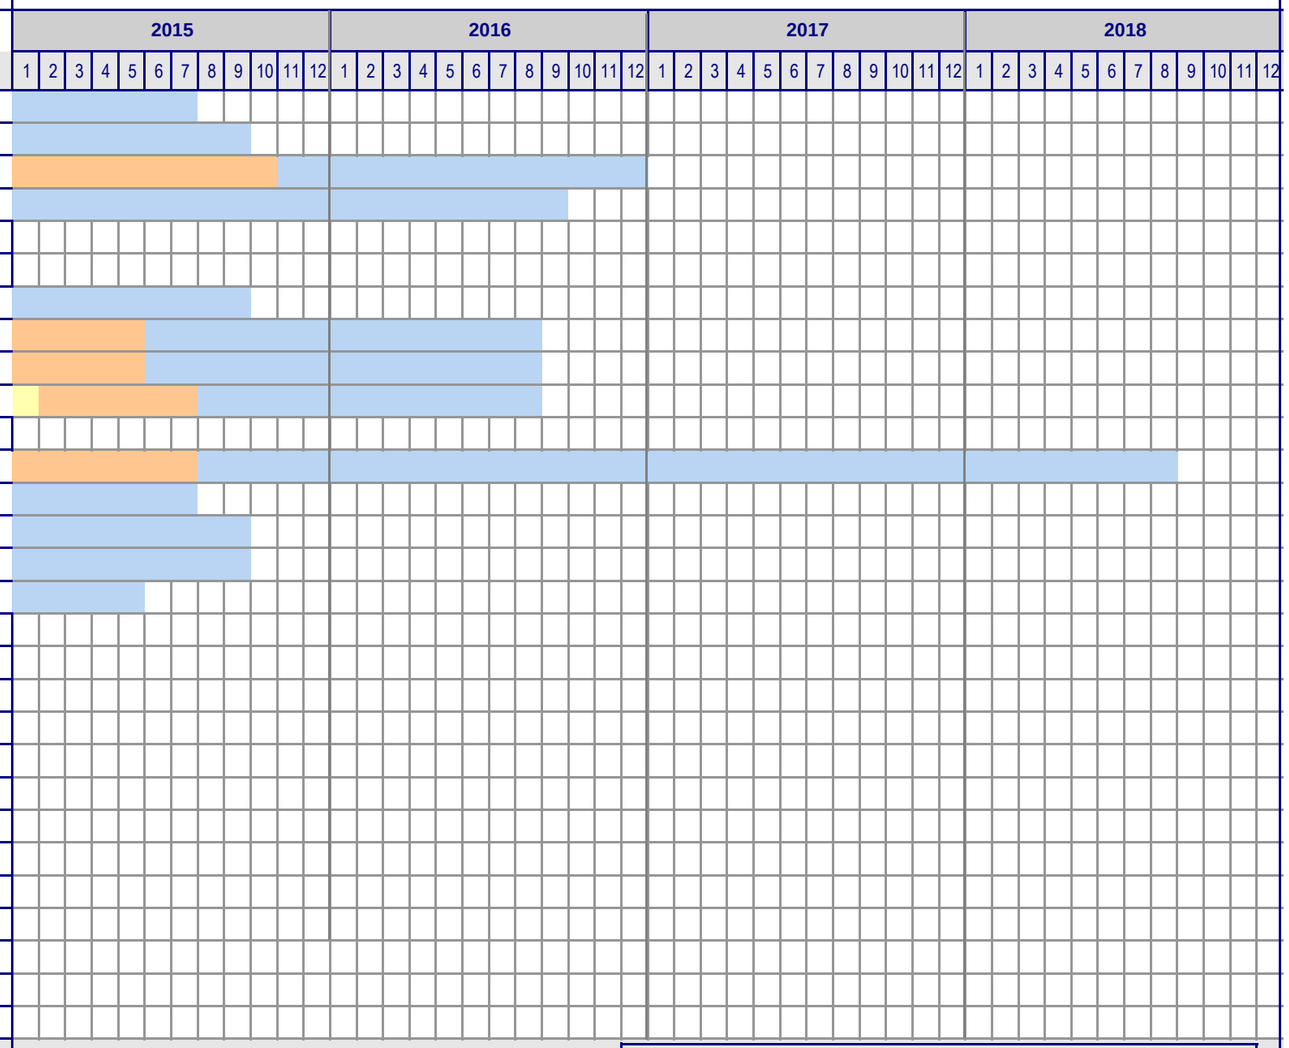

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2015

	Budget	Zahlung
Ergebnishaushalt FB 65	6.644.000	1.503.217
INKAS - Projekte	11.174.000	3.492.206

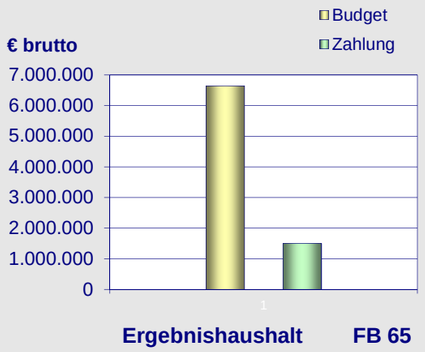

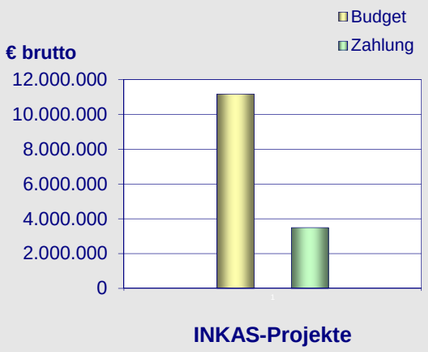

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten
- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine
- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmenterminplan fraglich
- 🔴 Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 8: gesch. Abrechn ca. 1.055.000 € über Beschluss

zu 9: Verzögerung wg. Problematik Baugrube
+ 120.000 € über Beschluss

zu 22: enger Terminplan

zu 77: + 96.000 € über Beschluss
