INKAS (Projekte > 300.000 €) — Stand: 9/2015 — FB 65 — Rahmenterminplan

Blatt 1 — **STATUS** — Jahr: 2015

	Projekt	Kosten	Termine	Auftrag
8	GS Gemeinsch.-Schule Innenstadt (Alleen 17/21)	🔴	🟢	721100201017
9	NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	🔴	🟢	721100101017
10	GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)	🟢	🟢	721100112017
12	San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)	🟡	🟢	721100601217
17	San. Sanitärbereiche Rundsporth. (Kurfürsten-23)	🟢	🟢	konsumtiv
20	NB Obdachlosenunterkunft (Riedle 25)	🟢	🟢	731403202007
22	Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25)	🟢	🟢	721100601427
23	Brandschutz Hirschbergschule I (Tammer-32)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
28	Brandschutz Hirschbergschule II (Tammer-34)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
29	Brandschutz Oststadtschule I (Berliner Platz 2)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
47	Anbau Schlößlesfeldschule (Cornelius-36)	🟢	🟢	721100104217
49	Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	🟢	🟢	721100601417
52	Techn. Infrastruktur Karlskas. (Hindenburg-29)	🟢	🟢	727300004017
68	KUZ- Umbau Museumsräume (Wilhelm-9/1)	🟢	🟢	756100501007
71	Erweiterung KiTa (Reichertshalde 51)	🟢	🟢	736501108017
77	NB KiFaZ Poppenweiler (Erdmannhäuser-7-9)	🔴	🟢	736501112017

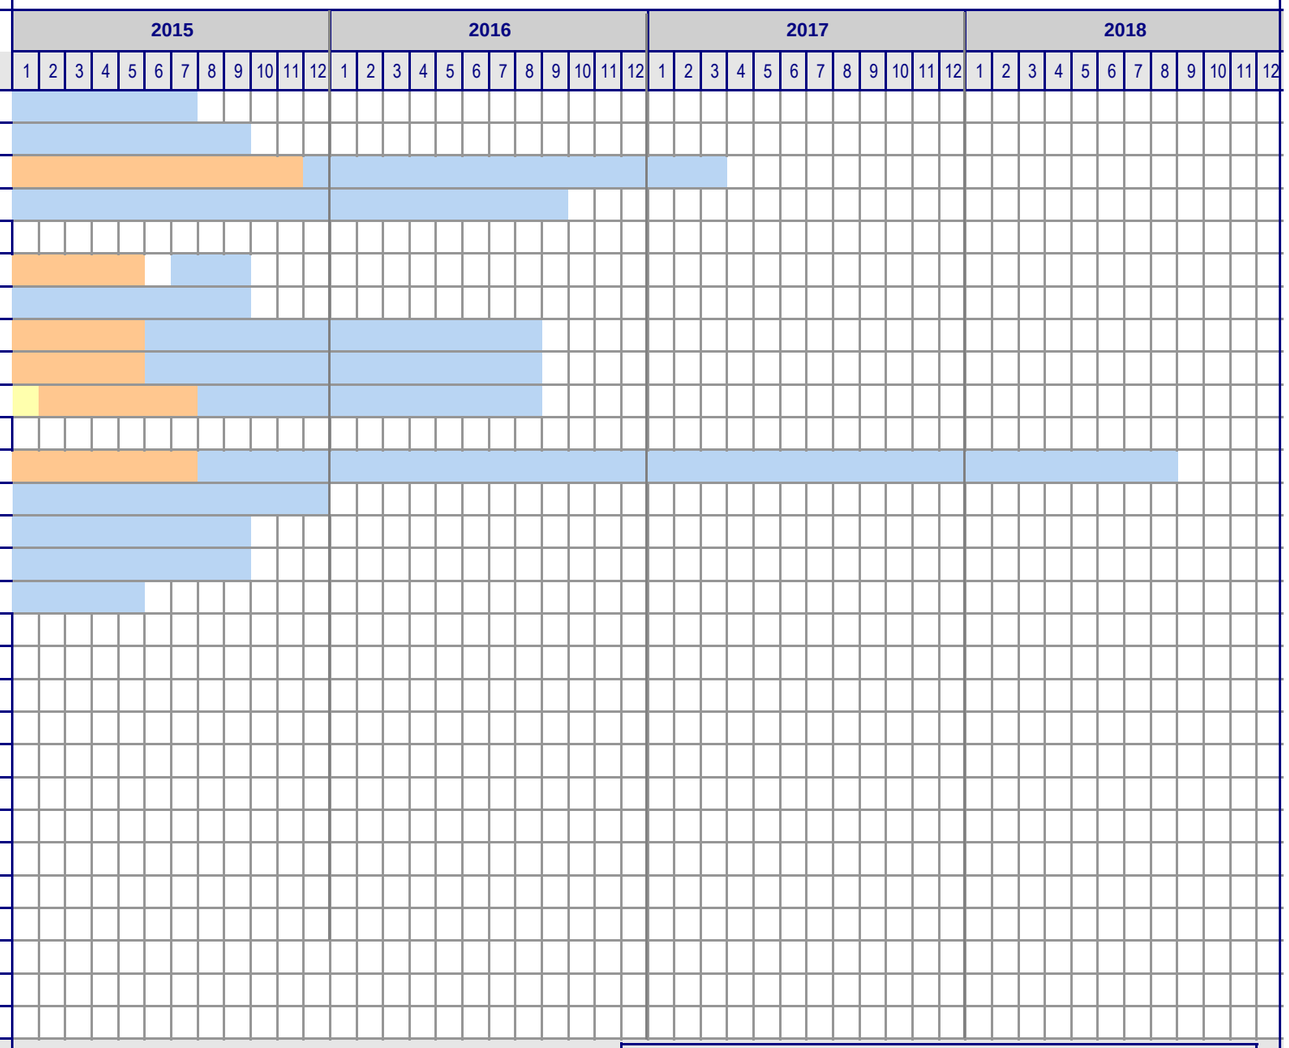

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2015

	Budget	Zahlung
Ergebnishaushalt FB 65	6.644.000	3.953.849
INKAS - Projekte	11.559.000	6.636.952

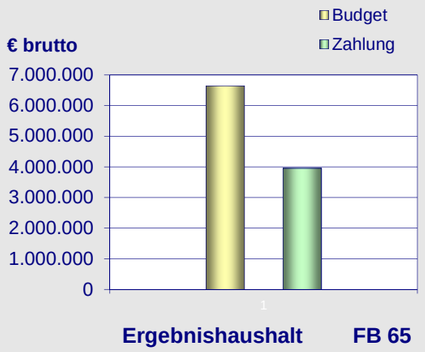

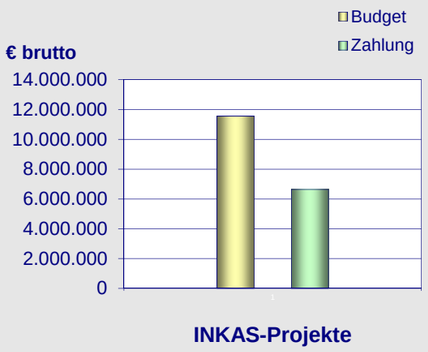

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten
- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine
- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmenterminplan fraglich
- 🔴 Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 8: gesch. Abrechn. ca. 1.450.000 € über Beschluss
zu 9: gesch. Abrechn. ca. 120.000 € über Beschluss
zu 12: gesch. Abrechn. ca. 20.000 € über Beschluss
zu 77: gesch. Abrechn. ca. 196.000 € über Beschluss
