INKAS (Projekte > 300.000 €) — Stand: 1/2017 — FB 65 — Rahmenterminplan

Blatt 1 — **STATUS** — Jahr: 2017

	Projekt	Kosten	Termine	Auftrag
9	NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	🔴	🟢	721100101017
10	GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)	🟢	🟢	721100112017
12	San. Fachklassenräume Mörike-Gymn. (Karl-19)	🟡	🟢	konsumtiv + investiv
21	SAN Obdachlosenunterkunft (Teinacher- 11)	🟢	🟢	konsumtiv
22	Brandschutz ehem. Silcherschule (Mathilden- 25)	🟢	🟢	721100601427
23	Brandschutz Hirschbergschule I (Tammer-32)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
28	Brandschutz Hirschbergschule II (Tammer-34)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
29	Brandschutz Oststadtschule I (Berliner Platz 2)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
30	NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)	🟢	🟢	721100109007
31	Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
33	GS Dusch-/Umkleide Turnhalle NW (Schwarzwald-2)	🟢	🟢	konsumtiv
34	NB Schulsporthalle Hoheneck (Ostertag-7)	🟢	🟢	742410008017
49	Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	🟢	🟢	721100601417
75	KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)	🟢	🟢	736501111007

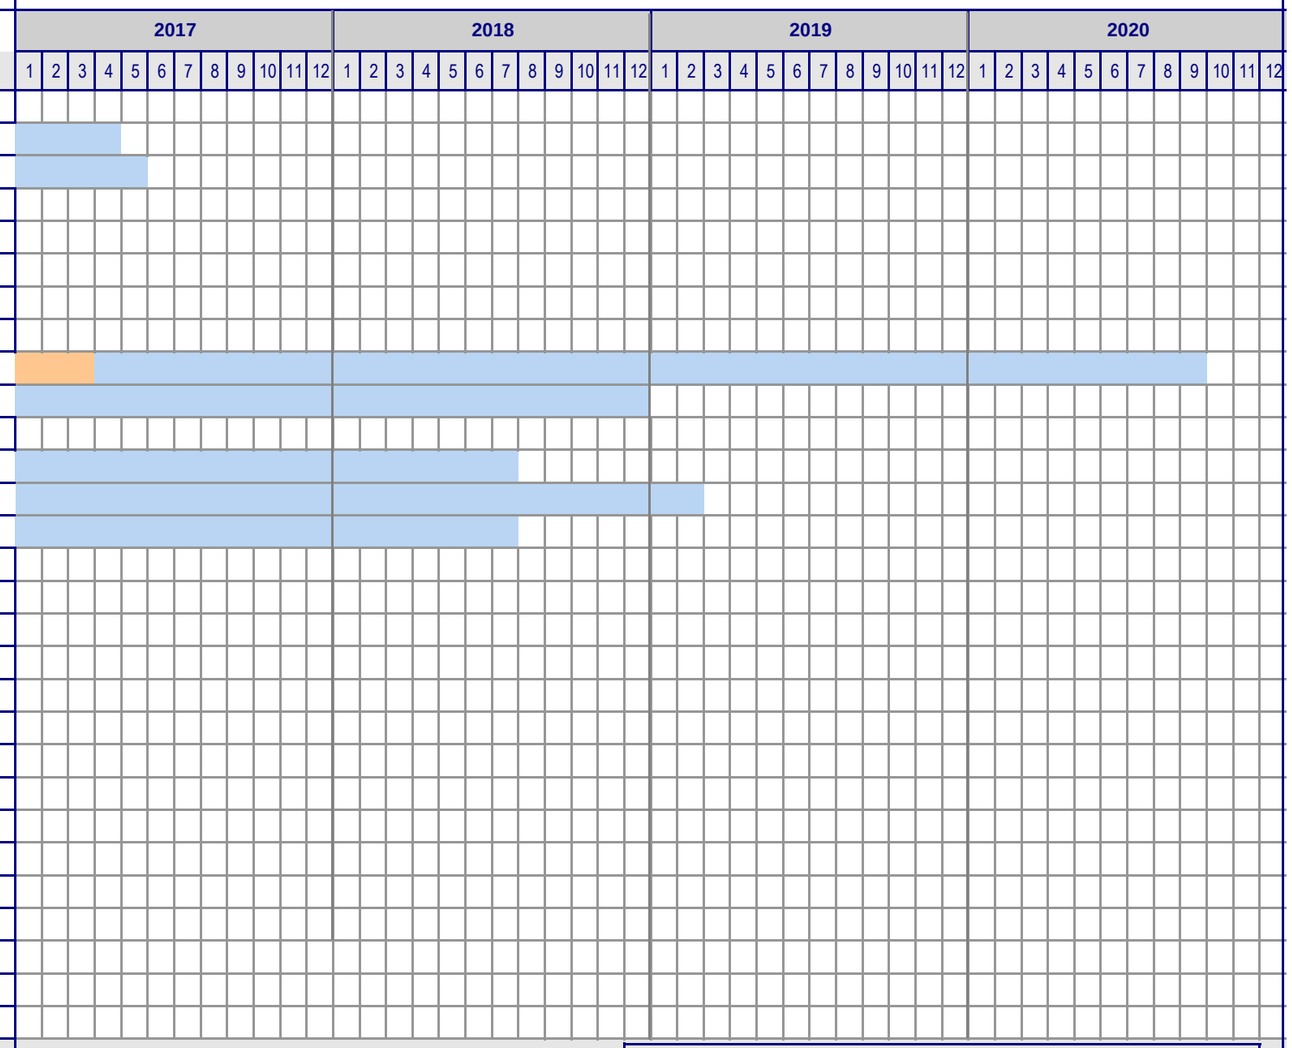

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2017

	Budget	Zahlung
Ergebnishaushalt FB 65	8.280.000	56.820
INKAS - Projekte	12.444.000	1.025.678

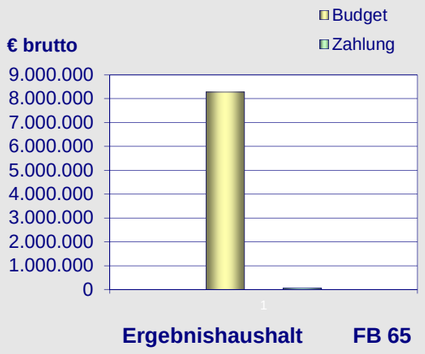

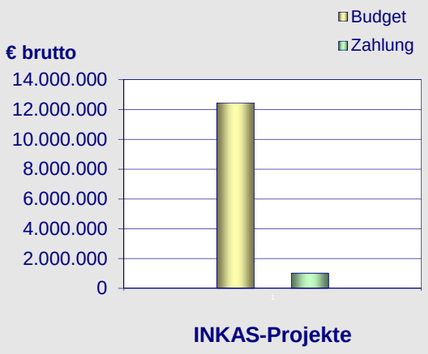

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten
- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine
- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmenterminplan fraglich
- 🔴 Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 9: gesch. Abrechn. ca. 120.000 € über Beschluss
zu 12: gesch. Abrechn. ca. 20.000 € über Beschluss
zu 21: gesch. Abrechn. ca. 145.000 € unter Beschluss
zu 22: gesch. Abrechn. ca. 364.000 € unter Beschluss
