INKAS (Projekte > 300.000 €) — Stand: 5/2018 — FB 65 — Rahmenterminplan

Blatt 1 — **STATUS** — Jahr: 2018

	Projekt	Kosten	Termine	Auftrag
9	NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	🟢	🟢	721100101017
10	GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)	🟢	🟢	721100112017
30	NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)	🟢	🟢	721100109007
31	Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)	🟢	🟡	konsumtiv + investiv
32	Neue Decke Parkdeck TDL (Schwieberdinger-46)	🟢	🟢	711250000027
34	NB Schulsporthalle Hoheneck (Ostertag-7)	🟡	🟢	742410008017
35	Brandschutz Eberhard-Ludwig-Schule (Tammer-28)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
36	Erweiterung Schlösslesfeldschule (Brahmsweg-30)	🟢	🟢	721100104247
37	Erweiterung Friedensschule (Frieden-10)	🟢	🟢	721100102307
38	Stadtbad Mensa + Besprechungsräume (Alleen-20)	🟢	🟡	7794801011007
41	Erweiterung Eichendorffschule (Neiße-22)	🟢	🟢	721100110027
42	Brandsch. Schlösslesfeldsch. Altbau (Cornelius-36)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
44	Neugestaltung Kantine KUZ (Wilhelm-9/1)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
45	San. Fachklassen Mörike-Gymn. 3. BA (Karl-19)	🟢	🟢	721100601217
46	Ratskellersaal: San. Dach + Ertüchtigung zur VStätt	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
49	Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	🟢	🟢	721100601417
66	Sanierung Lehrsäle Feuerwache (Marien-22)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
75	KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)	🟢	🟢	736501111007
76	GS Friedrich-v.-Keller-Schule (Schwarzwald-2)	🟢	🟢	721100111017

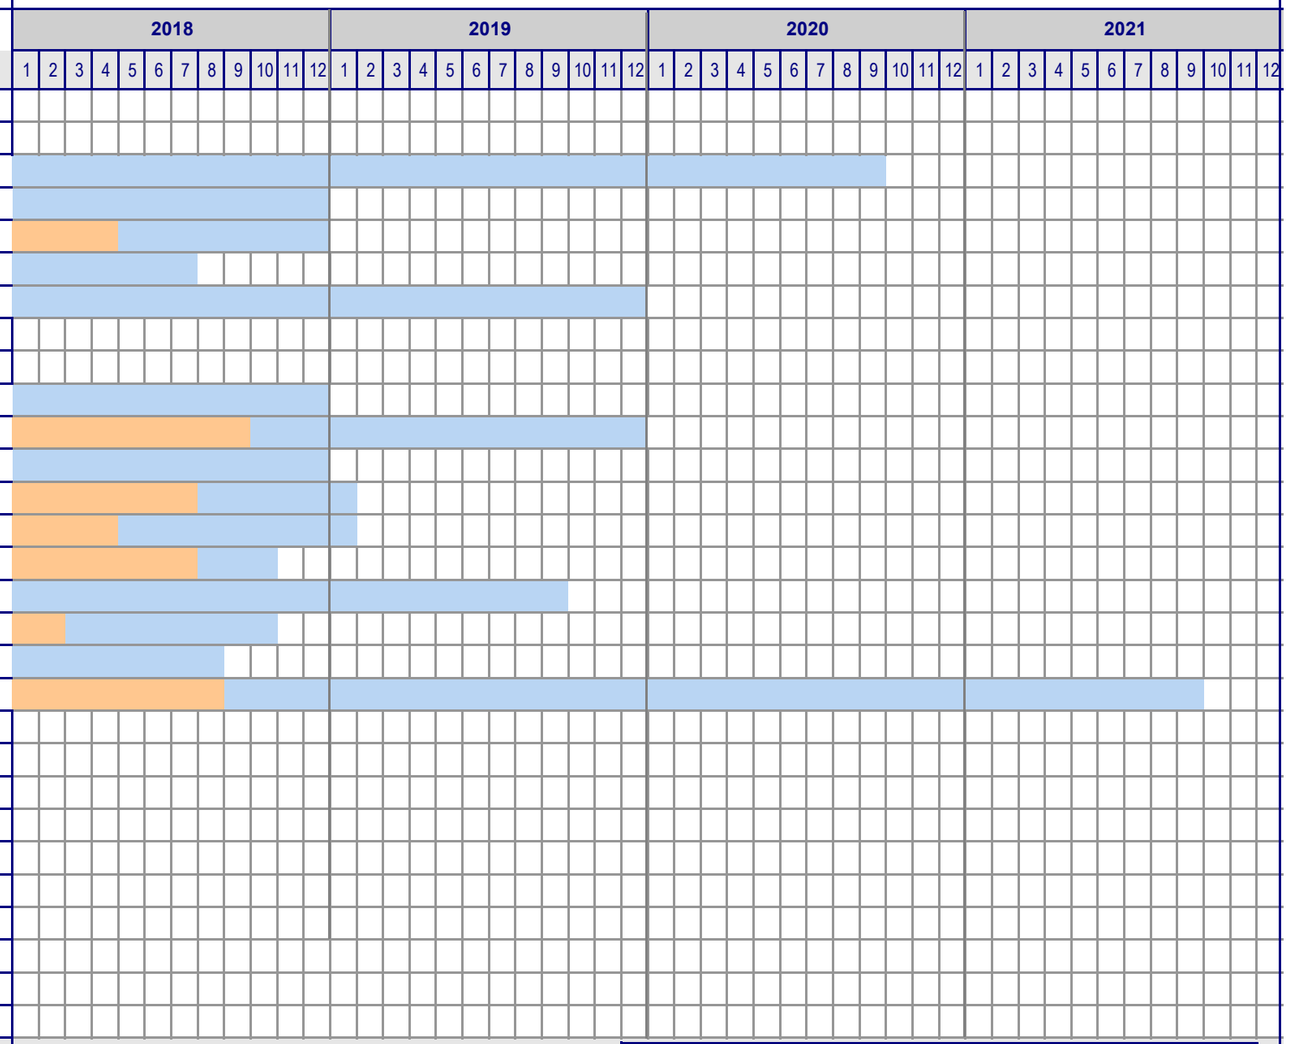

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2018	Budget	Zahlung
Ergebnishaushalt FB 65	8.365.000	1.987.841
INKAS - Projekte	19.643.000	3.309.319

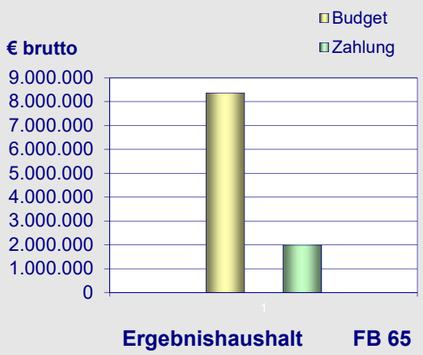

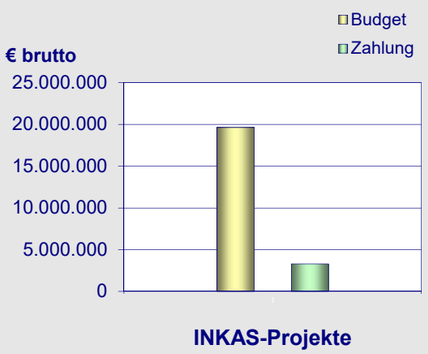

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten
- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine
- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmenterminplan fraglich
- 🔴 Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 31: enger Terminplan

zu 34: gesch. Abrechn. ca. 97.000 € über Beschluss

zu 38: Terminverzögerung wegen Bausubstanz
