INKAS (Projekte > 300.000 €)

Stand: 9/2019 | **FB 65**

Rahmenterminplan

Blatt 1 | **STATUS** | Jahr: 2019

	Projekt	Kosten	Termine	Auftrag
9	NB Mensa mit Bewegungsraum (Garten-14)	🟢	🟢	721100101017
10	GS Altes Schulhaus Poppenw. (Erdmannhäuser-1)	🟡	🟢	721100112017
30	NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54)	🟢	🟡	721100109007
31	Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8)	🔴	🟢	konsumtiv + investiv
32	Neue Decke Parkdeck TDL (Schwieberdinger-46)	🟢	🟢	711250000027
35	Brandschutz Eberhard-Ludwig-Schule (Tammer-28)	🟢	🟡	konsumtiv + investiv
38	Stadtbad Mensa, Galerie, Besprechungsräume (Alleen-20)	🟢	🟢	7794801011007
41	Erweiterung Eichendorffschule (Neiße-22)	🟢	🟢	721100110027
42	Brandsch. Schlösslesfeldsch. Altbau (Cornelius-36)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
44	Neugestaltung Kantine KUZ (Wilhelm-9/1)	🟡	🟢	konsumtiv + investiv
46	Ratskellersaal: San. Dach + Ertüchtigung zur VStätt	🟢	🟡	konsumtiv + investiv
49	Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37)	🟢	🟢	721100601417
50	Karlskas. Reithalle: Einbau Garderobe + Hinterbühne	🟢	🟢	727300004017
56	Abbruch alter Fachklassentrakt (Alleen-18)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
57	Teilsanierung Steuerung Bühnentechnik ADK	🟢	🟢	konsumtiv
58	Umbau und Einrichtung Räume VHS (See-16)	🟢	🟢	727100001017
59	Neugestaltung Gastronomie Forum am Schlosspark	🟢	🟡	konsumtiv + investiv
66	Sanierung Lehrsäle Feuerwache (Marien-22)	🟢	🟢	konsumtiv + investiv
75	KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62)	🟢	🟢	736501111007

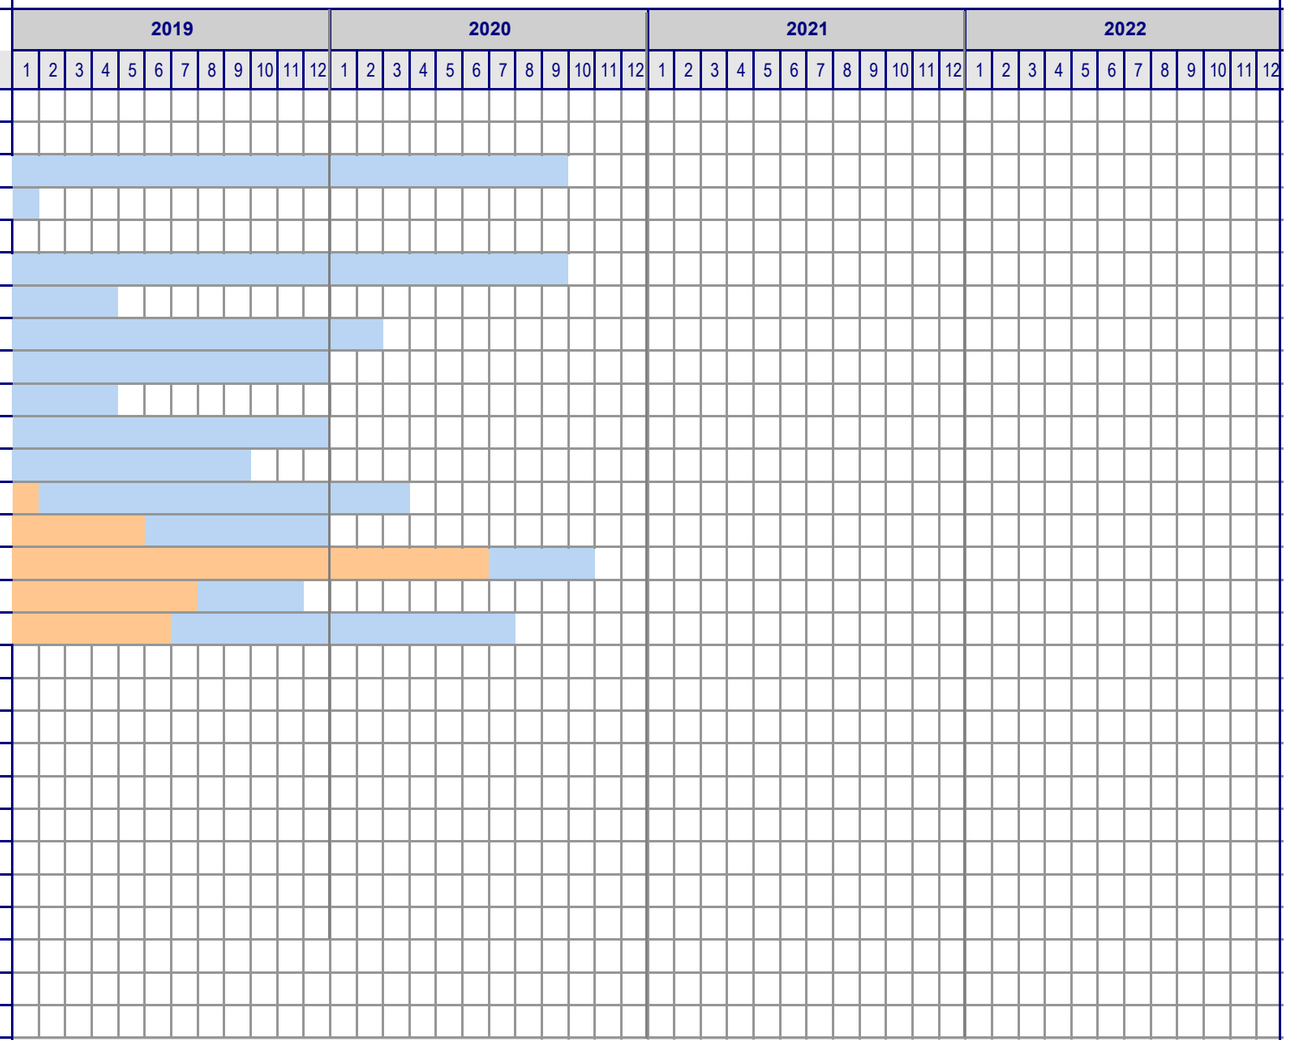

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2019	Budget	Zahlung
Ergebnishaushalt FB 65	11.347.900	7.242.362
INKAS - Projekte	20.759.000	10.327.600

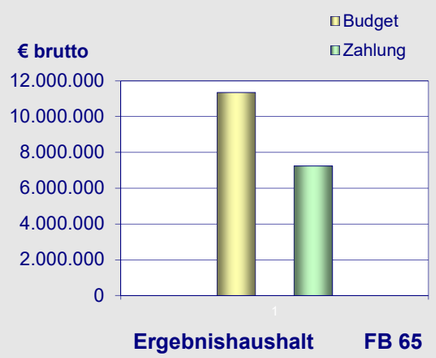

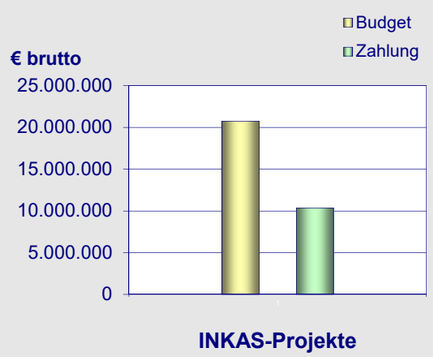

Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

Status

Kosten
- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine
- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmenterminplan fraglich
- 🔴 Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 10: gesch. Abrechn. ca. 38.000 € über Beschluss
zu 30: Terminverzögerungen im 1. BA
zu 31: gesch. Abrechn. ca. 130.000 € über Beschluss
zu 44: gesch. Abrechn. ca. 32.000 € über Beschluss
zu 46: Verzögerung durch lange Bearbeitungszeit des Bauantrags beim RP
zu 59: knapp bemessenes Zeitfenster für die Ausführ.
