Anlage 1 zur Vorl.-Nr. 197/20

**INKAS (Projekte > 300.000 €)** | **Stand: 5/2020** | **FB 65** | **Rahmenterminplan**

**Blatt 1** — **STATUS** — Jahr: 2020

| | Projekt | Kosten | Termine | Auftrag |
|---|---|---|---|---|
| 30 | NB und San. August-Lämmle-Schule (Westfalen-54) | 🟢 | 🟡 | 721100109007 |
| 31 | Ersatzanbau KiTa Pflugfelden (Stammheimer-8) | 🔴 | 🟢 | konsumtiv + investiv |
| 35 | Brandschutz Eberhard-Ludwig-Schule (Tammer-28) | 🟢 | 🟢 | konsumtiv + investiv |
| 38 | Stadtbad Mensa, Galerie, Besprechungsräume (Alleen-20) | 🟢 | 🟢 | 7794801011007 |
| 41 | Erweiterung Eichendorffschule (Neiße-22) | 🟢 | 🟢 | 721100110027 |
| 42 | Brandsch. Schlösslesfeldsch. Altbau (Cornelius-36) | 🟢 | 🟢 | konsumtiv + investiv |
| 44 | Neugestaltung Kantine KUZ (Wilhelm-9/1) | 🟡 | 🟢 | konsumtiv + investiv |
| 46 | Ratskellersaal: San. Dach + Ertüchtigung zur VStätt | 🟢 | 🟢 | konsumtiv + investiv |
| 49 | Generalsanierung Goethe-Gymnasium (See-37) | 🟢 | 🟢 | 721100601417 |
| 50 | Karlskas. Reithalle: Einbau Garderobe + Hinterbühne | 🟢 | 🟡 | 727300004017 |
| 56 | Abbruch alter Fachklassentrakt (Alleen-18) | 🟢 | 🟢 | konsumtiv + investiv |
| 57 | Teilsanierung Steuerung Bühnentechnik ADK | 🟢 | 🟢 | konsumtiv |
| 58 | Umbau und Einrichtung Räume VHS (See-16) | 🟢 | 🟢 | 727100001017 |
| 59 | Neugestaltung Gastronomie Forum am Schlosspark | 🟢 | 🟡 | konsumtiv + investiv |
| 75 | KiFaz Neckarweihingen (Neue Straße 62) | 🟢 | 🟢 | 736501111007 |

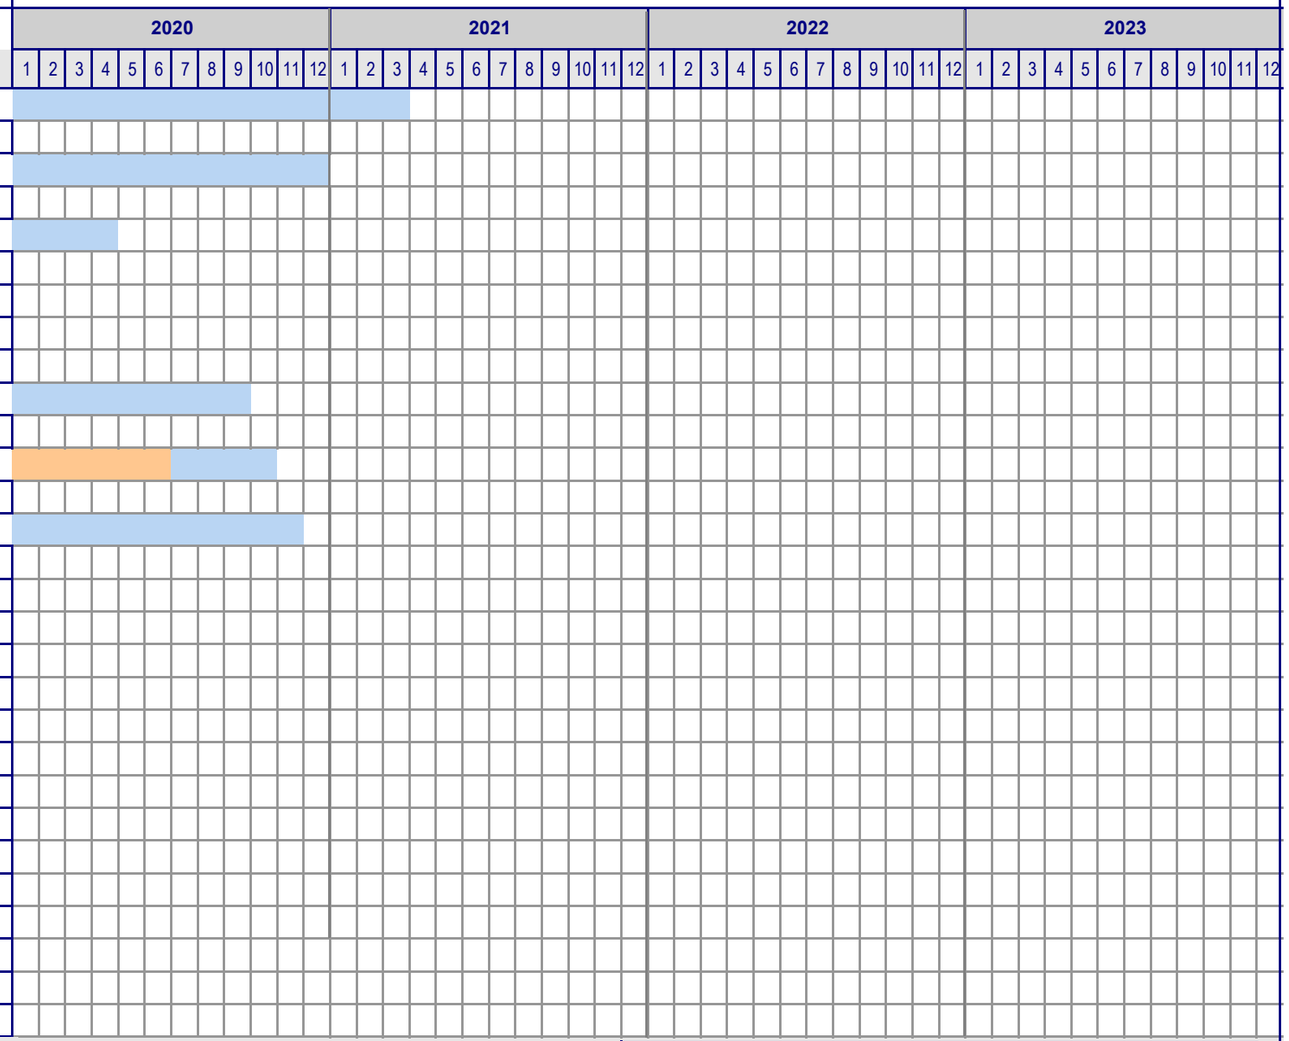


## Projektphasen

- Grundlagenermittlung Leistungsphase 1
- Planung Leistungsphasen 2 - 7
- Ausführung Leistungsphase 8

## Status

**Kosten**

- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

**Termine**

- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmenterminplan fraglich
- 🔴 Rahmenterminplan nicht möglich

Anmerkungen zu den Projekten

zu 30: Terminverzögerungen im 1. BA
zu 31: gesch. Abrechn. ca. 130.000 € über Beschluss
zu 38: gesch. Abrechn. ca. 47.000 € unter Beschluss
zu 44: gesch. Abrechn. ca. 32.000 € über Beschluss
zu 50: Verzögerungen der Ausführung wg. Corona-Krise
zu 56: gesch. Abrechn. ca. 253.000 € unter Beschluss
zu 59: knapp bemessenes Zeitfenster für die Ausführ.
