INKAS (Projekte > 300.000 €) | Stand: 5/2009 | FB 65 | Rahmenterminplan

Blatt 1 — **STATUS** — Jahr: 2009

	Projekt	Kosten	Termine	Finanzposition
1	Feuerwehrgerätehaus Poppenweiler	🟢	🟢	2.1300.9440 000-1201
2	Schulentwicklung: zukünftig als Einzelmaßnahmen			
3	Brandschutzprogramm: zukünftig Einzelmaßnahmen			
4	San. Uhlandschule/Anton-Bruckner Schule, Ern. Stelzenbau	🟢	🟢	2.2130.9410.000-0112
5	Fr.v.Keller Schule Sanierung/Neubau Schwarzwaldstraße	🟡	🟡	2.2150.9440.000-1102
6	Elly-Heuss-Knapp Schulraumsanierung	🟢	🟢	2.2210.9440 000-0103
7	Fachklassen Schiller-Mörike	🟢	🟢	2.2300.9410 000-0101
8	Ganztagesbetreuung Innenstadt	🟢	🟢	2.2950.9410 000-0101
9	Erneuerung Glasdach Mörike Gymnasium	🟡	🟡	2.2300.9440 000-0123
10	Sanierung Goethe/Justinus-Kerner	🟡	🟢	2.2300.9440 000-0132
11	Fassaden Karlskaserne	🟢	🟢	2.3400.9450 000-0403
12	Familienzentrum Grünbühl/Sonnenberg	🟢	🟢	2.6158.9410.000-1003
13	Erweiterung Charlottenkrippe	🟢	🟡	2.4641.9410 000-0101
14	Ausbau KiGa Häslenweg	🟢	🟡	neue FiPo
15	MZH-Ossweil Sanierung/Neubau	🟢	🟢	2.5610.9450 000-0901
16	Akademie für Darstellende Kunst	🔴	🟡	(Sonderverrechnung)
17	Akademie für D. Kunst Stuttgarter Str.16 Stadtanteil	🟢	🟢	2.6157.9440.000-0111
18	Mathildenstr. 21 Verwaltung, WBL	🟢	🟡	2.6157.9440.000-0122
19	Mathilde 29 + 31	🟢	🟢	2.6157.9440.000-0113
20	Licht- und Fassadenkonzept Akademiehof	🟢	🟢	2.6157.9440.000-0112
21	Neuer Kindergarten Poppenweiler Familienzentrum	🟢	🟢	2.6159.9410 000-1202
22	Dach Neuer Friedhof	🟢	🟢	2.7500.9440 000-0401
23	TDL 4.BA Schwieberdinger Straße	🟢	🟢	2.7730.9420.000-0201
24	Forum Sanierung	🟢	🟢	2.8400.9440 000-0103
25	Muiltifunktionshalle Bauausgaben	🟢	🟢	2.8450.9410.000-0103
26	Eberhardstraße 1 Museum	🟢	🟢	4.8800.5000.000
27	Westportal Bahnhof	🟢	🟡	
28	Erweiterung Oststadtschule II	🟢	🟢	2.2110.9410.000-0401
29	Sanierung/NB Pestallozzischule	🟢	🟢	2.2110.9410.000-0111
30				

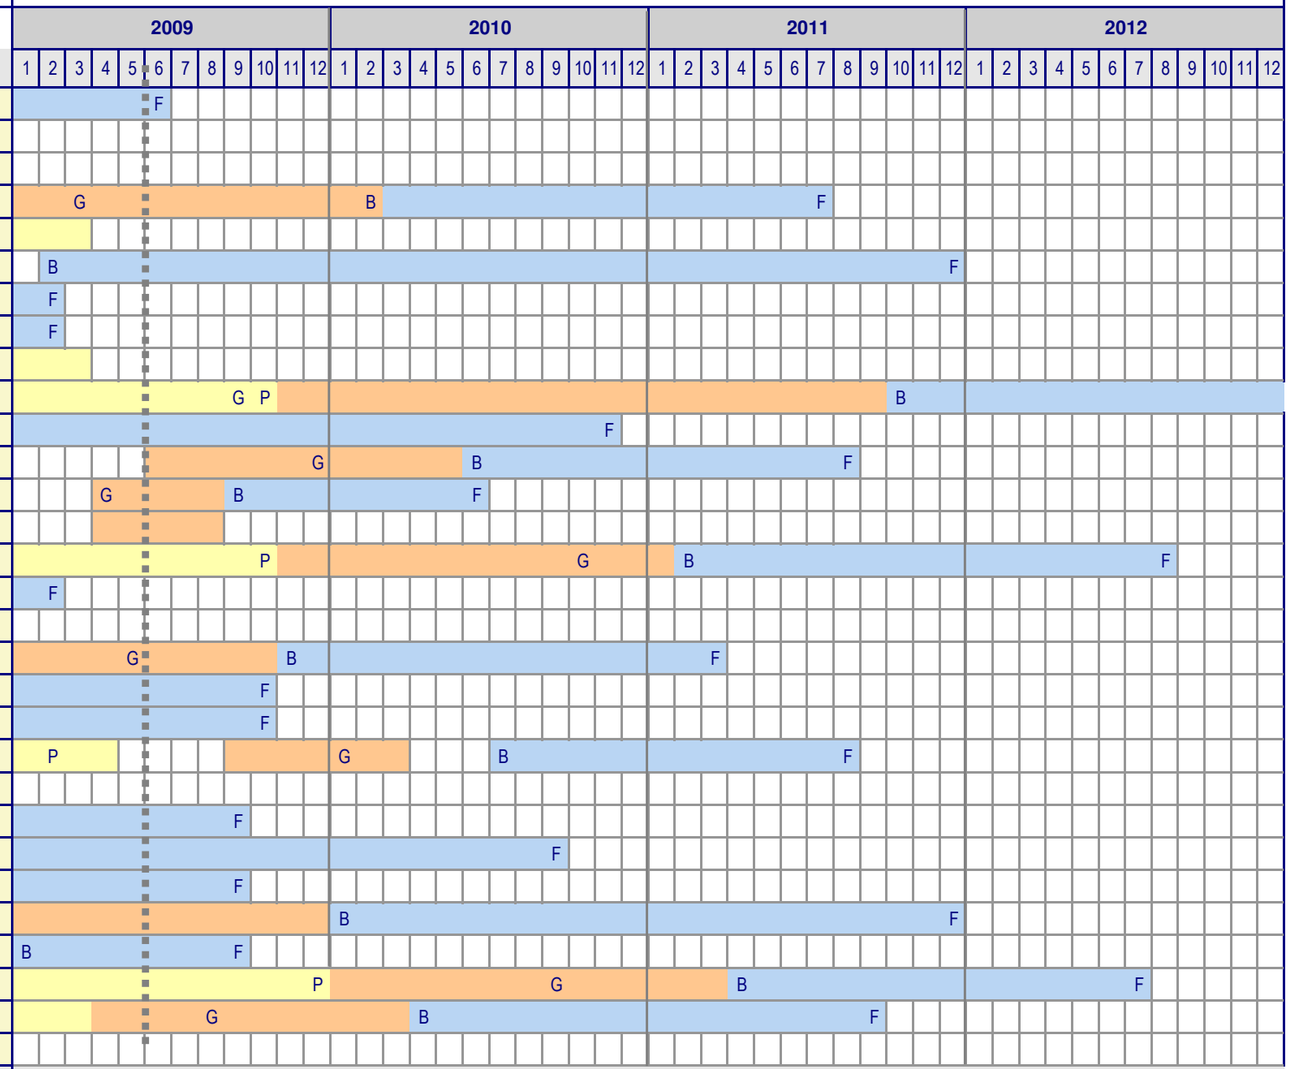

Kostenübersicht (alle Projekte)

	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 65	3.607.400	1.271.000
INKAS-Projekte	15.010.200	6.334.573

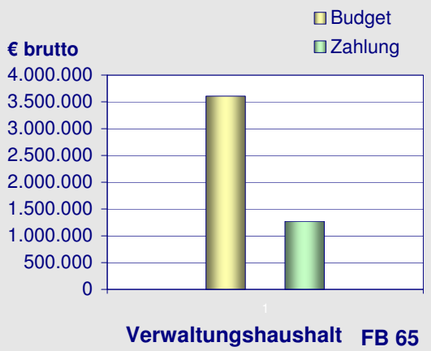

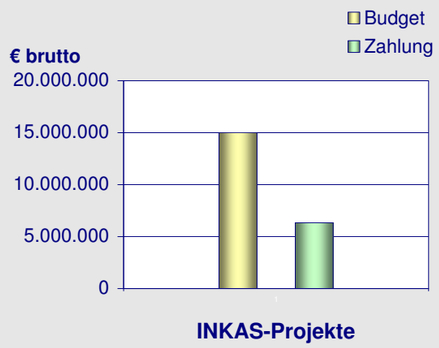

Projektphasen

- Grundlagenermittlung
- Planung
- Ausführung

Meilensteine

- P Raumprogramm
- G Baugesuch
- B Baubeginn
- F Fertigstellung

Anmerkungen zum Rahmenterminplan

zu 2 und 3: Die Darstellung erfolgt im nächsten INKAS-Bericht als Einzelmaßnahmen. -- **zu 9**: Gerichtl. Beweissicherungsverfahren, Sofortmaßnahmen im Dez. 2007 durchgeführt. -- **zu 10**: Ausführung in mehreren Bauabschnitten bis vorauss. Ende 2012. -- **zu 12**: Meilensteine von FB 48 im Vorfeld zu erbringen, personell bei 65 nicht besetzt. -- **zu 14**: personell bei 65 nicht besetzt. -- **zu 15**: Federführung FB 61. -- **zu 21**: Federführung FB 60, bei 65 personell nicht besetzt. -- **zu 24**: Ausführung von Einzelmaßnahmen mit Unterbrechungen. -- **zu 16**: Forderungen an die ehem. Rohbaufirma in Höhe v. 570 T. €.-- **zu 18**: Neues Raumprogramm

STATUS

Kosten

- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine

- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmenterminplan fraglich
- 🔴 Rahmenterminplan nicht möglich
