INKAS (Projekte > 300.000 €) | **Stand: 31.05.2009** | **FB 67**

STATUS

Jahr: 2009

	Projekt	Kosten	Termine	Finanzposition
1a	Uferwiesen Hoheneck	●	●	PSP - I00530408400903F
1b	Zugwiesen	●	●	PSP - IB0123409650903F
2	Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten	●	●	2.6153.9610.000-1103
3	Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Ortsmitte	●	●	2.6153.9610.000-1104
4	Akademiehof u. Akademiegarage Oberflächengestaltung	●	●	2.6157.9640.000-0112
5	Kaffeeberg Planung und Umgestaltung	●	●	2.6157.9640.000-0131
6	Königsallee Sanierung	●	●	2.6300.9640.000-0501
7	Uferstraße/Heimengasse (Hoheneck)	●	●	2.6500.9640.000-0801
8a	Verlängerung Bahnsteigunterführung	●	●	2.7920.9610.000-0101
8b	Straßenbau Pflugfelder Straße	●	●	2.7920.9640.000-0101
8c	Anteil Hoch-/Tiefbau am Westportal	●	●	2.7920.9620.000-0101
9	Mathildenstraße	●	●	2.6157.9640.000-0114

Rahmenterminplan

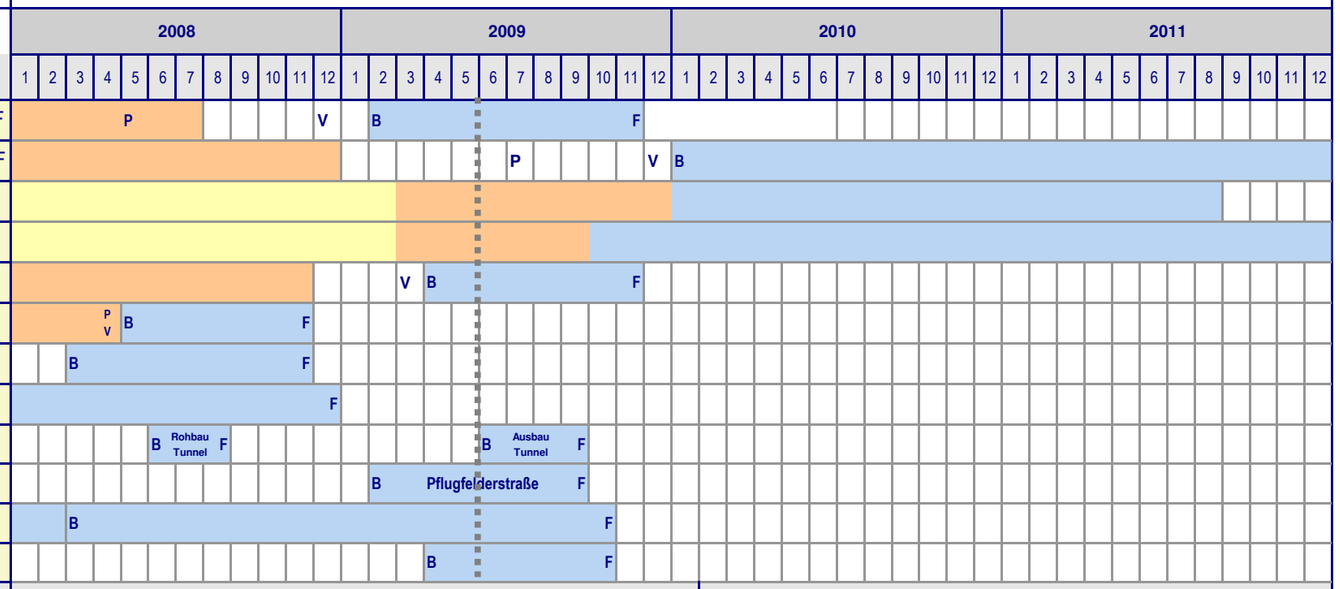

Kostenübersicht

	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt (Fachbereich)	10.663.450	3.096.139
Vermögenshaushalt (INKAS - Projekte)	8.445.700	1.537.757

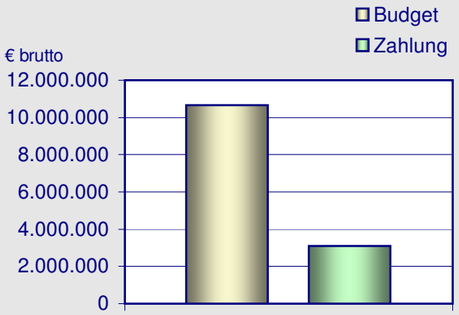

Verwaltungshaushalt (Fachbereich)

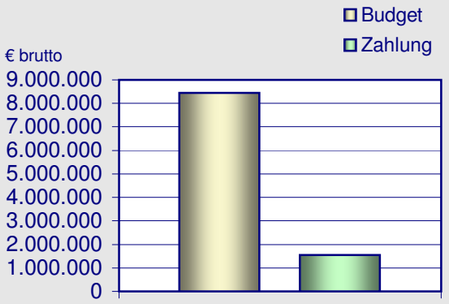

Vermögenshaushalt (INKAS - Projekte)

Projektphasen

- Grundlagenermittlung
- Planung
- Ausführung

Meilensteine

- P Baubeschluß
- V Vergabebeschluß
- B Baubeginn
- F Fertigstellung

Anmerkungen zum Rahmenterminplan

zu 1a:
- Aufhebung Ausschreibung Aug. 2008
- Neue Ausschreibung/Veröffentlichung Ende Sept. 2008

zu 1b:
- Grund der Verzögerung von Ausschreibung und Vergabe:
  Geplante Uferunterhaltungsmaßnahmen des WSA am Neckardamm eröffnen Möglichkeiten der Zusammenarbeit mit dem WSA (vergleichbar wie beim Projekt Uferwiesen).
  Abstimmungen mit LRA und WSA bzgl. Planänderungen und Anpassungen sind notwendig.

zu 8:
- Vergabe im BTU 06.11.2008
- Baubeginn Stadtwerke 10.11.2008

STATUS

Kosten
- ● Günstiger oder nicht teurer
- ● bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- ● > 10 %, über 100.000 €

Termine
- ● entsprechend Rahmenterminplan
- ● Rahmentermin fraglich
- ● Rahmentermin nicht möglich
