INKAS (Projekte > 300.000 €)	Stand: 31.03.2011	FB 67

STATUS

Jahr: 2011

	Projekt	Kosten	Termine	Finanzposition
1	Friedenstraße BA1	🟢	🔴	2.6300.9640.000-0208
2	Zugwiesen	🟢	🟢	2.6110.9552.000-0002
3	Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Südknoten	🟢	🟢	2.6153.9610.000-1103
4	Planung/Bau Platz um Rathaus und Feuerwehr	🟢	🟢	2.6153.9640.000-1104
5	Planung + Bau Verkehrsentw. Neckarweih. Haupt.-/Lechtstr.	🟢	🟢	2.6153.9610.000-1104
6	Planung + Bau neuer Nordanschluß Nwh (Neckarterrasse)	🟢	🟢	2.6300.9610.000-1102
7	Radweg Bottwartalstraße/Marbacherstraße	🟢	🟢	2.6300.9640.000-0004
8	Kreisverkehr Aldingerstraße / Donaustraße	🟢	🟢	2.6158.9630.000-1003
9	Erschließung Waldäcker	🟢	🟢	2.6300.9610.000-0201
10	Straßenbau Wöhlerstraße / Liebigstraße	🟢	🟢	2.6300.9611.000-0207
11	Kunstrasenplatz FSV Oßweil	🟢	🟢	2.5610.9640.000-0005
12	Erschließung Sonnenberg Teil I **WBL Sonderkonto**	🟢	🟢	**WBL Sonderkonto**
13	Straßenbau Comburgstraße **Sonderkonto**	🟢	🟢	**Sonderkonto**
14	Straßenbau Walter-Flex-Straße **Sonderkonto**	🟢	🟢	**Sonderkonto**
15	Straßenbau Neckarweihingerstraße **Sonderkonto**	🟢	🟢	**Sonderkonto**
16	Grünbühl / Sonnenberg - Quartiersplatz - Außenanlagen MGH / KIFAZ	🟢	🟢	2.6158.9410.670-1003
17	Hartenecker Höhe - Außenanlagen KIFAZ **Sonderkonto** - Kinderspielplatz	🟢	🟢	**Sonderkonto**

Rahmenterminplan

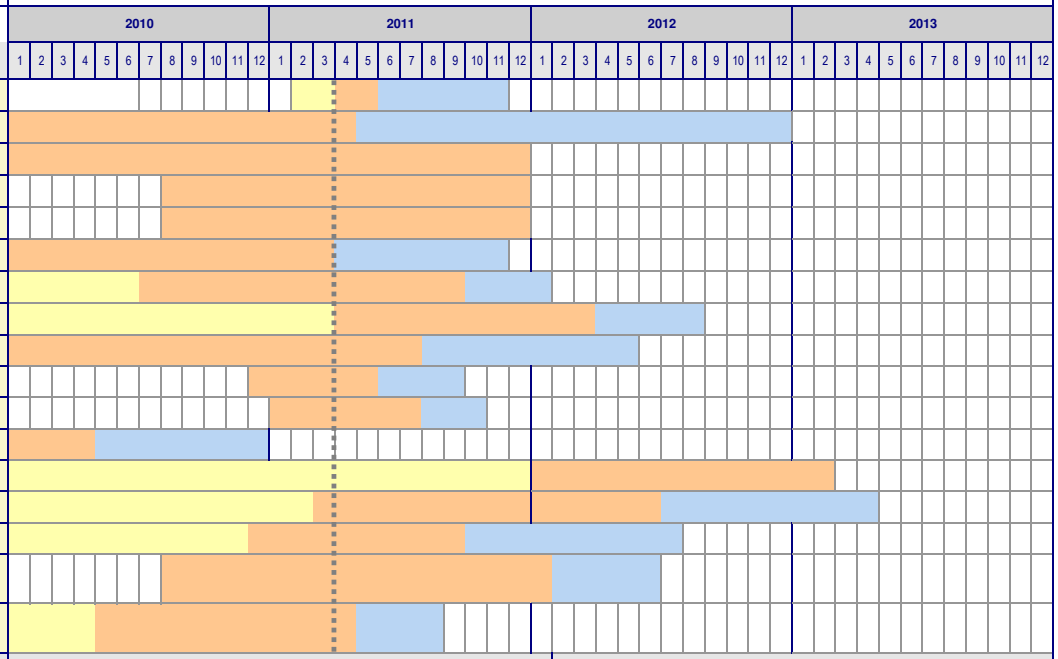

Kostenübersicht Haushaltsjahr 2011	Budget	Zahlung
Verwaltungshaushalt FB 67	9.640.550	1.488.112
INKAS - Projekte - Vermögenshaushalt FB 67	3.865.000	23.142

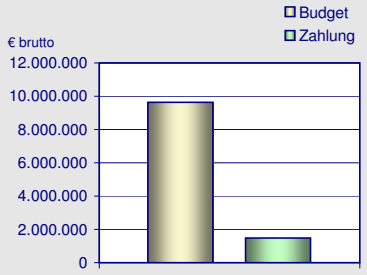

Verwaltungshaushalt FB 67

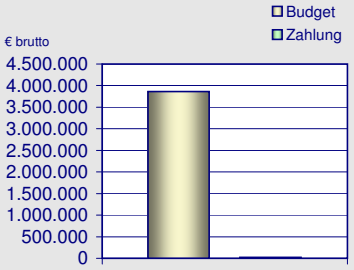

INKAS - Projekte - Vermögenshaushalt FB 67

Projektphasen

- Grundlagenermittlung
- Planung
- Ausführung

Anmerkungen zum Rahmenterminplan

zu 2: - Termin der Ausschreibung ist noch abhängig vom Planfeststellungsbeschluss für die geänderte Planung

zu 6: - Aufgrund der Planungsänderungen und der erweiterten Lärmschutzmaßnahmen für den Bereich Spitzäcker haben sich die Gesamtkosten auf 630.000 € erhöht.

STATUS

Kosten

- 🟢 Günstiger oder nicht teurer
- 🟡 bis + 10 %, max. jedoch + 100.000 €
- 🔴 > 10 %, über 100.000 €

Termine

- 🟢 entsprechend Rahmenterminplan
- 🟡 Rahmentermin fraglich
- 🔴 Rahmentermin nicht möglich
